

Hermosillo, Sonora. A 17 de Mayo de 2023.

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.

En atención al aviso de comisión suscrito con fecha 08 de mayo del presente año, a través del cual se me comisiona del día jueves 11 al sábado 13 de mayo del 2023 a los municipios de Guaymas, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Huatabampo y Álamos, Sonora; con el propósito de supervisión de avance físico de las obras C-00075/0861 y C-00075/0858 pertenecientes al contrato No. SEDESSON-FISE-2023-002, C-00075/0860 y C-00075/0857 pertenecientes al contrato No. SEDESSON-FISE-2023-001. Ejecutadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE); además de la evaluación de proyecto parque en el municipio de Huatabampo FISE 2023, por instrucciones ya no fue necesario visitar el municipio de Álamos, sonora. Se anexan dos avisos de comisión uno con sellos de los municipios visitados y otro sin sellos, siendo el este último el oficial, ya que por un error involuntario se autorizó el aviso erróneo.

El día jueves 11 de mayo de 2023 se inició con la ruta, acudiendo como primera instancia al Comisaria de Pótam, donde amablemente accedieron a sellar nuestro aviso de comisión y nos reunimos con Areli Borquez quien nos ayudó a ubicar las 8 obras de cuarto-dormitorio de la localidad Pótam, municipio de Guaymas relativa a la obra C-00075/0858, de las cuales 4 obras ya se iniciaron y 4 están pendientes de iniciar, pero ya están surtidas de material. Para posteriormente trasladarnos al municipio de San Ignacio Río Muerto donde amablemente accedieron a sellar nuestro aviso de comisión, para después iniciar la visita a las 12 acciones que comprenden la obra C-00075/0861, en donde todas ya tiene cimentación. Para terminar, partimos hacia Navojoa.

El día viernes 12 de mayo de 2023 se inició el recorrido de Navojoa hacia la localidad de Manuel Caudillo municipio de Huatabampo para hacer levantamiento del Parque Manuel Caudillo, al terminar nos dirigimos a la localidad de Bacapaco a visitar las primeras 7 obras de construcción de cuarto-dormitorio, para observar el avance de las obras que pertenecen al municipio de Huatabampo bajo la obra C-00075/0860.

El día sábado 13 de mayo continuamos con visita a las obras del municipio de Huatabampo, antes de visitar la obra, nos dirigimos a la comandancia donde amablemente accedieron a sellar nuestro aviso de comisión y continuamos con la visita de las 7 obras restantes en las localidades de Las Arenitas y Las Milpas. De las cuales 6 obras de 14 se han iniciado, incluso 3 ya están en proceso de colado de azotea. Continuamos la visita de obra en Villa Juárez, donde nos reunimos en Palacio Municipal con Laura Corrales quien amablemente selló nuestro aviso de comisión, para después visitar sus localidades de Paredón colorado con 14 acciones de Cuarto-dormitorio y Paredoncito con 6 acciones de cuarto-dormitorio, que pertenecen a la obra C-00075/0857, de las cuales 11 de las 20 han iniciado. Al terminar regresamos a Hermosillo.



ARQ. MARIO EFRÉN BERMÚDEZ NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
18 MAYO 2023
1:35
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN


PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)


DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN:	11-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,015,947.01
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0858	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	8
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFRÉN BERMÚDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	PÓTAM

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		1. GEORGINA CRUZ PALMA	% AVANCE	5%	LOCALIDAD:	PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			1) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 2) EXCAVACIÓN. 3) PLANTILLA 3 VARILLAS CON 1.30 A 1.40m DE SEPARACION. 4) PROCESO DE ZAPATA CORRIDA.			

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		2. RAFAELA GUADALUPE CHOQUI ZAYAS	% AVANCE	0%	LOCALIDAD:	PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.			

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		3. PEDRO LUZANILLA VALENZUELA	% AVANCE	5%	LOCALIDAD:	PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			1) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 2) EXCAVACIÓN. 3) PLANTILLA. 4) PROCESO DE ZAPATA CORRIDA. 4) JUNTAS CON BOQUILLAS ANCHAS EN MURO DE ENRASE, EN ALGUNAS FALTA MEZCLA.			

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		4. ELSA PAULINA VALENZUELA ZUÑIGA	% AVANCE	0%	LOCALIDAD:	PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.			

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		5. FIDEL AMARILLAS ALIPAZ	% AVANCE	0%	LOCALIDAD:	PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.			

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN: 11-may-23	CONTRATO: SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA: C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO: \$1,015,947.01
NUMERO DE OBRA: C-00075/0858	DESCRIPCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS	FECHA DE INICIO: 20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 18/07/2023
RESIDENTE DE OBRA: ARQ. MARIO EFRÉN BERMÚDEZ NAVARRO			MUNICIPIO: PÓTAM

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 6. ANA MARIA HURTADO LEYVA		% AVANCE 5%	LOCALIDAD: PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 2) EXCAVACIÓN. 3) PLANTILLA 3 VARILLAS CON 1.30 A 1.40m DE SEPARACION. 4) PROCESO DE ZAPATA CORRIDA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 7. LUZ VERONICA PIÑA AMARILLAS		% AVANCE 5%	LOCALIDAD: PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 2) EXCAVACIÓN. 3) PLANTILLA 3 VARILLAS CON 1.30 A 1.40m DE SEPARACION. 4) PROCESO DE ZAPATA CORRIDA. 5) TUMBAR CUARTO EXISTENTE.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 8. MARIA ROBERTA BACASEGUA VALENZUELA		% AVANCE 0%	LOCALIDAD: PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA. 3) LLEGARON 2 PERSONAS A EMPEZAR LA CIMENTACION.

RESUMEN

HALLAZGOS:

EN 8 DE 8 ACCIONES VISITADAS, YA SE INICIO CON EL SUMINISTRO.
EN 4 DE 8 ACCIONES VISITADAS, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIMENTACIÓN.

CONCLUSIÓN:

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 3%, YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIMENTACION EN LA MITAD DE LAS OBRAS.

% AVANCE FISICO DE LA OBRA 0%

ARQ. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO

RESIDENTE DE OBRA

C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CP. ALMA DELIA LIMON MORENO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN: 11-may-23
 NUMERO DE OBRA: C-00075/0861
 RESIDENTE DE OBRA: ARQ. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO

CONTRATO: SEDESSON-FISE-2023-002
 DESCRIPCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.
 CONTRATISTA: C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO
 FECHA DE INICIO: 20/04/2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 18/07/2023

IMPORTE COMPROMETIDO: \$1,523,920.50
 CUARTOS: 12
 MUNICIPIO: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 1. JOSÉ MANUEL MARES AVILA % AVANCE 25% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) PROCESO DE COLADO DE CASTILLOS. 4) JUNTAS A HUESO Y BOQUILLAS ANCHAS. 5) 3 VARILLAS DE REFUERZO EN CASTILLO.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 2. PROSPERO QUIJANO HUMO % AVANCE 10% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) PROCESO DE ARMADO DE CASTILLOS, 4 VARILLAS DE REFUERZO.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 3. LUCIA GRINDELIA URQUIDEZ OSUNA % AVANCE 15% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) ARMADO DE CASTILLOS, 4 VARILLAS DE REFUERZO. 3) DESPLANTE DE MUROS. 4) JUNTAS A HUESO Y BOQUILLAS ANCHAS.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 4. JULIO MOLINA CASILLAS % AVANCE 35% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) MANGUEROO Y COLOCACIÓN DE CAJAS ELÉCTRICAS EN MUROS. 4) COLADO DE CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO. 5) PROCESO DE ARMADO, CIMBRA Y COLADO DE AZOTEA. 6) JUNTAS A HUESO Y BOQUILLAS ANCHAS. 7) 5 VIGUETAS.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 5. CAROLINA LOPEZ ALVAREZ % AVANCE 30% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) MANGUEROO Y COLOCACIÓN DE CAJAS ELÉCTRICAS EN MUROS. 4) COLADO DE CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO. 5) JUNTAS A HUESO Y BOQUILLAS ANCHAS.


PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN: 11-may-23	CONTRATO: SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA: C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO: \$1,523,920.50
NUMERO DE OBRA: C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.		CUARTOS: 12
RESIDENTE DE OBRA: ARQ. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO: 20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 18/07/2023	MUNICIPIO: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 6. RAMONA FRANCISCA LUNA VELAZQUEZ **% AVANCE** 35% **LOCALIDAD:** SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1 	FOTO 2 	FOTO 3 	COMENTARIOS: 1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) MANGUERO Y COLOCACIÓN DE CAJAS ELECTRICAS EN MUROS. 4) COLADO DE CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO. 5) PROCESO DE ARMADO, CIMBRA Y COLADO DE AZOTEA. 6) JUNTAS A HUESO Y BOQUILLAS ANCHAS. 7) 5 VIQUETAS.
---	--	---	--

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 7. ROSENDA VALENZUELA MOROYOQUI **% AVANCE** 30% **LOCALIDAD:** SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1 	FOTO 2 	FOTO 3 	COMENTARIOS: 1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) MANGUERO Y COLOCACIÓN DE CAJAS ELECTRICAS EN MUROS. 4) COLADO DE CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO. 5) PROCESO DE ARMADO, CIMBRA Y COLADO DE AZOTEA Y APLICACION DE ENJARE GRUESO.
---	--	---	---


NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 8. REY ARTURO RUBALCAVA GARCIA **% AVANCE** 10% **LOCALIDAD:** SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1 	FOTO 2 	FOTO 3 	COMENTARIOS: 1) CIMENTACIÓN. 2) PROCESO DE ARMADO DE CASTILLOS, 4 VARILLAS DE REFUERZO.
--	---	--	---

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 9. RAFAEL MOLINA GARCIA **% AVANCE** 20% **LOCALIDAD:** SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1 	FOTO 2 	FOTO 3 	COMENTARIOS: 1) CIMENTACIÓN. 2) PROCESO DESPLANTE DE MUROS. 3) JUNTAS CON BOQUILLAS ANCHAS.
---	--	---	---

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 10. ELENA LOPEZ RIVERA **% AVANCE** 10% **LOCALIDAD:** SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1 	FOTO 2 	FOTO 3 	COMENTARIOS: 1) CIMENTACIÓN. 2) PROCESO DE ARMADO DE CASTILLOS, 4 VARILLAS DE REFUERZO.
---	--	---	---

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN:	11-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,523,920.50
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.			CUARTOS:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 11. KARLA ISABEL MIRANDA QUIJADA % AVANCE 10% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) PROCESO DE ARMADO DE CASTILLOS, 4 VARILLAS DE REFUERZO.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 12. ARNULFO AYALA VALENZUELA % AVANCE 25% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) MANGUERO Y COLOCACIÓN DE CAJAS ELECTRICAS EN MUROS. 4) PROCESO DE COLADO DE CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO. 5) JUNTAS CON BOQUILLAS ANCHAS. 6) UN MURO DE VENTANA DESPLOMADO.

RESUMEN

HALLAZGOS:

EN 12 DE 12 ACCIONES VISITADAS, YA SE TERMINO LA PARTIDA DE CIMENTACIÓN

CONCLUSIÓN:

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 21%, YA QUE TODAS LAS ACCIONES SE ENCUENTRA CON LA CIMENTACION TERMINADA, PROCESO DE DESPLANTE DE MUROS Y EN DOS ACCIONES PROCESO DE COLADO DE LOSA DE AZOTEA.

% AVANCE FISICO DE LA OBRA 21%

ARQ. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO

RESIDENTE DE OBRA

C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CP. ALMA DELIA LIMON MORENO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN:	13-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	1. ALFREDO UZARRAGA SOSA	% AVANCE FISICO	0%			LOCALIDAD:	PAREDON COLORADO
FOTO 1	FOTO 2		COMENTARIOS:				
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	2. ANDREA ZAMBRANO MENDIVIL	% AVANCE FISICO	40%			LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) COLADO DE CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO. 4) PROCESO DE ARMADO, CIMBRA Y COLADO DE AZOTEA. 5) FALTA PREPARACION DE MANGUERAS Y CAJAS ELECTRICAS EN MURO. 6) JUNTAS A HUESO Y BOQUILLAS ANCHAS. 7) BANO DE PUERTA DESCUADRADA DE 2.07 X 1.05m. BANO DE VENTANA CUADRADA DE 1.03 X 1.03m.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	3. ADRIAN GONZALEZ ARAIZA	% AVANCE FISICO	0%			LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1			COMENTARIOS:				
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.				
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	4. HERMENEGILDA MOYOROQUI LÓPEZ	% AVANCE FISICO	5%			LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2			COMENTARIOS:			
				1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.			
NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	5. LILIAN ESPINOZA CRUZ	% AVANCE FISICO	40%			LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:				
			1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) COLADO DE CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO. 4) PROCESO DE ARMADO, CIMBRA Y COLADO DE AZOTEA. 5) FALTA PREPARACION DE MANGUERAS Y CAJAS ELECTRICAS EN MURO. 6) INTERIOR ZARPEADO CON ENJARRE GRUESO DE 2cm. 7) BANO DE PUERTA PEQUEÑO DE 2.06 X 1.03m. BANO DE VENTANA CUADRADA DE 1.02 X 1.02m.				

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN:	13-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 6. MARIA TRINIDAD ESCALANTE VILLEGAS % AVANCE FISICO 0% LOCALIDAD: PAREDÓN COLORADO

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 7. NOELIA GUADALUPE SOTOMEA VALENZUELA % AVANCE FISICO 0% LOCALIDAD: PAREDÓN COLORADO

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 8. PEDRO ODILÓN ESCALANTE VALENZUELA % AVANCE FISICO 0% LOCALIDAD: PAREDÓN COLORADO

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 9. VALENTINA VILLEGAS VALENZUELA % AVANCE FISICO 0% LOCALIDAD: PAREDÓN COLORADO

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 10. JESÚS ABEL UZARRAGA CABRALES % AVANCE FISICO 0% LOCALIDAD: PAREDÓN COLORADO

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.


PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN:	13-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	11. ADRIANA MANCILLAS YOCUPICIO	% AVANCE FISICO	5%	LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------	----	------------	------------------

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 2) EXCAVACIÓN. 3) PLANTILLA 4 VARILLAS CON 0.70 A 0.90m DE SEPARACION. 4) PROCESO DE ZAPATA CORRIDA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	12. MARÍA CATALINA CASTRO NIEBLAS	% AVANCE FISICO	40%	LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-----	------------	------------------

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) COLADO DE CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO. 4) PROCESO DE ARMADO, CIMBRA Y COLADO DE AZOTEA. 5) FALTA PREPARACION DE MANGUERAS Y CAJAS ELECTRICAS EN MURO. 6) ENJARRE GRUESO DE 1.5cm EN EXTERIOR. 7) BANO DE PUERTA PEQUEÑO DE 2.06 X 1.01m. BANO DE VENTANA PEQUEÑA. 8) JUNTAS A HUESO Y BOQUILLAS ANCHAS.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	13. ROSALIA DANIRA ZAMBRANO VALENZUELA	% AVANCE FISICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
-----------------------------------	--	-----------------	----	------------	------------------

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	14. JESUS GUADALUPE BUITIMEA SOTOMEA	% AVANCE FISICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDÓN COLORADO
-----------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----	------------	------------------

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 2) EXCAVACIÓN. 3) COLADO DE PLANTILLA 4 VARILLAS CON 0.70 A 0.80m DE SEPARACION.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	15. DAVID EDUARDO VALENZUELA LÓPEZ	% AVANCE FISICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDONCITO
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------	----	------------	-------------

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 3) EXCAVACION. 4) AFECTA CIMENTACION Y MURO DEL VECINO.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN:	13-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		16. MARTÍN ZAVALA JOCOBI	% AVANCE FISICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 3) EXCAVACION. 4) PLANTILLA CON 4 VARILLAS POR LADO. 5) ZAPATA CORRIDA. 6) PROCESO DE ARMADO CADENA DE DESPLANTE. 7) CASTILLOS ARMADOS CON 4 VARILLAS DE REFUERZO.			

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		17. DIANA FABIOLA HUICOZA VERDUGO	% AVANCE FISICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 3) EXCAVACION. 4) PLANTILLA CON 4 VARILLAS POR LADO. 5) ZAPATA CORRIDA. 6) PROCESO DE ARMADO CADENA DE DESPLANTE. 7) CASTILLOS ARMADOS CON 4 VARILLAS DE REFUERZO. 8) 3 PERSONAS TRABAJANDO.			

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		18. LANDY JAQUELINE SANDOVAL CRUZ	% AVANCE FISICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			1) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 2) EXCAVACIÓN. 3) FALTA PROFUNDIDAD EN EXCAVACIÓN. 4) QUITAR CUARTO DE BAÑO.			

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		19. JUANA ARACELI JUPA VALENZUELA	% AVANCE FISICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			1) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 2) EXCAVACIÓN. 3) FALTA PROFUNDIDAD EN EXCAVACIÓN.			

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:		20. MARCELA VERONICA MORALES RAMIREZ	% AVANCE FISICO	0%	LOCALIDAD:	PAREDONCITO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:			
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 3) EXCAVACION.			

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN:	13-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$2,624,152.88
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0857	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	20
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	BENITO JUÁREZ

RESUMEN

HALLAZGOS:

EN 20 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE INICIO CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES .

EN 11 DE 20 ACCIONES VISITADAS, YA SE INICIO CON LA OBRA; 3 ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE COLDADO DE AZOTEA.

CONCLUSIÓN:

% AVANCE FISICO 8%

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 8%, YA QUE SE ENCUENTRA EB SU ETAPA DE INICIO.

ARQ. MARIO EFRÉN BERMÚDEZ NAVARRO

RESIDENTE DE OBRA

C. JOEL TOSAMA IBARRA

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CP. ALMA DELIA LIMON MORENO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN:	12-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	1. SILVIA VALENCIA QUIJANO	% AVANCE	5%	LOCALIDAD:	BACAPACO
-----------------------------------	----------------------------	----------	----	------------	----------

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) PROCESO DE DESPLANTE DE MUROS. 3) CASTILLOS ARMADOS CON 4 VARILLAS DE REFUERZO. 4) JUNTAS ANCHAS. 5) 3 PERSONAS TRABAJANDO.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	2. DIANA ELIZABETH ESTRELLA GUTIERREZ	% AVANCE	0%	LOCALIDAD:	BACAPACO
-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----	------------	----------

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	3. MARÍA TEODORA SÁNCHEZ ESTRELLA	% AVANCE	35%	LOCALIDAD:	BACAPACO
-----------------------------------	-----------------------------------	----------	-----	------------	----------

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) COLADO DE CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO. 4) PROCESO DE ARMADO, CIMBRA Y COLADO DE AZOTEA. 5) JUNTAS A HUESO Y FALTA MEZCLA EN ALGUNAS JUNTAS. 6) REBABEO EN CADENA DE CERRAMIENTO.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	4. MARTHA ELENA YOCUPICIO COTA	% AVANCE	5%	LOCALIDAD:	BACAPACO
-----------------------------------	--------------------------------	----------	----	------------	----------

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	5. MARTÍN YOCUPICIO BUITIMEA	% AVANCE	5%	LOCALIDAD:	BACAPACO
-----------------------------------	------------------------------	----------	----	------------	----------

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN. 3) PROCESO DE EXCAVACIÓN.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA


VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN:	12-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 6. JUANA VICTORIA COTA ÁLVAREZ % AVANCE 40% LOCALIDAD: BACAPACO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) COLADO DE CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO. 4) PROCESO DE ARMADO, CIMBRA Y COLADO DE AZOTEA. 5) JUNTAS A HUESO Y FALTA MEZCLA EN ALGUNAS JUNTAS. 6) REBABEO EN CADENA DE CERRAMIENTO. 7) INTERIOR ZARPEADO. 8) BANO DE PUERTA PEQUEÑO DE 2.00 X 0.96m.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 7. ROSARIO ÁLVAREZ LEYVA % AVANCE 40% LOCALIDAD: BACAPACO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) CIMENTACIÓN. 2) DESPLANTE DE MUROS. 3) COLADO DE CASTILLOS Y CADENA DE CERRAMIENTO. 4) PROCESO DE ARMADO, CIMBRA Y COLADO DE AZOTEA. 5) JUNTAS A HUESO Y FALTA MEZCLA EN ALGUNAS JUNTAS. 6) REBABEO EN CADENA DE CERRAMIENTO. 7) INTERIOR ZARPEADO. 8) BANO DE PUERTA PEQUEÑO DE 2.00 X 0.96m. 9) COLOCACION DE MALLA POLLERA.


NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 8. KARINA ZAVALA GUTIERREZ % AVANCE 0% LOCALIDAD: LAS ARENITAS

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 9. JOSÉ BENITO QUIJANO ORTIZ % AVANCE 0% LOCALIDAD: LAS ARENITAS

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 10. EMPERATRIZ PINTO LEYVA % AVANCE 0% LOCALIDAD: LAS ARENITAS

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN:	12-may-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-001	CONTRATISTA:	C. JOEL TOSAMA IBARRA	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,836,908.70
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0860	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	14
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LIZETH VICTORIA ARROYO DUARTE	FECHA DE INICIO:	20/04/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18/07/2023	MUNICIPIO:	HUATABAMPO

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	11. EVA LUZ ORTIZ DUARTE	% AVANCE 0%	LOCALIDAD: LAS MILPAS
-----------------------------------	--------------------------	-------------	-----------------------

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	12. SILVIA ANGELITA DUARTE BACASEGUA	% AVANCE 0%	LOCALIDAD: LAS MILPAS
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	13. LUZ DEL CARMEN ÁLVAREZ MENDIVIL	% AVANCE 0%	LOCALIDAD: LAS MILPAS
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------	-----------------------

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	14. ELSA VILLEGAS ESPINOZA	% AVANCE 0%	LOCALIDAD: LAS MILPAS
-----------------------------------	----------------------------	-------------	-----------------------

FOTO 1	COMENTARIOS:
	1) ENTREGA DE MATERIAL. 2) AUN NO COMIENZA LA OBRA.

RESUMEN

HALLAZGOS:

EN 14 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE INICIO CON EL SUMINISTRO.
 EN 6 DE 14 ACCIONES VISITADAS, YA SE INICIO LA OBRA, INCLUSO 3 ACCIONES ESTAN EN PROCESO DE COLADO DE AZOTEA.

CONCLUSIÓN:

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 10%, YA QUE AUN NO INICIAN TODAS LAS ACCIONES Y SON SOLO 3 LAS ACCIONES AVANZADAS.

% AVANCE FISICO DE LA OBRA 10%

ARQ. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO

RESIDENTE DE OBRA

C. JOEL TOSAMA IBARRA

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CP. ALMA DELIA LIMON MORENO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Reporte fotográfico.

MUNICIPIO ÁLAMOS LOCALIDAD BASIROA



6. ROSALIA YOCUPICIO VALENZUELA



7. BEATRIZ ADRIANA RUIZ VALENZUELA



8. GPE. ALEJANDRA BURROLA CORRALES




9. RODOLFO VALENZUELA ESTRELLA



10. CANDELARIO YOCUPICIO COTA



11. SARA EVELIA VALENZUELA BALMEA

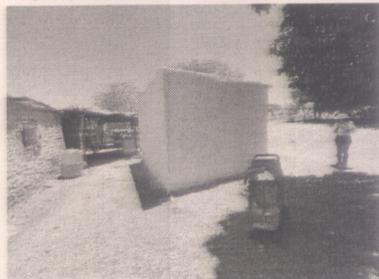

12. SANTOS ISABEL VALENZUELA Z.



13. MANUEL DE JESÚS VALENZUELA V.



14. YADIRA ANTONIA VALENZUELA M.



15. SANTOS VALENZUELA ANDUAGA



16. MARÍA HILDA MENDIVIL DUARTE




GUADALUPE VALENZUELA MENDIVIL



JESÚS ROSARIO VALENZUELA MENDIVIL

MUNICIPIO ÁLAMOS LOCALIDAD CAPITAHUASA

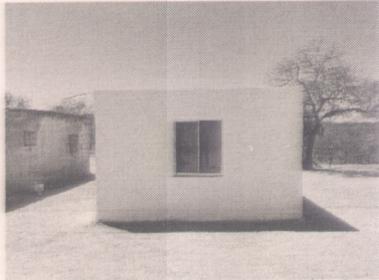

17. MARÍA ANCELMA MUÑOZ VILLEGAS

MUNICIPIO ÁLAMOS LOCALIDAD LOS MUERTOS




18. BENITO VERDUGO AVILA



19. JOSÉ MARTIN BORBÓN CONTRERAS



20. MARÍA DEL ROSARIO VALENZUELA F.

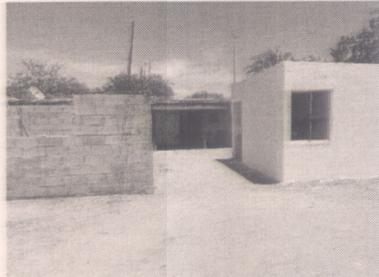

21. DAMACIO AVILA MENDOZA





22. DINORA ARGELIA ESTRELLA MORALES



23. GERARDO MORALES BORBÓN

LEVANTAMIENTO PARQUE MANUEL CAUDILLO MUNICIPIO DE HUATABAMPO

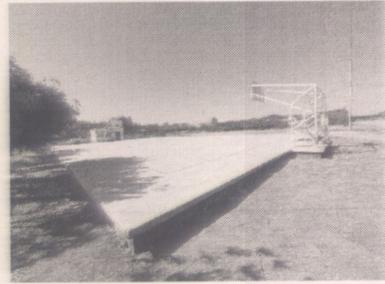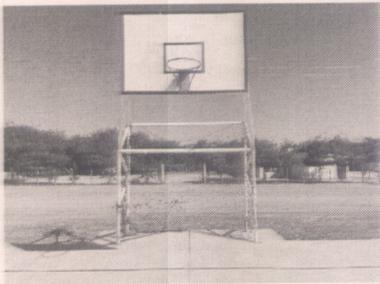



Namín Arysto V.
09:53

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 08 DE MAYO DE 2023

MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS C-00075/0861, C-00075/0858, C-00075/0857 Y C-00075/0860.
EJECUTADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023)

Se le comisiona a:

GUAYMAS, SAN IGNACIO RIO MUERTO, BENITO JUAREZ, HUATABAMPO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 11 DE MAYO 13 DE MAYO DE 2023

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	
CASETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN



MUNICIPIO DE
SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA
PRESIDENCIA
2021-2024



COMANDANCIA DE POLICIA
PREVENTIVA Y TRANSITO
MUNICIPAL
I. R. Y SONORA

C.c.p. Archivo
C.c.p. -Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado
