

Hermosillo, Sonora. A 13 de junio de 2023.

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.

En atención al aviso de comisión suscrito con fecha 24 de mayo del presente año, a través del cual se me comisiona del día miércoles 07 de junio del 2023 al viernes 09 de junio del 2023, a los municipios de Guaymas, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez y Huatabampo, Sonora; con el propósito de supervisar el avance físico de las obras de cuarto dormitorio no. C-00075/0858, C-00075/0861, C-00075/0857 y C-00075/0860.

El día miércoles 07 de junio de 2023 se inició con la ruta, acudiendo como primera instancia al municipio de Huatabampo con la obra C-00075/0860, nos acompañó el Arq. Diego Mezquita Salgado y el contratista Ing. Joel Tosame Ibarra iniciando en la localidad de Bacapaco con 7 obras de cuarto dormitorio, para seguir con la localidad de La Arenita en donde visitamos las 3 obras, en la localidad de las Milpas 4 acciones aun no inician. Al terminar nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Huatabampo y quienes nos sellaron el aviso de comisión. Al terminar la visita nos dirigimos a Navojoa.

El jueves 08 de junio del 2023 iniciamos el recorrido en el municipio de Benito Juárez donde nos reunimos en Palacio Municipal con Laura Corrales quien amablemente selló nuestro aviso de comisión, para después reunirnos con el Presidente Municipal Florentino Jusacamea Valencia junto con el cabildo del municipio, también nos acompañó el Arq. Diego Mezquita Salgado y el contratista Ing. Joel Tosame Ibarra se inició recorriendo las localidades de Paredón Colorado con 14 acciones de cuarto dormitorio y Paredoncito con 6 acciones de cuarto dormitorio, que pertenecen a la obra C-00075/0857. Al terminar nos dirigimos a San Ignacio Río Muerto donde nos reunimos con personal de Desarrollo Social del municipio y que amablemente accedieron a sellar nuestro aviso de comisión, para después iniciar en conjunto la visita a las 12 acciones que comprenden la obra C-00075/0861, también nos acompañó el Arq. Diego Mezquita Salgado y por parte de la contratista el Ing. Javier Acuña. Para terminar, partimos hacia Obregón.

El día viernes 09 de junio de 2023 se inició el recorrido de Obregón hacia Pótam municipio de Guaymas para acudir como primera instancia a la Comisaria de Pótam, donde amablemente accedieron a sellar nuestro aviso de comisión y nos reunimos con Román Amarillanes quien nos ayudó a ubicar las 8 obras de cuarto dormitorio, relativas a la obra C-00075/0858. Al terminar regresamos a Hermosillo.



ARQ. MARIO EFRÉN BERMÚDEZ NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 24 DE MAYO DE 2023

MARIO EFREN BERMUDEZ NAVARRO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DEL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS C-00075/0858, C-00075/0861, C-00075/0857 Y C-00075/0860, EJECUTADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE 2023).

Se le comisiona a:

GUAYMAS, SAN IGNACIO RIO MUERTO, BENITO JUAREZ Y HUATABAMPO, SONORA.



Durante el (los) día (s) 7 DE JUNIO AL 9 DE JUNIO DE 2023

Vehículo No. VRP-1

Marca FORD

Placas UN-3772-A

Modelo 2020

Tipo PICK UP

COMANDANCIA DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL I, R Y SONORA

CONTROL NET:	
CASSETAS:	
GASOLINA:	



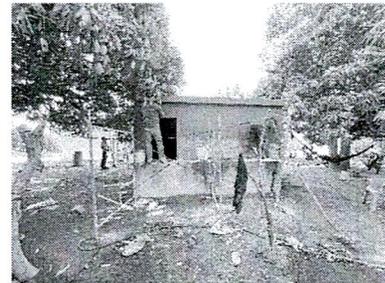
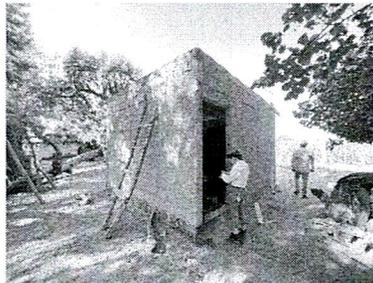
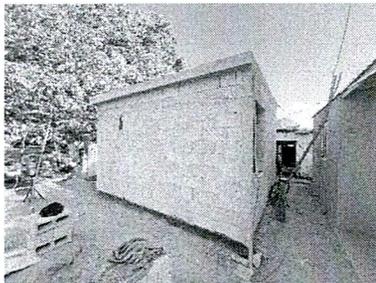
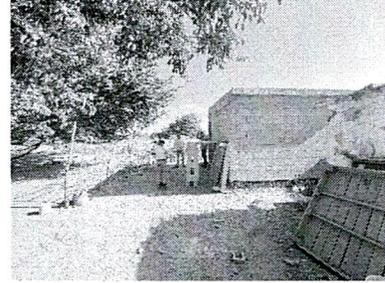
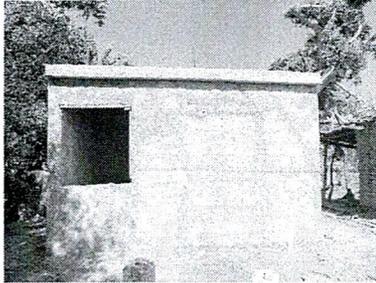
ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

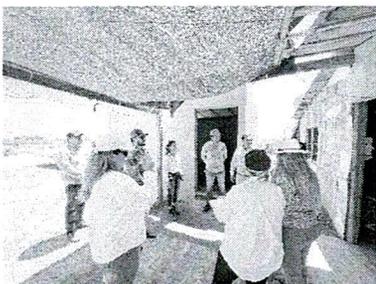
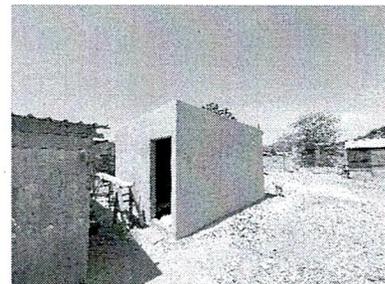
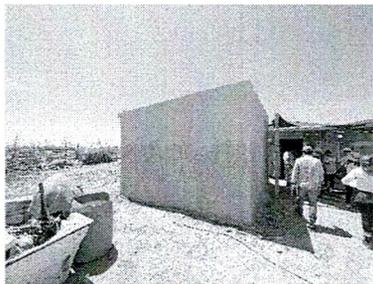
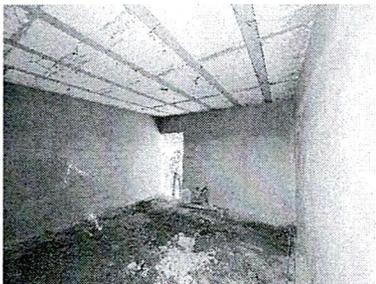
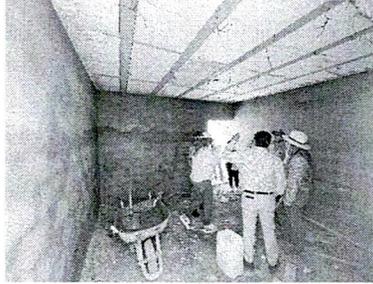
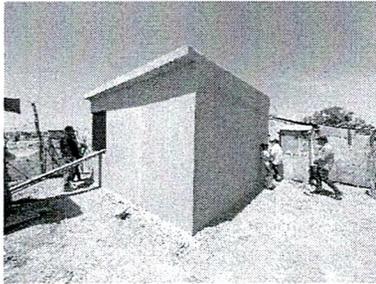
MUNICIPIO DE IGNACIO RIO, MTO. SON.
DESARROLLO ECONOMICO
GUERRERO DE IBARRA
Y PROTECCION CIVIL
RECIBIDO
07 JUN. 2023
HUATABAMPO SONORA

C.c.p. Archivo
C.c.p. -Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

Reporte fotográfico
MUNICIPIO HUATABAMPO LOCALIDAD BACAPACO Y LA ARENITA



MUNICIPIO BENITO JUAREZ LOCALIDAD PAREDON COLORADO Y PAREDONCITO









PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)




DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA



VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA



FECHA DE VERIFICACIÓN:	08-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,523,920.50
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.			CUARTOS:	12
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	04/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	01/08/2023	MUNICIPIO:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	1. JOSÉ MANUEL MARES AVILA	% AVANCE	61%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:		
			1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 6) LOSA CON SISTEMA DE VIGUETA Y CASETÓN DE POLIESTIRENO. 7) ACABADO DE ALERO EN LOSA. 8) APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS.		

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	2. PROSPERO QUIJANO HUMO	% AVANCE	61%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:		
			1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 6) LOSA CON SISTEMA DE VIGUETA Y CASETÓN DE POLIESTIRENO. 7) ACABADO DE ALERO EN LOSA.		

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	3. LUCÍA GRINDELIA URQUIDEZ OSUNA	% AVANCE	61%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:		
			1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 6) LOSA CON SISTEMA DE VIGUETA Y CASETÓN DE POLIESTIRENO. 7) ACABADO DE ALERO EN LOSA. 8) APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS.		

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	4. JULIO MOLINA CASILLAS	% AVANCE	100%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:			
		1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) ALBAÑILERÍAS. 3) PUERTAS Y VENTANAS. 4) INSTALACIÓN ELECTRICA. 5) ACABADOS.			

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O:	5. CAROLINA LOPEZ ALVAREZ	% AVANCE	100%	LOCALIDAD:	SAN IGNACIO RÍO MUERTO
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:		
			1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) ALBAÑILERÍAS. 3) PUERTAS Y VENTANAS. 4) INSTALACIÓN ELECTRICA. 5) ACABADOS.		



PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA



VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN: 08-jun-23
 CONTRATO: SEDESSON-FISE-2023-002
 CONTRATISTA: C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO
 IMPORTE COMPROMETIDO: \$1,523,920.50
 NUMERO DE OBRA: C-00075/0861
 DESCRIPCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.
 CUARTOS: 12
 RESIDENTE DE OBRA: ARQ. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO
 FECHA DE INICIO: 04/05/2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 01/08/2023
 MUNICIPIO: SAN IGNACIO RÍO MUERTO



NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 6. RAMONA FRANCISCA LUNA VELAZQUEZ % AVANCE 100% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) ALBAÑILERÍAS. 3) PUERTAS Y VENTANAS. 4) INSTALACIÓN ELECTRICA. 5) ACABADOS.



NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 7. ROSENDA VALENZUELA MOROYOQUI % AVANCE 100% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) ALBAÑILERÍAS. 3) PUERTAS Y VENTANAS. 4) INSTALACIÓN ELECTRICA. 5) ACABADOS.



NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 8. REY ARTURO RUBALCAVA GARCIA % AVANCE 61% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	COMENTARIOS:
		1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 6) LOSA CON SISTEMA DE VIGUETA Y CASETÓN DE POLIESTIRENO. 7) ACABADO DE ALERO EN LOSA. 8) APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 9. RAFAEL MOLINA GARCIA % AVANCE 57% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 6) LOSA CON SISTEMA DE VIGUETA Y CASETÓN DE POLIESTIRENO. 7) ACABADO DE ALERO EN LOSA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 10. ELENA LOPEZ RIVERA % AVANCE 57% LOCALIDAD: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	COMENTARIOS:
			1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 6) LOSA CON SISTEMA DE VIGUETA Y CASETÓN DE POLIESTIRENO. 7) ACABADO DE ALERO EN LOSA.




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA



VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN: 08-jun-23	CONTRATO: SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA: C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO: \$1,523,920.50
NUMERO DE OBRA: C-00075/0861	DESCRIPCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO.		CUARTOS: 12
RESIDENTE DE OBRA: ARQ. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO: 04/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 01/08/2023	MUNICIPIO: SAN IGNACIO RÍO MUERTO

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 11. KARLA ISABEL MIRANDA QUIJADA **% AVANCE** 57% **LOCALIDAD:** SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1 	FOTO 2 	FOTO 3 	COMENTARIOS: 1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 6) LOSA CON SISTEMA DE VIGUETA Y CASETÓN DE POLIESTIRENO. 7) ACABADO DE ALERO EN LOSA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 12. ARNULFO AYALA VALENZUELA **% AVANCE** 61% **LOCALIDAD:** SAN IGNACIO RÍO MUERTO

FOTO 1 	FOTO 2 	FOTO 3 	COMENTARIOS: 1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 6) LOSA CON SISTEMA DE VIGUETA Y CASETÓN DE POLIESTIRENO. 7) ACABADO DE ALERO EN LOSA. 8) APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESUMEN

HALLAZGOS:

EN 12 DE 12 ACCIONES VISITADAS, YA SE TERMINO LA PARTIDA DE PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ALBAÑILERIA (EXCEPTO EL FIRME) Y TECHUMBRE.

CONCLUSIÓN:

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 73%.

% AVANCE FISICO DE LA OBRA 73%

ARQ. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO

RESIDENTE DE OBRA

C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CP. ALMA DELIA LIMON MORENO




SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL




PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)




DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA




VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA




FECHA DE VERIFICACIÓN: 09-jun-23	CONTRATO: SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA: C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO: \$1,015,947.01
NUMERO DE OBRA: C-00075/0858	DESCRIPCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS	FECHA DE INICIO: 04/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 01/08/2023
RESIDENTE DE OBRA: ARQ. MARIO EFRÉN BERMÚDEZ NAVARRO			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA): 8
			MUNICIPIO: PÓTAM

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 1. GEORGINA CRUZ PALMA	% AVANCE 48%	LOCALIDAD: PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
COMENTARIOS: 1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO.		

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 2. RAFAELA GUADALUPE CHOQUI ZAYAS	% AVANCE 48%	LOCALIDAD: PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
COMENTARIOS: 1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO.		

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 3. PEDRO LUZANILLA VALENZUELA	% AVANCE 48%	LOCALIDAD: PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
COMENTARIOS: 1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO.		

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 4. ELSA PAULINA VALENZUELA ZUÑIGA	% AVANCE 57%	LOCALIDAD: PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
COMENTARIOS: 1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 6) LOSA CON SISTEMA DE VIGUETA Y CASETÓN DE POLIESTIRENO. 7) ACABADO DE ALERO EN LOSA.		

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 5. FIDEL AMARILLAS ALIPAZ	% AVANCE 48%	LOCALIDAD: PÓTAM
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
COMENTARIOS: 1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO.		

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE 2022)

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

VERIFICACIÓN FÍSICA PARA CIERRE DE OBRA

FECHA DE VERIFICACIÓN:	09-jun-23	CONTRATO:	SEDESSON-FISE-2023-002	CONTRATISTA:	C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	IMPORTE COMPROMETIDO:	\$1,015,947.01
NUMERO DE OBRA:	C-00075/0858	DESCRIPCIÓN DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PÓTAM MUNICIPIO DE GUAYMAS			CUARTOS (ZAPATA Y TECHO DE LAMINA):	8
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. MARIO EFRÉN BERMÚDEZ NAVARRO	FECHA DE INICIO:	04/05/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	01/08/2023	MUNICIPIO:	PÓTAM

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 6. ANA MARIA HURTADO LEYVA

% AVANCE 57%

LOCALIDAD: PÓTAM


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



COMENTARIOS:

1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 6) LOSA CON SISTEMA DE VIGUETA Y CASETÓN DE POLIESTIRENO. 7) ACABADO DE ALERO EN LOSA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 7. LUZ VERONICA PIÑA AMARILLAS

% AVANCE 57%

LOCALIDAD: PÓTAM

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



COMENTARIOS:

1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO. 6) LOSA CON SISTEMA DE VIGUETA Y CASETÓN DE POLIESTIRENO. 7) ACABADO DE ALERO EN LOSA.

NOMBRE DE LA (EL) BENEFICIARIA-O: 8. MARIA ROBERTA BACASEGUA VALENZUELA

% AVANCE 48%

LOCALIDAD: PÓTAM

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



COMENTARIOS:

1) PRELIMINARES. 2) CIMENTACIÓN. 3) MURO A BASE DE BLOCK. 4) CASTILLO A BASE DE CONCRETO ARMADO. 5) CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO.

RESUMEN

HALLAZGOS:

EN 8 DE 8 ACCIONES VISITADAS, YA SE INICIO LA OBRA Y TODAS LAS ACCIONES CUENTAN CON LAS PARTIDAS DE PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN CONCLUIDO.
EN 3 DE 8 ACCIONES VISITADAS, SE ENCUENTRA LOSA COLADA Y ACABADO DE ALERO.

CONCLUSIÓN:

CON ESTA REVISIÓN SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL AVANCE PROMEDIO GENERAL DE ESTA OBRA ES DE UN 51%.

% AVANCE FISICO DE LA OBRA 51%

ARQ. MARIO EFRÉN BERMUDEZ NAVARRO

RESIDENTE DE OBRA

C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO

REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CP. ALMA DELIA LIMON MORENO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
