


**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
GRAFICA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
PROGRAMADO Vs REAL**

CONTRATO		
FECHA	SEM 1 27-30 NOV	SEM 2 01-09 DIC
SEMANAL	\$118,249.71 18.66%	\$515,457.19 81.34%
ACUMULADO	\$118,249.71 18.66%	\$633,706.90 100.00%

EJECUTADO REAL		
FECHA	SEM 1 27-30 NOV	SEM 2 01-09 DIC
SEMANAL	\$139,415.52 22.00%	\$494,291.38 78.00%
ACUMULADO	\$139,415.52 22.00%	\$633,706.90 100.00%

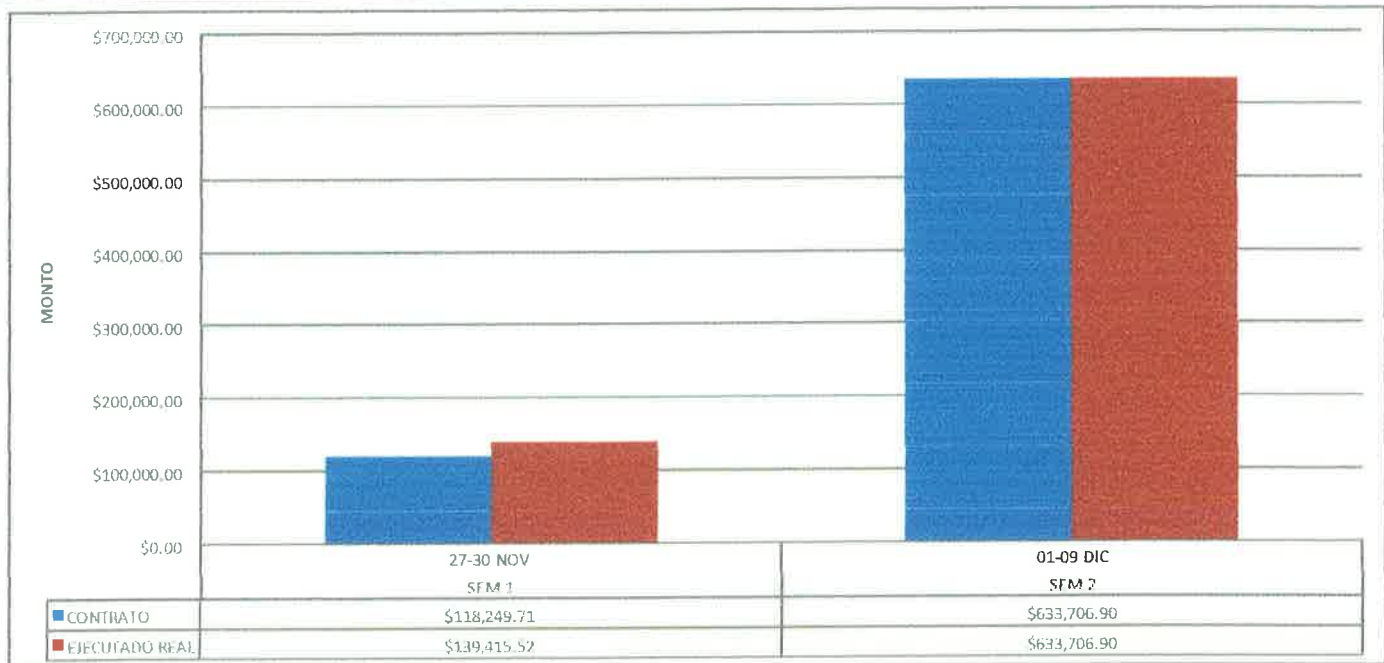

Nº. Y NOMBRE DE LA OBRA: C-00085/0120 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, PLUTARCO ELIAS CALLES, CABORCA.

CONTRATO: SEDESSON-FISE-2017-094.

SUPERVISIÓN DEPENDENCIA

SEDESSON

ING. SERGIO DIAZ PEÑA

SUPERVISIÓN EXTERNA

GRUPO JASMAA, S.A. DE C.V.

C. JUAN ADOLFO SHWARZBECK ARTEE
