

INFORME DE COMISION

Hermosillo Sonora, a 04 de Enero de 2022



ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 29 de Noviembre de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisión de avances de Obras para autorización del pago de Estimación de Cierre y recabar actas de Entrega Recepción en los Municipios de San Javier, La Colorada y Yécora, Sonora.

Lugar: San Javier, Tecoripa La Colorada, Yécora, Sonora.

Periodo: del 02 al 04 de Diciembre de 2021.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios mencionados, para llevar acabo la Supervisión de Avances de Obras, realizando las actividades que a continuación menciono:

(02 al 04 de Diciembre 2021).- Primeramente se inició con la Supervisión del contrato SEDESSON-FISE-2021-050, con las Obra: C-00075/0681 Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de Tecoripa, Municipio de la Colorada y la Obra C-00075/0682 Construcción de Baños con Descarga Domiciliaría en la Localidad de Tecoripa, Municipio de la Colorada; En compañía del Superintendente de Obra, se dio recorrido por las viviendas y los módulos sanitarios, ubicadas en varias colonias de la localidad, revisando 9 cuartos dormitorios, que se encontraban en proceso de construcción, con la terminación de aplanado en yeso en cielo y enjarres interior y exterior en muros, además trabajan en el perfilado de marcos de puertas y ventanas para su instalación, considerando un avance en general del 92% de la obra aproximadamente, mientras que los módulos sanitarios se revisaron las 5 ubicaciones, teniendo un avance en general del 86%, teniendo pendientes algunos enjarres de área húmeda y el colado de una losa de azotea, para iniciar con las instalaciones de muebles sanitarios, recabando archivo fotográfico de los trabajos, observando trabajos de buena calidad y de acorde a especificaciones de proyecto. Después nos trasladamos al Municipio de San Javier, a Supervisión del contrato: SEDESSON-FISE-2021-049, con las Obra: C-00075/0671 Construcción de Cuarto Dormitorio en la Localidad de San Javier, Municipio de San Javier y la Obra C-00075/0672 Construcción de Baños con Descarga Domiciliaría en la Localidad de San Javier, Municipio de San Javier, de la misma forma se dio recorrido por varias ubicaciones, donde se supervisaron los avances en 5 cuartos dormitorios y 6 módulos sanitarios, observando que se trabajan en aplanados en muros y colocación de vigueta y casetón para el colado de una losa de azotea faltante, teniendo un avance aproximado al 80% de la obra, mientras que los módulos sanitarios se revisaron las 6 ubicaciones, teniendo un avance en general del 76%, teniendo pendientes 2 Losas de azotea por colar, pero se

INFORME DE COMISION

trabajaban en los enjarres en área húmeda para iniciar con los acabados en pintura, además se realizaban colados de registros sanitarios de acuerdo a especificaciones de proyecto, recabando archivo fotográfico de los trabajos. Después nos trasladamos Municipio de Yecora, para la revisión del contrato SEDESSON-FISE-2021-029, para las Obra: C-00077/0249 Ampliación de Alcantarillado en Varias Calles de la Localidad de Yecora, Municipio de Yecora, realizando recorrido con el encargado de la Obra, Ing. Juan Ramón Ruiz, encontrando toda la red de atarjeas ya completa con tubería instalada, pozos de visita contruidos con brocal de policoncreto, zanjas y calles tapadas, reposición de pavimento, descargas contruidas con marco y contramarco de acero y concreto, se tiene pendientes la colocación de escalones en pozos de visita marcados en la visita de la contraloría y el retiro de material "C" y desperdicios en calle Yecora, que se utilizó para proteger el recarpeteo, considerando un avance en general del 100% de la Obra aproximadamente, quedando pendiente la conexión de los beneficiarios para que la obra opere en su totalidad, recabando archivo fotográfico de los trabajos. También se revisó el contrato SEDESSON-FISE-2021-052, para las Obra: C-00085/0339 Ampliación Red de Agua Potable en Varias Calles de Yecora, Municipio de Yecora, de la misma forma en recorrido con el encargado de la obra se encontrando toda la red hidráulica instalada, con las tomas domiciliarias completas con columpios de Fo.Go., considerando un avance en general del 100% de la Obra, considerada como una obra terminada y operando, recabando archivo fotográfico de los trabajos. En el Municipio de Yecora no se pudo recabar el sello en el Ayuntamiento por la visita realizada, pero fue firmado por la Secretaría de Obras Públicas, firmando documento de recibido.

Se anexa reporte fotográfico.

Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.





ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA



INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRÁFICO



- Cuartos Tecoripa, La Colorada

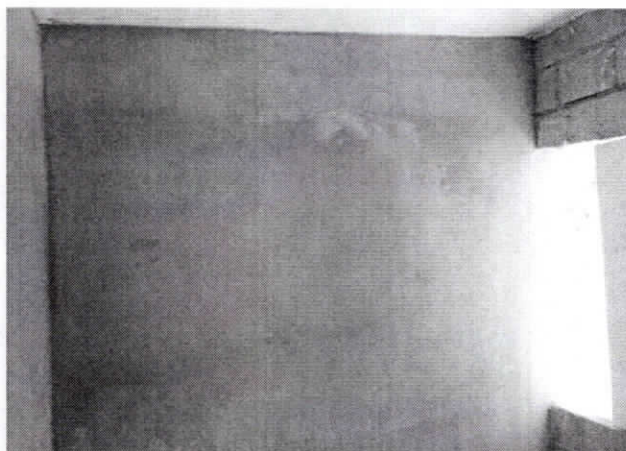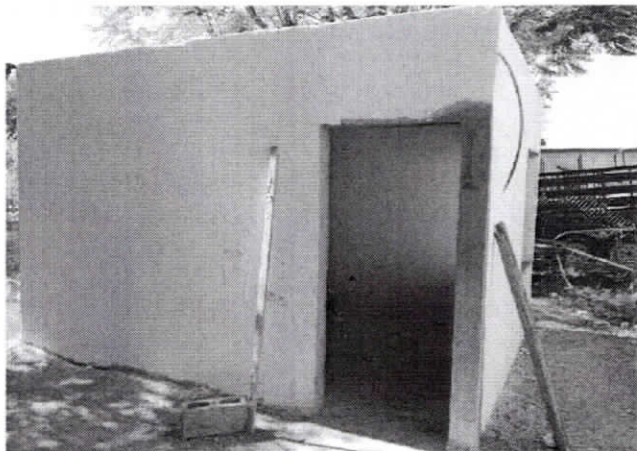

- Baños Tecoripa, La Colorada

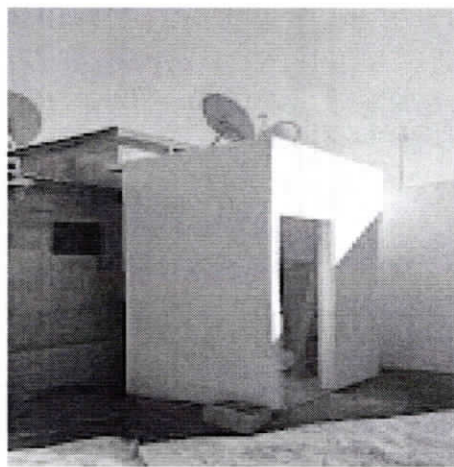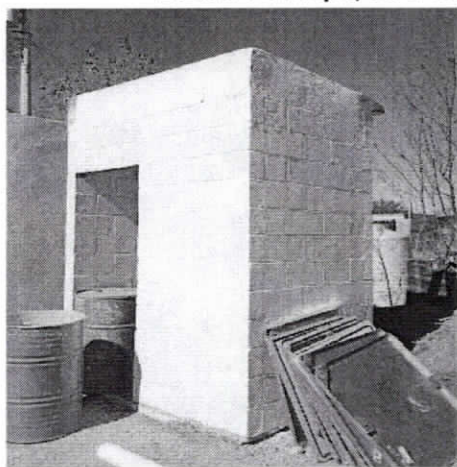

- Cuartos San Javier, San Javier


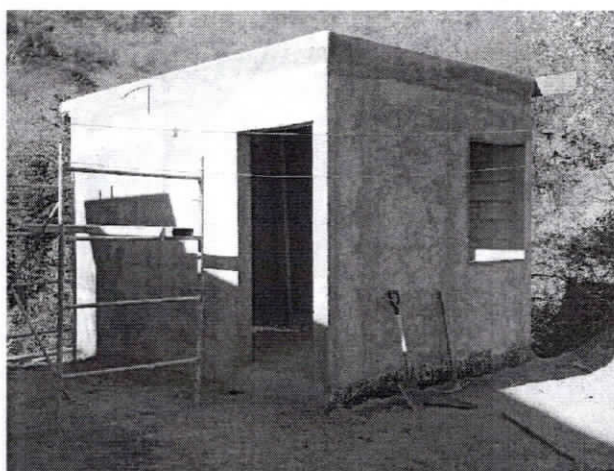
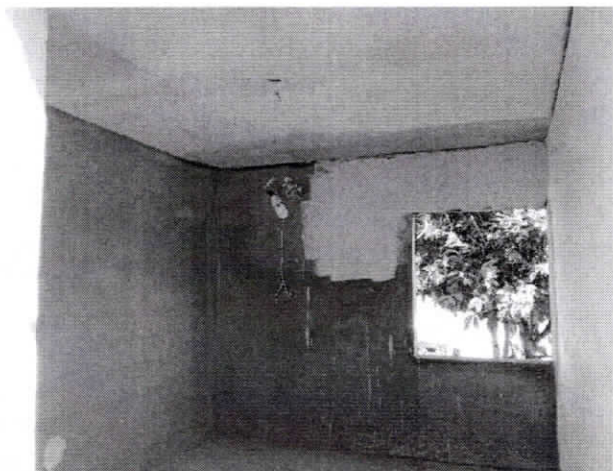


Comisión


INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRAFICO


- Baños San Javier, San Javier

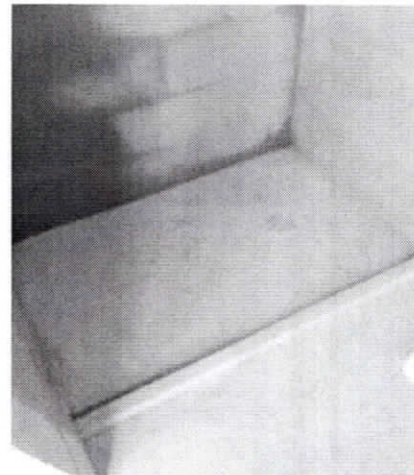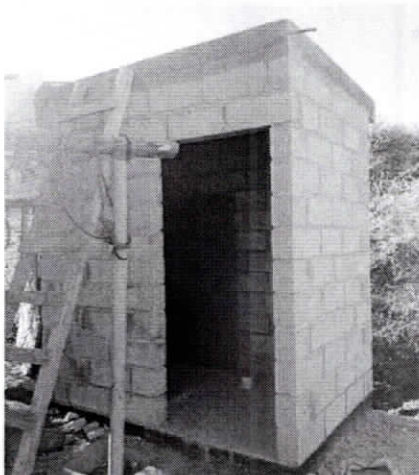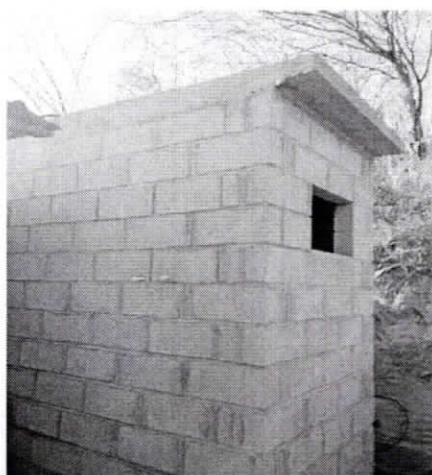

- Alcantarilado Varias Calles Yecora

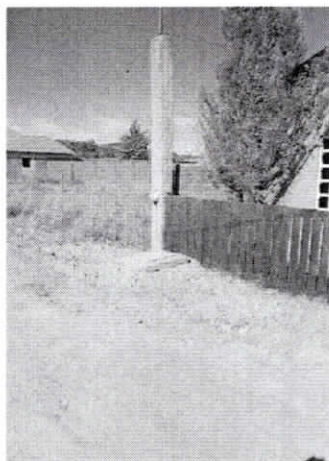

- Agua Potable Varias Calles Yecora

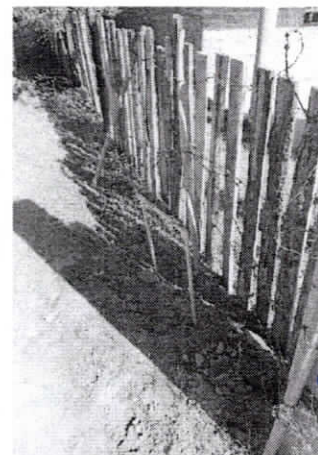

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

923-I
Liliana Reyes
H. Ayuntamiento de San Javier, Sonora
RECIBIDO PARA REVISIÓN

Hermosillo, Sonora, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISIÓN DE AVANCES DE OBRAS PARA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE ESTIMACIONES DE CIERRE Y RECABAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JAVIER, LA COLORADA Y YECORA, SONORA.

Se le comisiona a:

SAN JAVIER, LA COLORADA Y YECORA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 02 DICIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Modelo 2017

Placas VD-64-443

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,100.00

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA

Resibido para
Revisión
03/12/21
Crosita Arellano
Yecora Son.
Sin sello
Secretaria de Obras
