



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

2319-1

HERMOSILLO, SONORA; A 24 DE OCTUBRE DE 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIDO
25 OCT 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BASICA
P R E S E N T E . –**

EN RELACION AL RECURSO DE LA SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN 2022 PARA LA SUPERVISION DE OBRA EN CAMPO, DE LA COMISIÓN DEL DÍA **18 AL 22 DE OCTUBRE** DEL PRESENTE AÑO A LOS MUNICIPIOS DE PITIQUITO, CABORCA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO Y PUERTO PEÑASCO, SONORA. PARA LA REVISION Y SUPERVISION DE OBRA, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CANTIDADES EJECUTADAS, PARA LAS OBRAS DEL PROGRAMA FISE 2022.

PITIQUITO, SONORA:

N° DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2022-040.

N° DE LA OBRA: C-00077/0316

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE PITIQUITO, MUNICIPIO DE PITIQUITO.

DESTINO DE LA COMISION: PITIQUITO, SONORA

PERIODO DE LA COMISION: 18 AL 22 DE OCTUBRE

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (%): 5.00%.

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS:

EL ING. EN MANUEL OROZCO Y YO, REALIZAMOS VISITA A LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE PITIQUITO, DONDE NOS RECIBIO LA ING. LESTHER MARIA DIR. DE OBRAS DEL MUNICIPIO, SE LE COMENTO E INVITO AL RECORRIDO QUE REALIZARIAMOS AL PROYECTO DE LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN PITIQUITO, EN CAMPO SE ENCONTRO QUE EL CONTRATISTA YA TENIA EL CORTE A LA CALLE CON CORTE CON DISCO A TODO LO LARGO DEL TRAZO, SE TOMÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LA UBICACION DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS.

PITIQUITO, SONORA



[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

CABORCA, SONORA:

N° DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2022-031.

N° DE LA OBRA: C-00077/0313.

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALO VERDE EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA.

DESTINO DE LA COMISION: CABORCA, SONORA.


PERIODO DE LA COMISION: 18 AL 22 DE OCTUBRE

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (%): 45.00%.

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS:

EL ING. ENMANUEL OROZCO Y YO, REALIZAMOS VISITA A LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE CABORCA, DONDE NOS RECIBIO EL ING. PABLO ARRIZON DIR. DE OBRAS DEL MUNICIPIO, SE LE COMENTO E INVITO AL RECORRIDO QUE REALIZARIAMOS AL PROYECTO DE LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CABORCA, EN CAMPO SE ENCONTRO QUE EL CONTRATISTA YA TENIA MAS DE LA MITAD DE TODO EL TRAZO, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBO, RELLENO Y COMPACTACION Y POZOS. SE TOMÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LAS UBICACIONES DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS.

CABORCA, SONORA

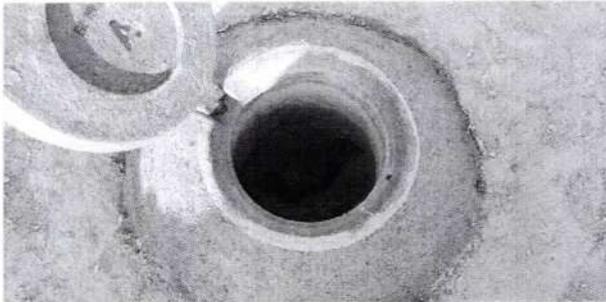



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

CABORCA, SONORA:

N° DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2022-040.

N° DE LA OBRA: C-00075/0784.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA.

DESTINO DE LA COMISION: CABORCA, SONORA.


PERIODO DE LA COMISION: 18 AL 22 DE OCTUBRE

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (%): 35.00%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS:

EL ING. EN MANUEL OROZCO Y YO, REALIZAMOS VISITA A LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE CABORCA, DONDE NOS RECIBIO EL LIC. CARLOS QUIJADA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO, SE LE COMENTO E INVITO AL RECORRIDO QUE REALIZARIAMOS AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS-DORMITORIOS EN CABORCA, EN CAMPO SE ENCONTRO QUE EL CONTRATISTA YA TENIA 10 CUARTOS-DORMITORIOS CON LOS MUROS A NIVEL PARA SUBIR VIGUETAS Y CONTINUAR CON LA LOSA, LOS OTROS 18 CUARTOS-DORMITORIOS LOS TIENE HASTA CON LA QUINTA HILADA DE BLOCK, SE TOMÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LAS UBICACIONES DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS.

CABORCA, SONORA

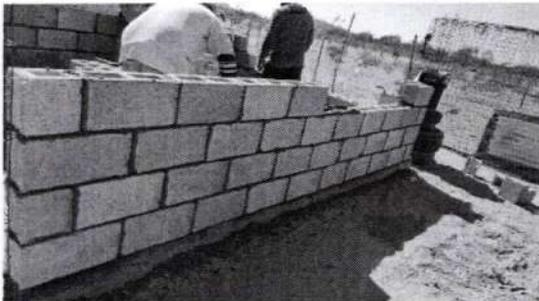

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA:

N° DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2022-020.

N° DE LA OBRA: C-00085/0366 / C-00077/0307.

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLINAS DE SONOYDAG EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.; AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLINAS DE SONOYDAG EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA, MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES.

DESTINO DE LA COMISION: GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA.

PERIODO DE LA COMISION: 18 AL 22 DE OCTUBRE

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (%): 85.00%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS:

EL ING. ENMANUEL OROZCO Y YO, REALIZAMOS VISITA A LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES DONDE NOS RECIBIO EL ING. URIEL LOPEZ DIR. DE OBRAS DEL MUNICIPIO, SE LE COMENTO E INVITO AL RECORRIDO QUE REALIZARIAMOS AL PROYECTO DE LA AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, EN CAMPO SE ENCONTRO QUE EL CONTRATISTA YA HABIA TERMINADO EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SU TOTALIDAD Y TENIA MAS DE LA MITAD DEL PROYECTO TOTAL DE AGUA POTABLE EJECUTADO, EL CONTRATISTA SOLICITO A SUPERVISION DE SEDESSON UN CONVENIO DE AMPLIACION DE PERIODO DONDE SE COMPROMETE A TERMINAR EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 TODAS LAS ACTIVIDADES, YA QUE EL 20 DE OCTUBRE DE 2022 ES EL TERMINO DEL CONTRATO ORIGINAL. SE TOMÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LAS UBICACIONES DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS.



[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA:

N° DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2022-028.

N° DE LA OBRA: C-00077/0311.

DESCRIPCION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REFORMA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO.

DESTINO DE LA COMISION: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

PERIODO DE LA COMISION: 18 AL 22 DE OCTUBRE

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (%): 35.00%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS:

EL ING. EN MANUEL OROZCO Y YO, REALIZAMOS VISITA A LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, DONDE NOS RECIBIO LA LIC. JAIRA GASTELUM DIR. DE OBRAS DEL MUNICIPIO, SE LE COMENTO E INVITO AL RECORRIDO QUE REALIZARIAMOS AL PROYECTO DE LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN SAN LUIS RIO COLORADO, EN CAMPO SE ENCONTRO QUE EL CONTRATISTA TENIA MAS CALLES TERMINADAS. SE TOMÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LAS UBICACIONES DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

PUERTO PEÑASCO, SONORA:

Nº DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2022-031.

Nº DE LA OBRA: C-00075/0775.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PEÑASCO.



DESTINO DE LA COMISION: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO DE LA COMISION: 18 AL 22 DE OCTUBRE

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (%): 35.00%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS:

EL ING. EN MANUEL OROZCO Y YO, REALIZAMOS VISITA A LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, DONDE NOS RECIBIO EL LIC. ABRAHAM MEJIA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO, SE LE COMENTO E INVITO AL RECORRIDO QUE REALIZARIAMOS AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS-DORMITORIOS EN PUERTO PEÑASCO, EN CAMPO SE ENCONTRO QUE EL CONTRATISTA YA TENIA 10 CUARTOS-DORMITORIO CON LOS MUROS A NIVEL PARA SUBIR VIGUETAS Y CONTINUAR CON LA LOSA, LOS 10 CUARTOS-DORMITORIOS RESTANTES LOS TIENE HASTA CON LA 5TA HILADA DE BLOCK. SE TOMÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LAS UBICACIONES DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS.

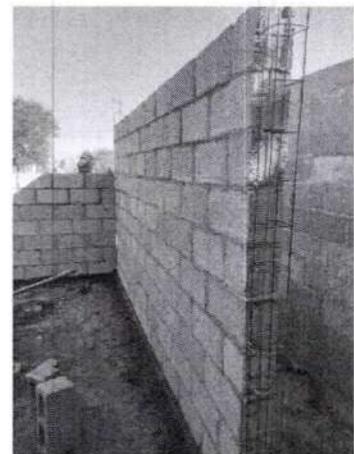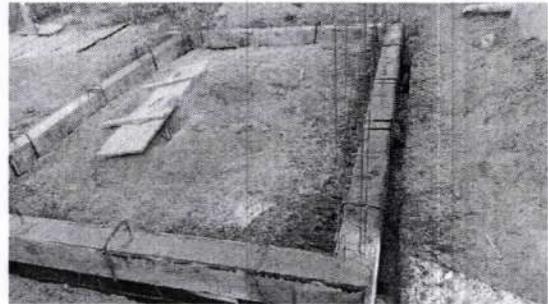

Handwritten signature



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

PUERTO PEÑASCO, SONORA:

N° DE CONTRATO: SEDESSON-FISE-2022-044.

N° DE LA OBRA: C-00075-0802.

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN PUERTO PEÑASCO.



DESTINO DE LA COMISION: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

PERIODO DE LA COMISION: 18 AL 22 DE OCTUBRE

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA (%): 85.00%

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZADAS:

EL ING. ENMANUEL OROZCO Y YO, REALIZAMOS VISITA A LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, DONDE NOS RECIBIO EL LIC. ABRAHAM MEJIA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO, SE LE COMENTO E INVITO AL RECORRIDO QUE REALIZARIAMOS AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS-DORMITORIOS EN PUERTO PEÑASCO, EN CAMPO SE ENCONTRO QUE EL CONTRATISTA YA TENIA TODOS LOS CUARTOS-DORMITORIOS DE SU CONTRATO LOS MUROS A NIVEL PARA SUBIR VIGUETAS Y CONTINUAR CON LA LOSA. SE TOMÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EN LAS UBICACIONES DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS.

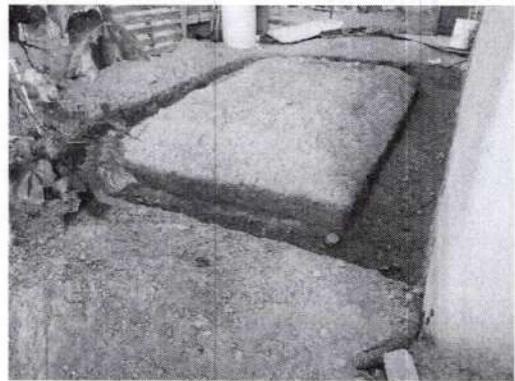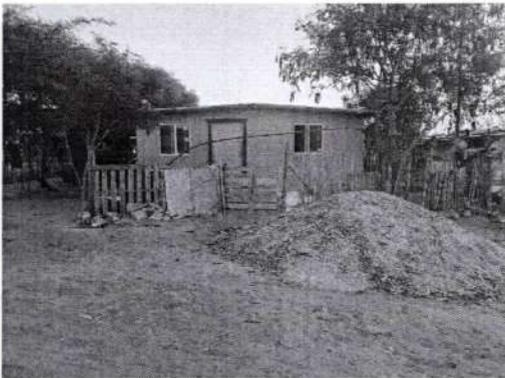


Manuel Orozco



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

Gobierno
de **SONORA**

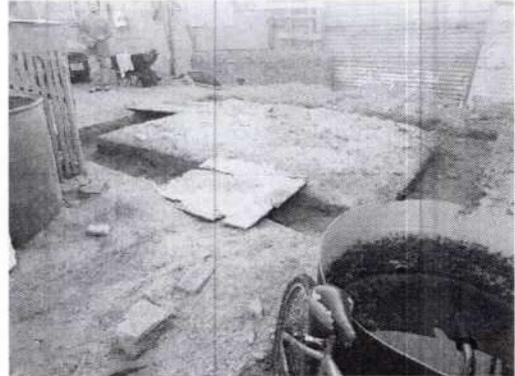

- Se anexan fotos

ATENTAMENTE.-

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE
SUPERVISOR DE OBRA

c.c.p. archivo personal





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA



HERMOSILLO, SONORA. 03 DE OCTUBRE DE 2022

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISE 2022, VISITAS A LOS SITIOS PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRA 1.-C-00077/0313, C-00075/0775 DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-031, 2.- C-00085/0366, C-00077/0307 DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-020. 3.- C-00077/0311 DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-028. 4.- C-00125/0017, C-00125/0021 DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-023.

Se le comisiona a:

PITIQUITO, CABORCA, GENERAL PLUTARCO E. CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO Y PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 18 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022

Vehículo No. 25

Marca FORD

Placas VC-31-189

Modelo 2007

Tipo PICK UP F 150

CONTROL NET:	
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES ROJO CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. CESAR ELIZABETH SANTICRUZ - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado
OBRAS PUBL.
SONOYTA, SONO.



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024
DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL
