



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
del SONORA

2320-T

Hermosillo, Sonora; a 24 de Octubre de 2022

**ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO**  
**ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION**  
**GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA**  
**P R E S E N T E. –**

En referencia a la solicitud de viáticos para la comisión del día **18 al 22 de Octubre** del presente año a los municipios de Pitiquito, Caborca, General Plutarco Elias Calles, San Luis Rio Colorado y Puerto Peñasco, Sonora para las obras del programa FISE 2022.

**OBJETIVOS:** Visita de obra para supervisión y verificación física del programa FISE 2022.

**LOCALIDADES:** Pitiquito, Caborca, General Plutarco Elias Calles, San Luis Rio Colorado y Puerto Peñasco, Sonora.

**RESULTADOS:**

Se realizó visita al Palacio Municipal de Pitiquito para informarles a las autoridades municipales que realizaríamos visita de obra al contrato en proceso en su municipio SEDESSON-FISE-2022-040 con la obra C-00077-0316 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN PITIQUITO, donde nos recibió la Ing. Lesther María Director de Obra del municipio, en campo el contratista solamente tenía de avance el concepto de corte con disco para concreto ejecutado y cuenta con un avance físico del 5.00%, se tomó evidencia fotográfica en la ubicación donde se realizan los trabajos.

También se realizó visita al Palacio Municipal de Caborca para informarles a las autoridades municipales que realizaríamos visita de obra a los contratos en proceso en su municipio SEDESSON-FISE-2022-031 con la obra C-00077-0313 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. PALO VERDE, CABORCA y SEDESSON-FISE-2022-040 con la obra C-00075-0784 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE CABORCA, donde nos recibieron el Ing. Pablo Arrizon Dir. De Obras y el Lic. Carlos Quijada Dir. de Desarrollo Social del municipio, en campo el contratista tenía de avance los conceptos de Trazo, excavación, Plantilla, Tubería de 8", relleno y pozos de visita ejecutados a la mitad del contrato y contaba con un avance físico del 45.00%, se tomó evidencia fotográfica en la ubicación donde se realizan los trabajos.

También se realizó visita al Palacio Municipal de General Plutarco Elias Calles para informarles a las autoridades municipales que realizaríamos visita de obra al contrato en proceso en su municipio SEDESSON-FISE-2022-020 con las obras C-00085-0366 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SONOYDAG, LOC. SONOYTA y C-00077-0307 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SONOYDAG LOC. SONOYTA, donde nos recibió el Ing. Uriel López Dir. De Obras del municipio, en campo el contratista tenía terminado a su totalidad los conceptos de obra Ampliación de Alcantarillado y de la obra Ampliación de Agua Potable solamente tenía de avance la mitad de los conceptos de contrato y contaba con un avance físico del 85.00%, se le informo al contratista que el periodo de contrato termino el 20 de octubre de 2022, el contratista comento que solicitaría un convenio de ampliación de periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

Gobierno  
de **SONORA**

comprometiéndose a terminar el día 04 de noviembre de 2022, se tomó evidencia fotográfica en la ubicación donde se realizan los trabajos.

También se realizó visita al Palacio Municipal de San Luis Rio Colorado para informarles a las autoridades municipales que realizaríamos visita de obra al contrato en proceso en su municipio SEDESSON-FISE-2022-028 con la obra C-00077-0311 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, COL REFORMA, SAN LUIS RIO COLORADO, donde nos recibió la Lic. Jaira Gastelum Dir. De Obras del municipio, en campo el contratista tenía con el avance de 3 calles terminadas del contrato y contaba con un avance físico del 35.00%, se tomó evidencia fotográfica en la ubicación donde se realizan los trabajos.

También se realizó visita al Palacio Municipal de Puerto Peñasco para informarles a las autoridades municipales que realizaríamos visita de obra a los contratos en proceso en su municipio, donde nos recibió el Lic. Abraham Mejía Dir. De Desarrollo Social del municipio, los contratos son SEDESSON-FISE-2022-031 con la obra C-00075-0775 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PUERTO PEÑASCO en campo el contratista tenía un avance físico de todos los cuartos-dormitorios empezados y a la altura de 5ta hilada de block y cuentan con un avance físico cada uno del 35.00% y SEDESSON-FISE-2022-044 con la obra C-00075-0802 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN PUERTO PEÑASCO, en campo el contratista tenía un avance físico de todos los cuartos-dormitorios empezados y a la altura de vigueta y continuar con la losa y cuentan con un avance físico cada uno del 85.00%, se tomó evidencia fotográfica en la ubicación donde se realizan los trabajos.

PITIQUITO, SONORA








SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

ALCANTARILLADO CABORCA, SONORA

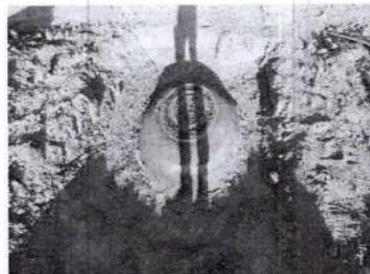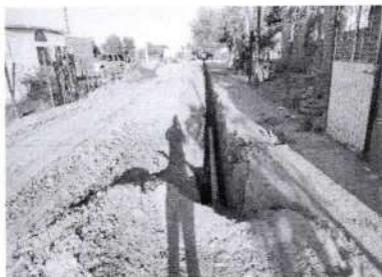


CUARTOS-DORMITORIOS CABORCA, SONORA

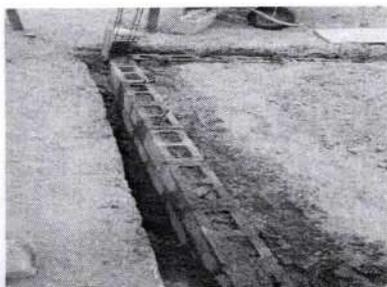

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONORA



SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA

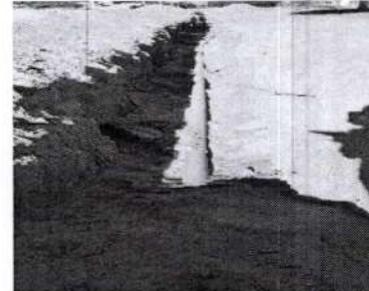



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE **SONORA**

PUERTO PEÑASCO, SONORA



Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

- Se anexan fotos

ATENTAMENTE. -

---

**MTRO. JOSE ENMANUEL OROZCO AISPURO**  
DIRECTOR DE AREA

C.c.p. archivo personal





XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
2021 - 2024

**DIRECCION DE DESARROLLO  
SOCIAL**



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA



**OBRAS PUBLICAS**  
SONOYTA, SONORA.

HERMOSILLO, SONORA. 17 DE OCTUBRE DE 2022

ING. JOSE ENMANUEL OROZCO AISPURO  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISE 2022, VISITAS A LOS SITIOS PARA REALIZAR SUPERVISION DE OBRA 1.-C-00077/0313, C-00075/0775 DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-031, 2.- C-00085/0366, C-00077/0307 DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-020. 3.- C-00077/0311 DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-028. 4.- C-00125/0017, C-00125/0021 DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-023.

Se le comisiona a:

PITQUITO, CABORCA, GENERAL PLUTARCO E. CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO Y PUERTO PEÑASCO, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 18 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022

Vehículo No. 25

Marca FORD

Placas VC-31-189

Modelo 2007

Tipo PICK UP F 150

CONTROL NET:	250 LITROS
CASSETAS:	\$630.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

*Lourdes Rojo Cruz*  
LIC. LOURDES ROJO CRUZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo  
C.c.p. CESAR DE LA CRUZ SANTACRUZ - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

