



Gobierno
de SONORA
DESARROLLO
SOCIAL

Hermosillo, Sonora; a 25 de enero del 2023

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 18 al 21 de enero del 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Revisión de obras en proceso ejecutadas con el fondo FISE (Fondo de Infraestructura Social para las Entidades)



LUGAR DE COMISION: Ónavas, Yécora, Rosario y sus localidades, Quiriego y sus localidades, Etchojoa y sus localidades.

Resultados

Ónavas

Se revisaron las obras ejecutadas con el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) con número de contrato SEDESSON-FISE-2022-051 en el municipio de Ónavas, para la revisión se contó con la presencia de la Contralora Alma Acosta y la responsable de Comunicación Social Celina Granillo. Se visitaron 13 cuartos dormitorios en los cuales se encontraron avances en la cimentación, trabajos de albañilería como muros, castillos de concreto, pisos firmes, cadena de cerramiento, en algunos cuartos ya contaban con trabajos de techumbre finalizados a base de lámina galvanizada canalada instalados con polín monten de 3" a 4", teniendo un avance promedio del 50%.

| Municipio | Ónavas | Localidad | Ónavas |
|------------------------|---|---------------------|---------------|
| Número de contrato | SEDESSON-FISE-2022-051 | Monto a invertir | \$ 968,222.42 |
| Descripción de la obra | C-00075/0804 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS, MUNICIPIO DE ÓNAVAS | | |
| Fecha de visita | 18/01/2023 | Avance promedio (%) | 50% |

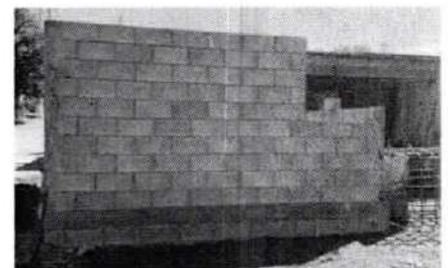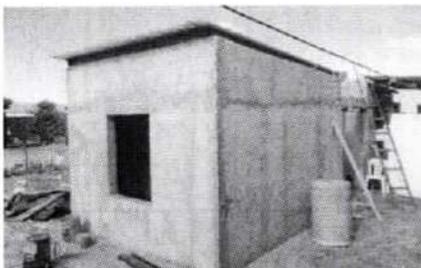

Yécora

Me presenté con la Presidenta Municipal la C. Yadira Espinoza Méndez y el Director de Obras el Ing. Fausto Avilez, donde junto realizamos el recorrido de 11 cuartos para baños en la cabecera del municipio en la colonia san Juan Diego, los cuales cuentan con el avance de un promedio del 80% faltando por instalar los biodigestores, los tinacos de alta resistencia de 450 litros, así como los registros sanitarios y en algunos cuartos la segunda mano de pintura. Todos los cuartos cuentan con trabajos de cimentación, albañilería como son muros de block, cadena de cerramiento, y piso firme, al igual cuentan con la techumbre a base de losa con sistema de viga y casetón de poliestireno. Se habló con el contratista y comenta finalizará los trabajos en una a dos semanas más.

| Municipio | Yécora | Localidad | Yécora |
|------------------------|--|---------------------|---------------|
| Número de contrato | SEDESSON-FISE-2022-055 | Monto a invertir | \$ 616,209.80 |
| Descripción de la obra | C-00075/0786 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YÉCORA, MUNICIPIO DE YÉCORA | | |
| Fecha de visita | 18/01/2023 | Avance promedio (%) | 80% |



Rosario

Me dirigí a las instalaciones del Palacio Municipal, en donde me reuní con el secretario el C. Miguel Arvizu y María de Jesús Monge directora de Desarrollo Social del municipio en donde se planeó la ruta de revisión del contrato SEDESSON-FISE-2022-505 que consta de dos obras en 2 localidades y la cabecera municipal, al terminar la reunión se procedió a la revisión de las obras. Nos dirigimos a la localidad de Paredones en Rosario, donde se revisaron 7 baños con biodigestor de la obra 00075/0786 donde se encontraron avances con losas cimentadas, muros de block con castillos ahogados, en algunos cuartos ya cuentan con cadena de cerramiento y losa de viga y casetón teniendo un avance total del 40% en promedio.




Al terminar el recorrido nos dirigimos a la localidad La Estrella para revisar la obra 00075/0806 que consta de 12 cuartos dormitorios, de cuales 6 se encuentran en esta localidad. Se pudo observar los avances con muros levantados, losas de concreto, comienzos de enjarre grueso. Proseguimos con el recorrido para revisar los 6 cuartos restantes en la cabecera municipal, en la cual se encontraron con cuadrillas trabajando en muros, enjarre grueso. Se estima un promedio de avance entre las dos localidades del 55%.



GOBIERNO
de SONORA

DESARROLLO
SOCIAL

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------|
| Municipio | Rosario | Localidad | Paredones |
| Número de contrato | SEDESSON-FISE-2022-050 | Monto a invertir | \$ 392,165.59 |
| Descripción de la obra | C-00075/0786 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PAREDONES (EL SAUCITO), MUNICIPIO DE ROSARIO | | |
| Fecha de visita | 19/01/2023 | Avance promedio (%) | 40% |

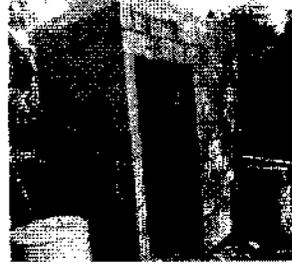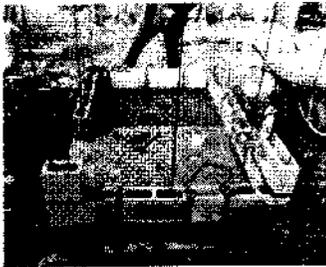


| | | | |
|------------------------|---|---------------------|--|
| Municipio | Rosario | Localidad | Localidad La Estrella y Cabecera Rosario |
| Número de contrato | SEDESSON-FISE-2022-050 | Monto a invertir | \$ 894,371.20 |
| Descripción de la obra | C-00075/00806 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO- DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO | | |
| Fecha de visita | 19/01/2023 | Avance promedio (%) | 55% |

Localidad la Estrella



Rosario, cabecera

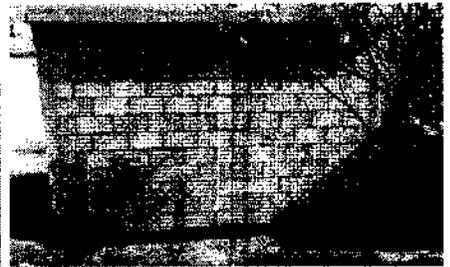

Quiriego

Estuve en la cabecera municipal donde fui atendido por Manuela Aurora Amaya Secretaria de Servicios Públicos en donde nos acompañó a la revisión de 16 cuartos dormitorios en la cabecera municipal y las localidades Batacosa y Cabora de la obra 00075/0805 del contrato SEDESSON-FISE-2022-050, donde en la cabecera municipal se encuentran 10 cuartos dormitorios, estos presentan trabajos concluidos de cimentación, trabajos de albañilería como levantamiento de muros de block, castillos de concreto, cadena de cerramiento y piso firme de concreto. Se encontraron cuadrillas trabajando en acabados y en techumbres.

Se visitó la Localidad de Batacosa para la revisión de 4 cuartos donde se encontraron con trabajos de cimentación terminados, muros levantados, y colado de castillos. Para finalizar el recorrido llegué a la localidad de Bacusa en donde se revisaron 2 cuartos los cuales presentaban el mismo avance que la localidad anterior faltando por terminar de colar castillos, construir el piso firme y la losa de concreto, así como puertas y ventas, instalación eléctrica y acabados.

| Municipio | Quiriego | Localidad | Localidades Batacosa, Cabora y Cabecera Quiriego |
|------------------------|--|---------------------|--|
| Número de contrato | SEDESSON-FISE-2022-050 | Monto a invertir | \$ 1,192,624.26 |
| Descripción de la obra | C-00075/00805 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO- DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO | | |
| Fecha de visita | 20/01/2023 | Avance promedio (%) | 40% |

Cabecera municipal




Batacosa







Cabora

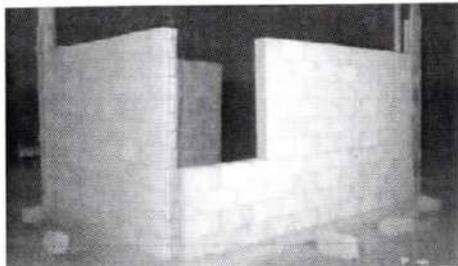

Etchojoa

Por último, me dirigí a Etchojoa para la revisión del contrato SEDESSON-FISE-2022-025 número de obra 00075/0761 donde se visitó la localidad La Línea de Basconcobe para la revisión de cuartos dormitorios en donde se encontraron avances del 98% en promedio, teniendo trabajos concluidos de cimentación, albañilería como son muros de blocks, castillos de concreto, cadena de cerramiento, piso firme, techumbre a base de losa con sistema de vigueta y casetón, instalación de puertas, instalación eléctrica ya funcionando, acabados como son plafón de yeso, impermeabilización de losa de azotea, aplanado grueso y fino en muros y pintura vinílica color blanco en exterior e interior, faltando solamente la instalación de ventanas. Se sostuvo una plática con el contratista el cual indica que en un par de días quedarán listas las ventanas instaladas.

| Municipio | Etchojoa | Localidad | Localidad Línea de Basconcobe |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------------|
| Número de contrato | SEDESSON-FISE-2022-25 | Monto a invertir | \$ 1,443,312.16 |
| Descripción de la obra | C-00075/0761 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO- DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA | | |
| Fecha de visita | 21/01/2023 | Avance promedio (%) | 98% |

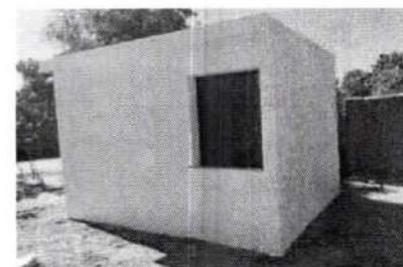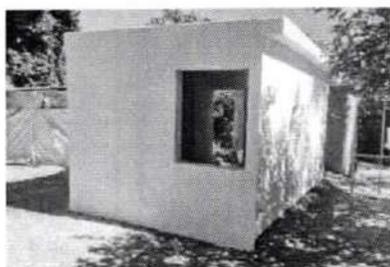

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ MANUEL JURADO PARTIDA
COORDINADOR REGIONAL FAIS

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

F-0024



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Dirección de Desarrollo Social
Municipio de Etchojoa, Sonora

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Hermosillo, Sonora, 17 de enero de 2023

JOSE MANUEL JURADO PARTIDA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISION DE OBRAS EN PROCESO Y FINALIZADAS CON EL FONDO FISE PARA SU VALORACION (APOYO AL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN SEDESSON)

Se le comisiona a:

ÓNAVAS, YÉCORA, ROSARIO, QUIRIEGO, ETCHOJOA Y (SUS LOCALIDADES), SONORA

Durante el (los) día (s) 18 AL 21 DE ENERO DE 2023

Vehículo No. 106

Marca NISSAN
Modelo 2017

Placas VD-64-445
Tipo PICK UP NP 300

| | |
|--------------|------------|
| CONTROL NET: | 300 Litros |
| CASSETAS: | \$230.00 |
| GASOLINA: | \$800.00 |

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz
C.c.p. interesado

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
YECORA, SONORA

H. AYUNTAMIENTO
ONAVAS, SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento de Etchojoa
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIÓ
20-ENERO-2023
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ETCHOJOA, SONORA
PRESIDENCIA
