



2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV

KIC1704036AA

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Alfonso Armenta, 11, Palo Verde Norte, 83280, Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México
Tel. 6621872792

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

GES790913CTO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

COMONFORT Y DR PALIZA SN, 83260, Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México

Factura 627

FOLIO FISCAL (UUID)

1FB96EDC-A73A-4661-954F-5469F5FA0F13

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505495690

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-11-25T12:16:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-11-25T11:06:29

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83280

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
0.20%	0.2% I.C.I.C.	\$ 490.03
0.20%	0.2% INSP. Y VIGILANCIA	\$ 490.03
0.03%	0.03% UNIVERSIDADES	\$ 73.50
0.03%	0.03% CECOP	\$ 73.50
0.03%	0.03% INFRAEST. EDUC.	\$ 73.50
	Total	\$ 1,200.56

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	ESTIMACION 1 (UNO) CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-051 CON NUMERO DE OBRA C-00075/0685 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS.	\$ 245,016.10	\$ 73,504.83	\$ 245,016.10

Clave Prod. Serv. - 72111006 Servicio de construcción de casas unifamiliares nuevas

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 171,511.27 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27,441.80

FACTURA ORIGINAL

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 51/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL ANTES DESCUENTO

\$ 245,016.10

DESCUENTO

\$ 73,504.83

SUBTOTAL

\$ 171,511.27

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 27,441.80

RETENCIÓN LOCAL 0.2% I.C.I.C. 0.20%

\$ 490.03

RETENCIÓN LOCAL 0.2% INSP. Y VIGILANCIA 0.20%

\$ 490.03

RETENCIÓN LOCAL 0.03% UNIVERSIDADES 0.03%

\$ 73.50

RETENCIÓN LOCAL 0.03% CECOP 0.03%

\$ 73.50

RETENCIÓN LOCAL 0.03% INFRAEST. EDUC. 0.03%

\$ 73.50

TOTAL

\$ 197,752.51

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d6h4vCvMUIIn5LDSlvrTRyni7CT/TqBLd3SXV011BVFb9EUlup7S8Er9NMkG0hg9aN+U8ICXkKMKzxvG44uZIN5XBDIQKp8p23ew+8cUAZQxIDXPd5ya7YP3HPhuzPuOWJJPgRTJKCPGBY/8IRfuUqgybsHcPzrea8NBEG/AUNr9qowOLDwiz1d1E52XEYHCeN53Kqwn/BloKzPYTaDQ1aQlwL5DhY9pyXbjWXkZSCHIFVSI89bsFSFIVlwnv7sTylLprUkqNukonbPrX9nndVTEvzTqwxEHqtpNJVVdZtH45fDj7pWO8aNaY0QZnYXYWGWveNNO==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YPuARh+eqOKI9DFQqCjZgQuOvFbTweSj7sY6FkgikykHqG0+X9sOLi+9Cjes38aSkuw1v2vO6JOKSSgBFilyZJMXdHdKNjI8WcKR4ARKJxx+Syk3UCVh6EQIv1aQxHrZsZlON8352TIGWDiCoZCR6QD0+5mXHR/NbYMonPXjRdx+FBXosu8JWPPrmVKA9gpPEIDHiPdW4XTuB/NCOWSwyDXw3z2hXJ4jZ9bqdi0BncZggNCGdvH3DFxRqY9+cthxRHai762ZWn0xbfaZB/0CNUG96guuSAG/DC9r6Ghx3fQV00VCpuNFLdFiQlea0HGtNGvW9LqxycdXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1FB96EDC-A73A-4661-954F-5469F5FA0F13|2021-11-25T12:16:47|SVT110323827|d6h4vCvMUIIn5LDSlvrTRyni7CT/TqBLd3SXV011BVFb9EUlup7S8Er9NMkG0hg9aN+U8ICXkKMKzxvG44uZIN5XBDIQKp8p23ew+8cUAZQxIDXPd5ya7YP3HPhuzPuOWJJPgRTJKCPGBY/8IRfuUqgybsHcPzrea8NBEG/AUNr9qowOLDwiz1d1E52XEYHCeN53Kqwn/BloKzPYTaDQ1aQlwL5DhY9pyXbjWXkZSCHIFVSI89bsFSFIVlwnv7sTylLprUkqNukonbPrX9nndVTEvzTqwxEHqtpNJVVdZtH45fDj7pWO8aNaY0QZnYXYWGWveNNO-||00001000000413073350||



Factura en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital. URL ingresada a: fel.blikon.com/mf

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="83280" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="197752.51"
 Moneda="MXN" Documento="73504.83" SubTotal="245016.10"
 Certificado="MIIGIDCCBAigAw1BAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU0OTUzOTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRPUEIENoCertificado="00001000000505495690" FormaPago="99"
 Sello="d6h4vjCvMUtMn5LDSlvrTRyrii7CT/TqBLd3SXV0111BVFb9EUtup7S8Er9NfKmG0hq9aN+U8tCXkKMkzxvG44uZfN5XBDfQKp8p23ew+8cUAZQxl0XP
 Fecha="2021-11-25T11:06:29" Folio="627" version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
 http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" <!-- Se debe usar el siguiente URI de localización -->
 <cfdi:EmisorRegimentalIscal="601" Nombre="2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV" Rfc="KIC1704036AA"
 <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" Rfc="GES790913CT0" TipoCFDI="G03"
 <cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Concepto Desuento="73504.83" Importe="245016.1000" ValorUnitario="245016.10" Descripción="ESTIMACION 1 (UNO) CONTRATO SEDESSON-
 FISE-2021-051 CON NUMERO DE OBRA C-00075/0685 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL
 MUNICIPIO DE FRONTERAS." Cantidad="1.00" ClaveProdServ="72111006" ClaveUnidad="E48"
 <cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="27441.803200" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="171511.2700"
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="27441.80"
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Traslado Importe="27441.80" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"
 <cfdi:Traslados>
 <cfdi:Impuestos>
 <cfdi:Complemento>
 <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="1200.56" version="1.0">
 <implocal:RetencionesLocales Importe="490.03" TasaRetencion="0.20" ImplacRetenido="0.2% I.C.I.C.">
 <implocal:RetencionesLocales Importe="490.03" TasaRetencion="0.20" ImplacRetenido="0.2% INSP. Y VIGILANCIA">
 <implocal:RetencionesLocales Importe="73.50" TasaRetencion="0.03" ImplacRetenido="0.03% UNIVERSIDADES">
 <implocal:RetencionesLocales Importe="73.50" TasaRetencion="0.03" ImplacRetenido="0.03% CECOP">
 <implocal:RetencionesLocales Importe="73.50" TasaRetencion="0.03" ImplacRetenido="0.03% INFRAEST. EDUC.">
 <implocal:ImpuestosLocales>
 <td:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" <!-- Se debe usar el siguiente URI de localización -->
 SelloSAT="YPjuARh+cqQKt9DFQqCjZgQuOvFbfTweSj7sY6FkgIkYkhGq0+X9sOLi+9Cjes38aSkuw1vV2vO6JOKSSgBFfIlyZJMXdHdKNjlt8WcKI
 NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
 SelloFD="d6h4vjCvMUtMn5LDSlvrTRyrii7CT/TqBLd3SXV0111BVFb9EUtup7S8Er9NfKmG0hq9aN+U8tCXkKMkzxvG44uZfN5XBDfQKp8p23e
 FechaTimbrado="2021-11-25T12:16:47" UUID="1FB96EDC-A73A-4661-954F-5469F5FA0F13" RfcProvCertif="SVT110323827"
 <cfdi:Complemento>
 <cfdi:Comprobante

**FACTURA
ORIGINAL**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CONTROL DE ESTIMACIONES

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00075/0685-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS				IMPORTE S/IVA:	\$ 245,016.10
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	04 SEPTIEMBRE AL 02 NOVIEMBRE DE 2021
ADJUDICACION DIRECTA DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021		SEDESSON-FISE-2021-051 25 DE AGOSTO DE 2021				ACUM. ANT. S/IVA:	
		MONTO S/IVA:	646,317.28	POR SUSPENSION:		MUNICIPIO:	FRONTERAS, SONORA
		ANTICIPO S/IVA:	\$ 193,895.18	POR MONTO:		LOCALIDAD:	VARIAS FRONTERAS, SONORA
DIRECTA:	X	INICIO:	27 DE AGOSTO DE 2021	MONTO S/IVA:		CONTRATISTA:	
SIMPLIFICADA:		TERMINO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2021	ANTICIPO S/IVA:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	
PÚBLICA:		DIF. ANTICIPO:	04-sep-21 / 04-dic-21	INICIO CONV. MOD:		FECHA EST.	03 DE NOVIEMBRE DE 2021
		TERMINO CONV. MOD:					
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		LIQUIDACIÓN					
AMORT. ESTA ESTIMACION		IMPORTE DE ESTA ESTIMACION				IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	
\$ 73,504.83		\$ 245,016.10				\$ 245,016.10	
AMORT. ACUMULADA ANTERIOR		AMORTIZACION DE ANTICIPO				ACUMULADO ANTERIOR	
		\$ 73,504.83					
TOTAL AMORTIZADO		DIFERENCIA				ACUMULADO TOTAL	
\$ 73,504.83		\$ 171,511.27				\$ 245,016.10	
ANTICIPO OTORGADO		SUB-TOTAL				MONTO ASIGNADO CONTRATO	
\$ 193,895.18		\$ 171,511.27				646,317.28	
SALDO		I.V.A				SALDO DE CONTRATO	
\$ 120,390.35		\$ 27,441.80				401,301.18	
		SUMA					
		\$ 198,953.07					
		DEDUC.					
		\$ 1,200.56					
		NETO A PAGAR					
		\$ 197,752.51					

ELABORO EL CONTRATISTA

ING. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

ELABORO EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

ING. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

VALIDO EL RESIDENTE DE LA OBRA POR LA SEDESSON

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00075/0685-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS				IMPORTE S/IVA:	\$ 245,016.10
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	04 SEPTIEMBRE AL 02 NOVIEMBRE DE 2021
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021		SEDESSON-FISE-2021-051 25 DE AGOSTO DE 2021				ACUM. ANT. S/IVA:	
		MONTO S/IVA:	646,317.28	POR TIEMPO:		MUNICIPIO:	FRONTERAS, SONORA
DIRECTA: X		ANTICIPO S/IVA:	\$ 193,895.18	POR MONTO:		LOCALIDAD:	VARIAS FRONTERAS, SONORA
SIMPLIFICADA:		INICIO:	27 DE AGOSTO DE 2021	MONTO S/IVA:		CONTRATISTA:	
PÚBLICA:		TERMINO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2021	ANTICIPO S/IVA:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	
		DIF. ANTICIPO:	04-sep-21 04-dic-21	INICIO CONV. MOD:		FECHA EST.	03 DE NOVIEMBRE DE 2021
				TERMINO CONV. MOD:			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIOS UNITARIOS	IMPORTES
			SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
VV-4.02	FABRICACION DE PLAFOND DE TABLAROCA DE YESO DE 1/2" DE 1.22M X 2.44M (4PIES X 8 PIES), A BASE DE ESTRUCTURA METALICA FABRICADA CON CANAL LISTON YPSA @0.61 M Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 @1.20 M., FIJADO A ESTRUCTURA DE TECHO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, , SELLADO DE JUNTAS CON REDIMIX Y PERFACINTA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M²	109.70	0.00			288.07	0.00
VV-5	PUERTAS Y VENTANAS							
VV-5.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL DE 0.90X2.06 MTS CON MARCO METALICO DE 0.93X2.10 MTS FABRICADO A BASE DE PERFIL TUBULAR M-225, CHAPA TIPO BOLA CON LLAVE PARA EXTERIOR, 2 BISAGRAS DE 3", PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, EL CONCEPTO INCLUYE PERFILADO DEL HUECO PREVIO A SU COLOCACION, CON CEMENTO ARENA 1:4. INCLUYE INSTALACION, MATERIA, hERRAMIENTA, SELLADO PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	10.00	0.00			2,172.34	0.00
VV-5.02	VENTANA CORREDIZA DE 1.00M ANCHOx1.20M. ALTO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 1-1/2", INCLUYE VIDRIO DE 3 MM., HERRAJES, FIJACIÓN, NIV MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	10.00	0.00			1,853.58	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES (EXCEDENTE)

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00075/0685-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS				IMPORTE S/IVA:	\$ -
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	04 SEPTIEMBRE AL 02 NOVIEMBRE DE 2021
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021		SEDESSON-FISE-2021-051 25 DE AGOSTO DE 2021				ACUM. ANT. S/IVA:	
		MONTO S/IVA:	646,317.28	POR TIEMPO:		MUNICIPIO:	FRONTERAS, SONORA
DIRECTA:		X	ANTICIPO S/IVA:	\$ 193,895.18	POR MONTO:	LOCALIDAD:	VARIAS FRONTERAS, SONORA
SIMPLIFICADA:			INICIO:	27 DE AGOSTO DE 2021	MONTO S/IVA:	CONTRATISTA:	
PÚBLICA:			TERMINO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2021	ANTICIPO S/IVA:	2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	
			DIF. ANTICIPO:	04-sep-21 04-dic-21	INICIO CONV. MOD:	FECHA EST.	03 DE NOVIEMBRE DE 2021
					TERMINO CONV. MOD:		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIOS UNITARIOS	IMPORTES
			SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
VV-2.04	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK 15X20X40 CM, RELLENO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON UNA VAR No 3 EN CELDA DE BLOCK A CADA 80 CM, CON JUNTAS NO MAYORES A 1.5 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	58.80	48.64	47.04	1.60 /	472.66	
VV-2.05	CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM² TMA 3/4" HECHO EN OBRA. ARMADA CON ARMEX 15X20-4, CIMBRA COMUN , HABILITADO, ARMADO, VIBRADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: DESPERDICIOS, P.U.O.T.	ML	140.00	115.52	112.00	3.52 /	266.11	
VV-2.06	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE PRODUCTO ASFÁLTICO BASE SOLVENTE A RAZON DE 1.5 M2/LT, APLICACIÓN SOBRE CADENA DE DESPLANTE Y MURO DE ENRACE, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	194.60	0.00	0.00		45.69	
VV-2.07	RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: VOLTEO A PALA, COMPACTADO A MANO CON PISÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	30.70	25.28	24.56	0.72	118.10	
VV-3	ALBAÑILERIA							
VV-3.01	MURO A BASE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ALTURA HASTA 3.00 M	M2	304.90	238.32	238.32		362.73	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES (EXCEDENTE)

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00075/0685-CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS				IMPORTE S/IVA:	\$ -
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	04 SEPTIEMBRE AL 02 NOVIEMBRE DE 2021
ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021		SEDESSON-FISE-2021-051 25 DE AGOSTO DE 2021				ACUM. ANT. S/IVA:	
		MONTO S/IVA:	646,317.28	POR TIEMPO:		MUNICIPIO:	FRONTERAS, SONORA
DIRECTA:	X	ANTICIPO S/IVA:	\$ 193,895.18	MONTO S/IVA:		LOCALIDAD:	VARIAS FRONTERAS, SONORA
SIMPLIFICADA:		INICIO:	27 DE AGOSTO DE 2021	ANTICIPO S/IVA:		CONTRATISTA:	
PÚBLICA:		TERMINO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2021	INICIO CONV. MOD:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	
		DIF. ANTICIPO:	04-sep-21 04-dic-21	TERMINO CONV. MOD:		FECHA EST.	03 DE NOVIEMBRE DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIOS UNITARIOS	IMPORTES
			SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
VV-7.01	APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS DE LADRILLO O BLOCK A BASE DE MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM. EN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLU HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES. P.U.O.T.	M²	698.50	0.00	0.00		114.18	
VV-7.02	PINTURA VINILICA PARA INTERIOR, EXTERIOR EN MUROS Y PLAFOND MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA, REBABEADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA. P.U.O.T.	M²	717.90	0.00	0.00		62.22	
SON: 00/100 M.N.								

ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

ING. FRANCISCO JAVIER AGUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL


DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA						ESTIMACIÓN No.		1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00075/0685- CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS						IMPORTE S/IVA:	\$ 245,016.10		
								PERIODO:	04 DE SEPT AL 02 DE NOV DE 2021		
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO			No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.			ACUM. ANT. S/IVA:			
ADJUDICACION DIRECTA DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021		SEDESSON-FISE-2021-051						MUNICIPIO:	FRONTERAS, SONORA		
		MONTO S/IVA:	\$	646,317.28	FOR SUSPENSIÓN:		POR MONTO:	LOCALIDAD:	VARIAS FRONTERAS, SONORA		
DIRECTA:	X	ANTICIPO S/IVA:	\$	193,895.18	MONTO S/IVA:			CONTRATISTA:			
SIMPLIFICADA:		INICIO:	27 DE AGOSTO DE 2021		ANTICIPO S/IVA:			2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.			
PÚBLICA:		TERMINO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2021		INICIO CONV. MOD:						
		DIF. ANTICIPO:	04-SEPT-2021	04-DIC-2021	TERMINO CONV. MOD:			FECHA ESTIM.:	03 DE NOVIEMBRE DE 2021		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE EJE	LARGO	ANCHO (diam.)	ALTO	ESPESOR	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA
VV-2.03	ZAPATA CORRIDA DE 0.40M DE ANCHO, 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 H EN O. T.M.A. 3/4" ARMADO CON VAR. 3/8 @17 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL, 3 VAR DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL, CIMBRA COMÚN HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DES CIMBRA, INCLUYE, GANCHOS Y DESPERDICIOS	M2	1	A-B	3.87	A	E	P	SUMA (L)	14.44
			2	A-B	3.87					
			A	1-2	3.35					
			B	1-2	3.35					
			SUMA		14.44					
										TOTAL UNA VIVIENDA= 14.44
										TOTAL 8 VIVIENDAS= 115.52
										GENERADO: 115.52
										ESTIMADO: 112.00
										EXCEDENTE: 3.52

GROQUIS



FOTOS



ELABORÓ:
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

ING. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No.	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00075/0685- CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS				\$	245,016.10
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	04 DE SEPT AL 02 DE NOV DE 2021
ADJUDICACION DIRECTA DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021		SEDESSON-FISE-2021-051				ACUM. ANT. S/IVA:	
DIRECTA: X		MONTO S/IVA:	\$	646,317.28		MUNICIPIO:	FRONTERAS, SONORA
SIMPLIFICADA:		ANTICIPO S/IVA:	\$	193,895.18		LOCALIDAD:	VARIAS FRONTERAS, SONORA
PÚBLICA:		INICIO:	27 DE AGOSTO DE 2021			CONTRATISTA:	
		TERMINO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2021			2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
		DIF. ANTICIPO:	04-SEPT-2021	04-DIC-2021		FECHA ESTIM.:	03 DE NOVIEMBRE DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE EJE	LARGO	ANCHO (diam.)	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA
VV-3.01	MURO A BASE DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15 X 20 X 40 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ALTURA HASTA 3.00 M., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ALINEACION Y PLOMEADO	M2	1	A-B	3.72		2.60	P	=LxH 9.65
			2	A-B	3.72		2.60		9.65
			A	1-2	3.20		2.70		8.64
			B	1-2	3.20		2.49		7.97
			VENTANA		1.00		1.20		(1.20)
			PUERTA		0.98		2.08		(2.04)
			CADENA		14.40		0.2		(2.88)
			LONGITUD = L				TOTAL UNA VIVIENDA=		29.79
			L EN 1 Y 2 = 3.87-0.075-0.075=3.72				TOTAL 8 VIVIENDAS=		238.32
			L EN A Y B = 3.35-0.075-0.075=3.20				GENERADO:		238.32
							ESTIMADO:		238.32
							EXCEDENTE:		0.00
			ALTURA = H						
			H PROM EN 1-2 =(2.70+2.49)/2=2.6						

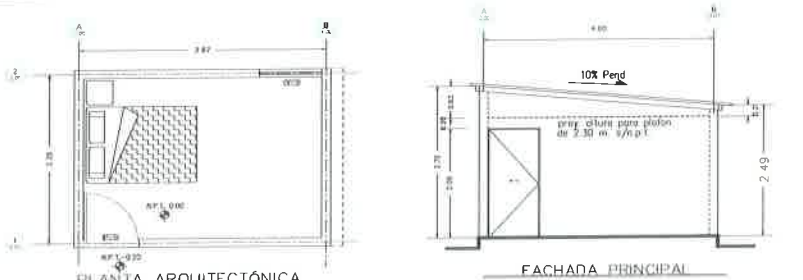CROQUIS		FOTOS	
			

ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

ING. FRANCISCO JAVIER ACUNA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL


DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA


ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA						ESTIMACIÓN No.		1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00075/0685- CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS						IMPORTE S/IVA:	\$ 245,016.10		
								PERIODO:	04 DE SEPT AL 02 DE NOV DE 2021		
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO			No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.			ACUM. ANT. S/IVA:			
ADJUDICACION DIRECTA DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021		SEDESSON-FISE-2021-051						MUNICIPIO:	FRONTERAS, SONORA		
		MONTO S/IVA:	\$	646,317.28	POR SUSPENSION:		POR MONTO:		LOCALIDAD:	VARIAS FRONTERAS, SONORA	
DIRECTA:	X	ANTICIPO S/IVA:	\$	193,895.18	MONTO S/IVA:			CONTRATISTA: 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.			
SIMPLIFICADA:		INICIO:	27 DE AGOSTO DE 2021			ANTICIPO S/IVA:					
PÚBLICA:		TERMINO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2021			INICIO CONV. MOD:					
		DIF. ANTICIPO:	04-SEPT-2021	04-DIC-2021	TERMINO CONV. MOD:			FECHA ESTIM.:	03 DE NOVIEMBRE DE 2021		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE EJE	LARGO	ANCHO (diam.)	ALTO	ESPEJOR	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA
VV-3.02	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM², TMA 3/4" HECHO EN OBRA. ARMADA CON ARMEX 15X15-4, CIMBRA COMUN, HABILITADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y ESCIMBRADO, INCLUYE GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS.	ML	A	1-2	L	A	E	2.08	P	=ExP
			B	1-2				2.08	2	4.16
TOTAL UNA VIVIENDA=										8.32
TOTAL 8 VIVIENDAS=										66.56
GENERADO:										66.56
ESTIMADO:										66.56
EXCEDENTE:										0.00

CROQUIS

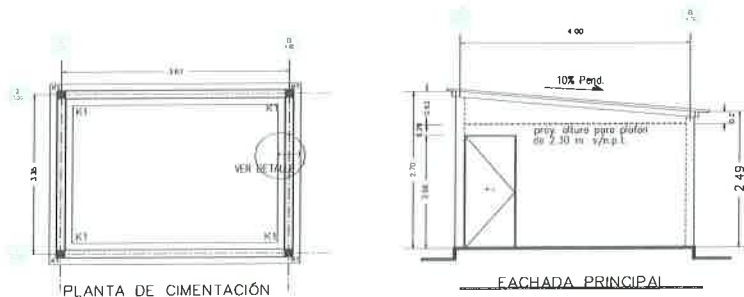

FOTOS

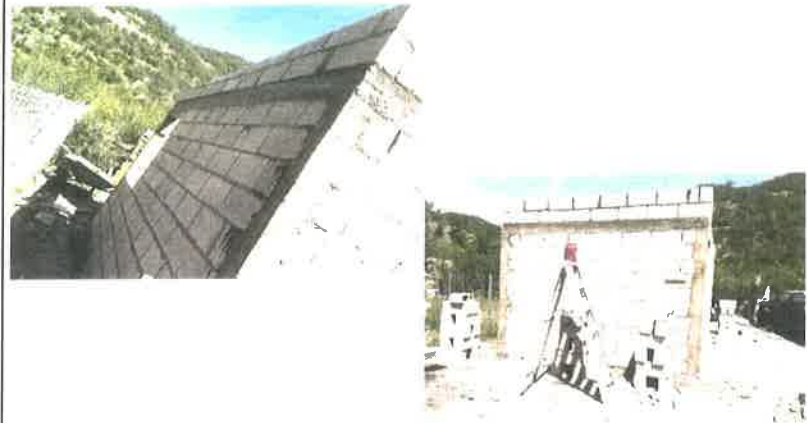

ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

ING. FRANCISCO JAVIER ACUNA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL


DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No.	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00075/0685- CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS				1 (UNO)	
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		IMPORTE S/IVA:	\$ 245,016.10
ADJUDICACION DIRECTA DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021		SEDESSON-FISE-2021-051				PERIODO:	04 DE SEPT AL 02 DE NOV DE 2021
DIRECTA: X		MONTO S/IVA:	\$ 646,317.28	POR SUSPENSIÓN:		ACUM. ANT. S/IVA:	
SIMPLIFICADA:		ANTICIPO S/IVA:	\$ 193,895.18	POR MONTO:		MUNICIPIO:	FRONTERAS, SONORA
PÚBLICA:		INICIO:	27 DE AGOSTO DE 2021	ANTICIPO S/IVA:		LOCALIDAD:	VARIAS FRONTERAS, SONORA
		TERMINO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2021	INICIO CONV. MOD:		CONTRATISTA:	
		DIF. ANTICIPO:	04-SEPT-2021 04-DIC-2021	TERMINO CONV. MOD:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	
						FECHA ESTIM.:	03 DE NOVIEMBRE DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE EJE	LARGO	ANCHO (diam.)	ALTO	ESPEJOR	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA
VV-3.03	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM² TMA 3/4" HECHO EN OBRA. ARMADA CON ARMEX 15X20-4, CIMBRA COMUN. HABILITADO, ARMADO, VIBRADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: DESPERDICIOS.	ML	1	A-B	3.87	A	E	P		SUMA (L)
			2	A-B	3.87					14.44
			A	1-2	3.35					
			B	1-2	3.35					
				SUMA	14.44					
TOTAL UNA VIVIENDA=										14.44
TOTAL 8 VIVIENDAS=										115.52
GENERADO:										115.52
ESTIMADO:										112.00
EXCEDENTE:										3.52

CROQUIS

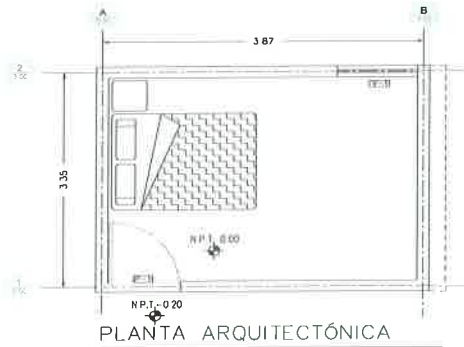

FOTOS



ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

ING. FRANCISCO JAVIER ACUNA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ
