

207



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ORDEN DE PAGO

SECRETARIA DE HACIENDA

Orden de Pago	5100013180
Doc. Logístico	5105691251
Orden de Compra	6100010092

ARCHIVO

Dependencia: SEC DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha de expedición
Unidad Responsable: DIR GRAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA BASICA	09/11/2022
Organizacion de compras: H007-DIR GRAL INFRAES SOC	

Beneficiario: 50003206 - 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV
Clave Banco: R.F.C: KIC1704036AA
Clave Bancaria: Cuenta CME: 2113100001

Para deposito en cuenta del beneficiario:
R.F.C:
Clave Banco:
Clave Bancaria:

No. de Factura	Descripción							Monto
775	ESTIM. 1 C-00085/0369 RED. DE AGUA HERMOSILLO							\$818,606.04
Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe
001	1235461408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO AGUA POTABLE	1070000900	2202E204K04 413D1	614082	2225DK07	08-AGO	822,078.63
002	2117410006	RETENCION 2 AL MILLAR CONTRALORIA INSP Y VIG	1070000900	2202E204K04 413D1	614082	2225DK07	08-AGO	1,417.38
003	2117420011	RETENCION CONSEJO ESTATAL CONCERTACION OBRA PUBLIC	1070000900	2202E204K04 413D1	614082	2225DK07	08-AGO	212.61
004	2117420012	RETENCION FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTUR EDUCATIVA	1070000900	2202E204K04 413D1	614082	2225DK07	08-AGO	212.61

Fondo: 2225DK07 FISE	EPEP: C-00085/0369
-----------------------------	---------------------------

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 04/100 M.N.

Concepto: PAGO DE OBRA C-00085/0369 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REYNAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN N°SH-FISE-22-013Y CONTRATO NO. SEDESSON-FISE-2022-034

SOLICITÓ	AUTORIZÓ	PÁGUESE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERO DEL ESTADO DE SONORA
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ	MTRA. MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA	C.P. JOSÉ MANUEL QUIJADA LAMADRID

Fecha: 09/11/2022

Página 1 / 002

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORDEN DE PAGO**



SECRETARIA DE HACIENDA

Orden de Pago
5100013180


ARCHIVO

Dependencia: SEC DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha de expedición
Unidad Responsable: DIR GRAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA BASICA	09/11/2022
Organizacion de compras: H007-DIR GRAL INFRAES SOC	

Beneficiario: 50003206 - 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV		
Clave Banco: R.F.C: KIC1704036AA	Clave Bancaria: Cuenta CME: 2113100001	
Para deposito en cuenta del beneficiario:		
R.F.C:	Clave Banco:	Clave Bancaria:

No. de Factura	Descripción	Monto
775	ESTIM. 1 C-00085/0369 RED. DE AGUA HERMOSILLO	\$818,606.04

Pos.	Cuenta	Descripción	Centro gestor	Área func.	Pos. Presp.	Fondo	Periodo Pres.	Importe
005	2117420009	RETENCION CAMARA MEXICANA INDUSTRIA CONSTRUCCION	1070000900	2202E204K04 413D1	614082	2225DK07	08-AGO	1,417.38
006	2117420010	RETENCION UNIVERSIDADES DE SONORA Y CONTRALORIA	1070000900	2202E204K04 413D1	614082	2225DK07	08-AGO	212.61
Total de Retenciones		Subtotal			I.V.A.		Total	
3,472.59		708,688.47			113,390.16		818,606.04	
Referencia de Anticipos				Importe de Amortización			Monto Neto a Pagar	
ANT. POR AMORTIZAR EN F-54				246,623.59			571,982.45	



Comprobante de Operación

Tipo de Operación: Consulta de Movimientos

Cuenta de Cargo: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA 080016654251

Fecha y Hora Opereación: 2022-11-17 14:06:23

Fecha y Hora contable: 2022-11-17 14:06:23

Sucursal: 0981

Descripción: PAGO TRAN SPEI

Importe: -571,982.45 MXP

Referencia: 003621340

Referencia numérica del Emisor:

Concepto: 1500005395 REF 00000000

Banco Participante: BANREGIO

Cta. Ordenante del Pago: 00141796018000200745

Causa de Devolución:

Cuenta CLABE Beneficiario: 058760000001599543

Nombre Ordenante del Pago: GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA

RFC Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: 2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV

Codigo de Devolucion:

RFC Ordenante: GES790913CT0

Clave de Rastreo: 2022111740014 BET0000436213400



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME



2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV

KIC1704036AA

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Alfonso Armenta, 11, Palo Verde Norte, 83280, Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México
Tel. 6621872792

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
GES790913CT0

USO CFDI: G03 - Gastos en general
COMONFORT Y DR PALIZA SN, 83260, Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México

Factura 775

FOLIO FISCAL (UUID)

15A0C86B-B068-4F4E-96D0-C73011A61664

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505495690

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-11-09T10:21:37

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-11-09T09:11:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83280

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
0.20%	0.2% I.C.I.C.	\$ 1,417.38
0.20%	0.2% INSP. Y VIGILANCIA	\$ 1,417.38
0.03%	0.03% UNIVERSIDADES	\$ 212.61
0.03%	0.03% CECOP	\$ 212.61
0.03%	0.03% INFRAEST. EDUC.	\$ 212.61
Total		\$ 3,472.59

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	ESTIMACIÓN 1 (UNO) CONTRATO NO. SEDESSON-FISE-2022-034 C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. Clave Prod. Serv. - 72141120 Servicio de construcción de líneas de alcantarillado Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 496,081.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 79,373.11	\$ 708,688.47	\$ 212,606.54	\$ 708,688.47

FACTURA ORIGINAL

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS, 45/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL ANTES DESCUENTO

\$ 708,688.47

DESCUENTO

\$ 212,606.54

SUBTOTAL

\$ 496,081.93

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 79,373.11

RETENCIÓN LOCAL 0.2% I.C.I.C. 0.20%

\$ 1,417.38

RETENCIÓN LOCAL 0.2% INSP. Y VIGILANCIA 0.20%

\$ 1,417.38

RETENCIÓN LOCAL 0.03% UNIVERSIDADES 0.03%

\$ 212.61

RETENCIÓN LOCAL 0.03% CECOP 0.03%

\$ 212.61

RETENCIÓN LOCAL 0.03% INFRAEST. EDUC. 0.03%

\$ 212.61

TOTAL

\$ 571,982.45

SELLO DIGITAL DEL CFDI

tena0wh7eqnRvCu+AK6JfghsdUxOnLc4XNnfwvAnaLdZgrDyoRuqvHpsOkWS2Tdu6IDYzQEAU13EkY2ie68y9Ok+AS1mpnevPDUZOcFTU4UGXVstMgkJ28nH+PgPDpt3HP+LknMKeZChVufCzHpAD26awiRZhSD4FICNsvUoEuTkb50Q+NTgBe/MogbPmkn5W4CJWC5GfRnOOXY1s/utgdyQoufexRoKEPwCF20UNR73hUuGcOKru0E99j3b+KvFdi8ukEszy3LO7xTGzowivEQLDMxAcgLMlg05i9SG9021uWidTST1mWZCjIW+trVYzbsnMGHl8x0adKew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XkodTv1ay5MxShn9ReluyppcTWDlqPpHV3loz5YxqNDpyqWQKS1LWjc+M3T2d4x0GRxAYUhexiO8s1pZ8+pWwJ9s2vCqGISSzZlRmFBhinlfExfBuRqY7NoqlvFMdgdRYA S4gSIDwAG9rlPU4pKfBPos0Kk47F39jKGshM8PqeMnMs0G/OjzzsbQ/iw2D76B8K51H/IjRIR7jzGK0lk1f1/X8vmDokZnQOZ2TpUB3oyYa4siSP5m35O+w1kMeJ2N+olk4 ekivjlc3OUONHQCBn3vMg0ArRhl3K00onYAYWmS2eaCl2hipgZYvqwkYXzqP3QA9PIWfrPTFTXaRlIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]15A0C86B-B068-4F4E-96D0-C73011A61664|2022-11-09T10:21:37|SVT110323827|tena0wh7eqnRvCu+AK6JfghsdUxOnLc4XNnfwvAnaLdZgrDyoRuqvHpsOkWS2Tdu6IDYzQEAU13EkY2ie68y9Ok+AS1mpnevPDUZOcFTU4UGXVstMgkJ28nH+PgPDpt3HP+LknMKeZChVufCzHpAD26awiRZhSD4FICNsvUoEuTkb50Q+NTgBe/MogbPmkn5W4CJWC5GfRnOOXY1s/utgdyQoufexRoKEPwCF20UNR73hUuGcOKru0E99j3b+KvFdi8ukEszy3LO7xTGzowivEQLDMxAcgLMlg05i9SG9021uWidTST1mWZCjIW+trVYzbsnMGHl8x0adKew==|00001000000413073350|



Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingrese a: fel.blikon.com

1

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="83280" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="571982.45"
Moneda="MXN" Descuento="212606.54" SubTotal="708688.47"
Certificado="MIIGIDCCBAigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU0OTU2OTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUkIEI
NoCertificado="00001000000505495690" FormaPago="99"
Sello="tena0wh7eqnRvCu+AK6JfghsdUxOnLe4XNnfWdvANaLdZgrDyoRuqvHpsOkWS2TDut6IDYzQEAU13EkY2ie68y9Ok+AS1mpnevPDUZOcFTU/4UGXV5
Fecha="2022-11-09T09:11:32" Folio="775" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV" Rfc="KIC1704036AA"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" Rfc="GES790913CT0" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Descuento="212606.54" Importe="708688.47" ValorUnitario="708688.47" Descripcion="ESTIMACIÓN 1 (UNO) CONTRATO NO.
SEDESSON-FISE-2022-034 C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN
LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO." Cantidad="1" ClaveProdServ="72141120" ClaveUnidad="E48">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="79373.108800" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="496081.93"/>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Concepto>
          </cfdi:Conceptos>
        - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="79373.11">
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="79373.11" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Complemento>
                - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="3472.59" version="1.0">
                  <implocal:RetencionesLocales Importe="1417.38" TasadeRetencion="0.20" ImplocRetenido="0.2% I.C.I.C."/>
                  <implocal:RetencionesLocales Importe="1417.38" TasadeRetencion="0.20" ImplocRetenido="0.2% INSP. Y VIGILANCIA"/>
                  <implocal:RetencionesLocales Importe="212.61" TasadeRetencion="0.03" ImplocRetenido="0.03% UNIVERSIDADES"/>
                  <implocal:RetencionesLocales Importe="212.61" TasadeRetencion="0.03" ImplocRetenido="0.03% CECOP"/>
                  <implocal:RetencionesLocales Importe="212.61" TasadeRetencion="0.03" ImplocRetenido="0.03% INFRAEST. EDUC."/>
                </implocal:ImpuestosLocales>
                <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="Xk0dTv1ay5MxShn9ReluyycTWDlqPpHIV3IozSYxqNDpyqWQKSILWjc+M3TD4x0GRxAtYUhexiO8s1pZ8+pWwJ9s2vCqGISSzzlRmFI
NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
SelloCFD="tena0wh7eqnRvCu+AK6JfghsdUxOnLe4XNnfWdvANaLdZgrDyoRuqvHpsOkWS2TDut6IDYzQEAU13EkY2ie68y9Ok+AS1mpnevPDU
FechaTimbrado="2022-11-09T10:21:37" UUID="15A0C86B-B068-4F4E-96D0-C73011A61664" RfcProvCertif="SVT110323827"/>
              </cfdi:Complemento>
            </cfdi:Comprobante>

```

FACTURA ORIGINAL



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KIC1704036AA	2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
15A0C86B-B068-4F4E-96D0-C73011A61664	2022-11-09T09:11:32	2022-11-09T10:21:37	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$571,982.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FACTURA ORIGINAL

Imprimir

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
Hermosillo Sonora, a 08 de Noviembre del 2022

2022: "Año de la Transformación"

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
Directora General de Administración
PRESENTE.-

Derivado de la supervisión realizada por el Ing. Abraham Elpidio Patiño Bracamonte, Residente de la obra que más adelante se detalla, con fundamento en la fracción IX del artículo 120 de Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, según bitácora y el reporte de avance físico y financiero, con el cual el Residente valida las cantidades y volúmenes y una vez realizados los trabajos de verificación de la obra en sitio, por este conducto, se solicita el trámite de pago de la estimación que a continuación se presenta.

Por tal circunstancia, le solicito generar el **Documento de Aceptación de Servicio** para orden de pago en SAP a favor de: **2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.** por un importe de **Estimación No. 1 (UNO)** por \$ 708,688.47 (Son: setecientos ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 47/100 M.N.) sin I.V.A. antes de amortización de anticipo, para un pago bruto de \$575,455.04 (Son: quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 04/100 M.N.) incluye I.V.A., para la obra **C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REYNAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO** cuyo soporte incluye: Resumen de Estimación, Control de Estimación, Control acumulativo de estimaciones, conceptos estimados, generadores, aviso de inicio de obra, designación del superintendente de la obra, pruebas de laboratorio, reporte fotográfico, reporte de avance de obra y bitácora, mismos que fueron revisados y validados por el Residente antes mencionado.

Obra financiada con recursos del **Fondo de Infraestructura Social para las Entidades "FISE"**.

ATENTAMENTE

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

C.c.p. Archivo
MDTP/egvr

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
08 NOV 2022
10:15 H
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

8-NOV-22
RECIBIDO



662 108 37 37
662 108 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Río Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Río Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO. /				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
					PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:	No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		ACUM. ANT. S/IVA:	\$
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				MUNICIPIO:	HERMOSILLO
	MONTO S/IVA:	\$ 2,405,643.03	POR TIEMPO:		LOCALIDAD:	HERMOSILLO
	ANTICIPO S/IVA:	\$ 721,692.91	MONTO S/IVA:		CONTRATISTA:	
DIRECTA:			ANTICIPO S/IVA:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
SIMPLIFICADA:	INICIO:	09/09/2022	INICIO CONV. MOD:		FECHA DE ESTIMACION:	
PÚBLICA:	TERMINO:	07/11/2022	TERMINO CONV. MOD:		10/10/2022	
	DIF. ANTICIPO:					

POR CONCEPTO DE:	IMPORTES POR CONCEPTO	IMPORTE TOTAL
OBRA NORMAL:	\$ 708,688.47	
OBRA EXCEDENTE:	\$ -	
OBRA FUERA DE PRESUPUESTO:	\$ -	
		\$ 708,688.47

ELABORO EL CONTRATISTA	ELABORO EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA
2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA	C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA SUPERINTENDENTE
VALIDO EL RESIDENTE DE LA OBRA POR LA SEDESSON	
ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CONTROL DE ESTIMACIONES

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022		SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
		MONTO S/IVA: \$ 2,405,643.03		POR TIEMPO:		MUNICIPIO:	HERMOSILLO
DIRECTA:		ANTICIPO S/IVA: \$ 721,692.91		POR MONTO:		LOCALIDAD:	HERMOSILLO
SIMPLIFICADA:		INICIO: 09/09/2022		ANTICIPO S/IVA:		CONTRATISTA:	
PÚBLICA: X		TERMINO: 07/11/2022		INICIO CONV. MOD:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
		DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:		FECHA DE ESTIMACION:	
						10/10/2022	
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		LIQUIDACIÓN					
AMORT. ESTA ESTIMACION		IMPORTE DE ESTA ESTIMACION				IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	
\$ 212,606.54		\$ 708,688.47				\$ 708,688.47	
AMORT. ACUMULADA ANTERIOR		AMORTIZACION DE ANTICIPO				ACUMULADO ANTERIOR	
		\$ 212,606.54				\$ -	
TOTAL AMORTIZADO		DIFERENCIA				ACUMULADO TOTAL	
\$ 212,606.54		\$ 496,081.93				\$ 708,688.47	
ANTICIPO OTORGADO		SUB-TOTAL				MONTO ASIGNADO CONTRATO	
\$ 721,692.91		\$ 496,081.93				\$ 2,405,643.03	
SALDO		I.V.A				SALDO DE CONTRATO	
\$ 509,086.37		\$ 79,373.11				\$ 1,696,954.56	
		SUMA					
		\$ 575,455.04					
		DEDUC.					
		\$ 3,472.59					
		NETO A PAGAR					
		\$ 571,982.45					

ELABORO EL CONTRATISTA

2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ELABORO EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA
SUPERINTENDENTE

VALIDO EL RESIDENTE DE LA OBRA POR LA SEDESSON

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATINO BRACAMONTE
SUPERVISOR DE AREA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022		SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
DIRECTA:		MONTO S/IVA:		POR TIEMPO:		MUNICIPIO:	HERMOSILLO
SIMPLIFICADA:		ANTICIPO S/IVA:		POR MONTO:		LOCALIDAD:	HERMOSILLO
PÚBLICA:		INICIO:		ANTICIPO S/IVA:		CONTRATISTA:	
X		TERMINO:		INICIO CONV. MOD:		FECHA DE ESTIMACION:	
		DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:		10/10/2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIOS UNITARIOS	IMPORTES
			SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
D040A2	TRAZO EN ALINEACIÓN HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1,614.43	1,035.00	-	1,035.00	\$ 6.78	\$ 7,017.30
A110A	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, CARGA A CAMIÓN O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 M. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. EXCAVACION DE 0.0 A 2.0 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	1,374.83	941.85	-	941.85	\$ 43.55	\$ 41,017.57
A111A	EXCAVACION CON USO DE MEDIOS MECÁNICOS (MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN EXCAVADORA), PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE REZAGA CON MAQUINA, LIMPIEZA DE PLANTILLA, REMOCIÓN A UN LADO DE LA ZANJA HASTA 10 M. DEL EJE DE LA MISMA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	M3	290.00	-	-	-	\$ 609.54	\$ -
A130A	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO Y COMPACTADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS. INCLUYE COLOCACION DE LA PLANTILLA Y COLOCACION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	107.62	72.45	-	72.45	\$ 75.91	\$ 5,499.68
A131E	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO, EN ZANJAS, CON AGUA EN CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	1,274.81	869.40	-	869.40	\$ 159.14	\$ 138,356.32
			SUBTOTAL				191,890.87	

ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUNA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:	No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
	MONTO S/IVA:	\$ 2,405,643.03	POR TIEMPO:		MUNICIPIO:	HERMOSILLO
DIRECTA:	ANTICIPO S/IVA:	\$ 721,692.91	MONTO S/IVA:		LOCALIDAD:	HERMOSILLO
SIMPLIFICADA:	INICIO:	09/09/2022	ANTICIPO S/IVA:		CONTRATISTA:	
PÚBLICA:	TERMINO:	07/11/2022	INICIO CONV. MOD:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
	DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:		FECHA DE ESTIMACION:	
					10/10/2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIOS UNITARIOS	IMPORTES
			SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
A140C	BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA. BOMBEO DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA BOMBA.	HORA	2.00	-	-	-	\$ 239.40	\$ -
D030C	FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE REFORZADO CON FIBRA DE PROLIPOPILENO MARCA FIBERCON O SIMILAR, VIBRADO Y CURADO CON CURACRETO O SIMILAR, INCLUYE: OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREO 1ER. KM. ETC. FABRICACION DEL CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 TM.A. DE 3/4" HECHO EN OBRA, ACARREO Y COLOCACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.00	-	-	-	\$ 3,400.33	\$ -
B040E	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC RIGIDO, INCLUYE BAJADO A ZANJA, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	ML	539.50	285.00	-	285.00	\$ 23.90	\$ 6,811.50
B040G	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC RIGIDO, INCLUYE BAJADO A ZANJA, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO.	ML	1,074.93	750.00	-	750.00	\$ 37.16	\$ 27,870.00
B130A	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., INCLUYE: LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIAS, ACARREO A 1 KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PIEZAS ESPECIALES HASTA 305 MM (12") DE DIAMETRO.	KG	2,805.38	-	-	-	\$ 16.72	\$ -
B160E	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO BRIDADA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16.00	-	-	-	\$ 880.65	\$ -
B160G	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO BRIDADA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	-	-	-	\$ 2,928.16	\$ -
SUBTOTAL							\$	34,681.50

ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:	No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
	MONTO S/IVA:	\$ 2,405,643.03	POR TIEMPO:		MUNICIPIO:	HERMOSILLO
DIRECTA:	ANTICIPO S/IVA:	\$ 721,692.91	MONTO S/IVA:		LOCALIDAD:	HERMOSILLO
SIMPLIFICADA:	INICIO:	09/09/2022	ANTICIPO S/IVA:		CONTRATISTA:	
PÚBLICA:	TERMINO:	07/11/2022	INICIO CONV. MOD:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
	DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:		FECHA DE ESTIMACION:	
					10/10/2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIOS UNITARIOS	IMPORTES
			SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
B160J	INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 305 MM (12") DE DIAMETRO BRIDADA, INCLUYE: LIMPIEZA Y PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON TUBERIA, ACARREO A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	-	-	-	\$ 5,019.71	\$ -
B240B	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A = 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 2 DE 1.0 X 90 M.	CAJA	16.00	-	-	-	\$ 5,834.17	\$ -
B240K	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A = 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 10 DE 1.30 X 1.20 M.	CAJA	2.00	-	-	-	\$ 9,640.71	\$ -
B240N	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, INCLUYE PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 5 CM. DE ESPESOR, CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, T.M.A = 3/4" DE DIAMETRO, EN PISOS Y LOSAS, MUROS DE TABIQUE RECOCIDO, ACERO DE REFUERZO DE F'y= 4200 KG/CM2 Y CIMBRA DE MADERA. CAJA TIPO 13 DE 2.30 X 1.60 M.	CAJA	1.00	-	-	-	\$ 20,855.20	\$ -
B243B	INSTALACION DE CONTRAMARCO DE ACERO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO 1ER. KM, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M. CANAL DE 102 MM. (4").	PZA	19.00	-	-	-	\$ 209.16	\$ -
B244A	INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. CON PESO DE 110 KG. Y/O 130 KG. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO 1ER. KM, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	19.00	-	-	-	\$ 418.31	\$ -
SUBTOTAL							\$ -	\$ -

ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA					ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.					IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47	
							PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022	
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.			ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -	
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022		SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022					MUNICIPIO:	HERMOSILLO	
		MONTO S/IVA:	\$ 2,405,643.03	POR TIEMPO:		POR MONTO:		LOCALIDAD:	HERMOSILLO
DIRECTA:		ANTICIPO S/IVA:	\$ 721,692.91	MONTO S/IVA:			CONTRATISTA:		
SIMPLIFICADA:		INICIO:	09/09/2022	ANTICIPO S/IVA:			2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		
PÚBLICA:	X	TERMINO:	07/11/2022	INICIO CONV. MOD:			FECHA DE ESTIMACION:		
		DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:			10/10/2022		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIOS UNITARIOS	IMPORTES
			SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
DC-B250LE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN MATERIAL TIPO B SIN PAVIMENTO, CON TUBERÍA DE 13 MM (1/2") DE DIAMETRO DE TUBERIA PEX RETICULADO AZUL Y 7 MTS. DE LARGO. INCLUYE: ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE 4", VÁLVULA DE INSERCIÓN PARA PAD-R DE 1/2", 7 MT DE TUBO DE PEX RETICULADO DE 1/2", CODO COMBINADO DE BRONCE COMPRESIÓN PARA PAD DE 1/2", COLUMPIO COMPLETO; NIPLE DE FOGO DE 60 CM X 1/2", NIPLE DE FO.GO. DE 55 CM X 1/2", NIPLE DE FO.GO. DE 20 CM X 1/2", NIPLE ROSCA CORRIDA DE 1/2" TEE DE FOGO DE 1/2", UN CODO FO.GO. DE 1/2", TAPON CACHUCHA, VÁLVULA DE CORTE TOTAL DE 1/2", VÁLVULA CHECK DE RESORTE DE 1/2", LLAVE DE JARDÍN BRONCE, EXCAVACIONES, RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE: MEDIDOR).	TOMA	30.00	-	-	-	\$ 2,065.96	\$ -
A090A	SONDEOS CON MAQUINA AUXILIADO A MANO PARA LOCALIZAR INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DE DRENAJE (CAJAS DE OPERACIÓN, POZOS DE VISITA Y TUBERIAS) EN SECO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SOND	2.00	-	-	-	\$ 142.45	\$ -
SE-03	RENTA DE SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS. INCLUYE CUATRO DISPOSITIVOS DE "INDICADORES DE OBSTACULOS" DE 122 X 30 CM (COLOR NARANJA CON BLANCO), CUATRO CONOS COLOR NARANJA FLUORESCENTES DE PLASTICO Y CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, TODO FUNCIONANDO DURANTE LA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA Y LO NECESARIO PARA MANTENER LA OBRA CON CONTROL VIAL Y TRANSITO VEHICULAR, (ESTE CONCEPTO SE ESTIMARA HASTA EL FINAL DE OBRA).	LOTE	1.00	-	-	-	\$ 1,967.03	\$ -
J102A	ACARREO PRIMER KM. DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: CARGA A CAMION DE VOLTEO CON MAQUINA Y DESCARGA A VOLTEO.	M3	449.00	-	-	-	\$ 30.21	\$ -
SUBTOTAL							\$ -	\$ -

ELABORADO
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:	No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
	MONTO S/IVA:		MUNICIPIO:		HERMOSILLO	
	\$ 2,405,643.03		LOCALIDAD:		HERMOSILLO	
DIRECTA:	ANTICIPO S/IVA:		CONTRATISTA:			
	\$ 721,692.91		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			
SIMPLIFICADA:	INICIO:		FECHA DE ESTIMACION:			
	09/09/2022		10/10/2022			
PÚBLICA:	TERMINO:					
	07/11/2022					
	DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:			

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIOS UNITARIOS	IMPORTES
			SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
J102B	ACARREO DE KILOMETRO SUBSECUENTE DEL 2DO. AL 20AVO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO.	M3-KM	2,245.02	-	-	-	\$ 9.49	\$ -
H005I	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SISTEMA INGLES PARA AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIAMETRO. RD 26. INCLUYE ANILLO DE HULE.	ML	539.50	285.00	-	285.00	\$ 165.96	\$ 47,298.60
H100F	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SERIE METRICA PARA AGUA POTABLE DE 203 MM (8") DE DIAMETRO. CLASE 10 INCLUYE ANILLO DE HULE.	ML	1,074.93	850.00	-	850.00	\$ 511.55	\$ 434,817.50
H007B	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO (EXCLUYENDO EXTREMIDADES), PUESTAS EN ALMACEN DE LA OBRA. PIEZAS ESPECIAL DE 102 MM A 305 MM DIAMETRO (4" A 12").	KG	2,805.38	-	-	-	\$ 128.64	\$ -
H015D	SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	39.00	-	-	-	\$ 1,181.41	\$ -
H015F	SUMINISTRO DE JUNTA UNIVERSAL DE 203 MM (8") DE DIAMETRO.	PZA	42.00	-	-	-	\$ 2,220.90	\$ -
H075D	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 102 MM. (4") DE DIAMETRO.	PZA	15.00	-	-	-	\$ 679.18	\$ -
H075H	SUMINISTRO DE TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 302 MM. (12") DE DIAMETRO.	PZA	2.00	-	-	-	\$ 3,508.84	\$ -
H013D	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	PZA	30.00	-	-	-	\$ 92.72	\$ -
H013F	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 203 MM (8") DE DIAMETRO.	PZA	7.00	-	-	-	\$ 285.22	\$ -
H013H	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO DE 305 MM (12") DE DIAMETRO.	PZA	3.00	-	-	-	\$ 523.75	\$ -
H012B	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3".	PZA	240.00	-	-	-	\$ 30.42	\$ -
H012C	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2".	PZA	56.00	-	-	-	\$ 58.55	\$ -
H012D	SUMINISTRO DE TORNILLO CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 7/8" X 4".	PZA	36.00	-	-	-	\$ 117.59	\$ -
SUBTOTAL							\$	482,116.10

ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022		SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
		MONTO S/IVA:		POR TIEMPO:		MUNICIPIO:	HERMOSILLO
DIRECTA:		\$ 2,405,643.03		POR MONTO:		LOCALIDAD:	HERMOSILLO
SIMPLIFICADA:		ANTICIPO S/IVA:		MONTO S/IVA:		CONTRATISTA:	
PÚBLICA:		INICIO:		ANTICIPO S/IVA:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
		TERMINO:		INICIO CONV. MOD:		FECHA DE ESTIMACION:	
		DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:		10/10/2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIOS UNITARIOS	IMPORTES
			SEGÚN PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN		
H018D	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIÁMETRO MARCA AVK O SIMILAR DE VASTAGO NO DESPLAZABLE PN 16 UN/ON CON BRIDAS, ASIENTO ELASTICO, PASO TOTAL Y LISO, REVESTIDA INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON POLVO EPOXICO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE, CUERPO DE FUNDICION GRIS, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUETADURA A BASE DE O-RINGS DE EPDM, COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL TOTALMENTE VULCANIZADA CON CAUCHO EPDM.	PZA	16.00	-	-	- \$	7,139.29	\$ -
H018F	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 8" DE DIÁMETRO MARCA AVK O SIMILAR DE VASTAGO NO DESPLAZABLE PN 16 UN/ON CON BRIDAS, ASIENTO ELASTICO, PASO TOTAL Y LISO, REVESTIDA INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON POLVO EPOXICO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE, CUERPO DE FUNDICION GRIS, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUETADURA A BASE DE O-RINGS DE EPDM, COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL TOTALMENTE VULCANIZADA CON CAUCHO EPDM.	PZA	4.00	-	-	- \$	10,173.25	\$ -
H018H	SUMINISTRO DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 12" DE DIÁMETRO MARCA AVK O SIMILAR DE VASTAGO NO DESPLAZABLE PN 16 UN/ON CON BRIDAS, ASIENTO ELASTICO, PASO TOTAL Y LISO, REVESTIDA INTERIOR Y EXTERIORMENTE CON POLVO EPOXICO APLICADO ELECTROSTATICAMENTE, CUERPO DE FUNDICION GRIS, VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUETADURA A BASE DE O-RINGS DE EPDM, COMPUERTA DE FUNDICION DUCTIL TOTALMENTE VULCANIZADA CON CAUCHO EPDM.	PZA	1.00	-	-	- \$	23,936.37	\$ -
H040B	SUMINISTRO DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 MTS. CON CANAL DE 102 MM (4").	PZA	19.00	-	-	- \$	3,391.33	\$ -
H041B	SUMINISTRO DE MARCO CON TAPA DE Fo.Fo. TIPO MEDIANO DE 50 X 50 CMS.	PZA	19.00	-	-	- \$	3,323.91	\$ -
J155A	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENO Y PLANTILLA, INCLUYE: CARGA, ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO Y DESCARGA A UN LADO DE LA ZANJA, MEDIDO COMPACTO.	M3	462.72	-	-	- \$	173.31	\$ -
SUBTOTAL							\$	-

ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

SUBTOTAL \$ 708,688.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA (OBRA NORMAL)

ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
					PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:	No. Y FECHA DE CONTRATO	No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.			ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				MUNICIPIO:	HERMOSILLO
	MONTO S/IVA: \$ 2,405,643.03	POR TIEMPO:		POR MONTO:	LOCALIDAD:	HERMOSILLO
DIRECTA:	ANTICIPO S/IVA: \$ 721,692.91	MONTO S/IVA:			CONTRATISTA:	
SIMPLIFICADA:	INICIO: 09/09/2022	ANTICIPO S/IVA:			2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
PÚBLICA:	TERMINO: 07/11/2022	INICIO CONV. MOD:			FECHA DE ESTIMACION:	
	DIF. ANTICIPO:	TERMINO CONV. MOD:			10/10/2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	GENERADOR DE VOLUMENES										TOTAL
D040A2	TRAZO EN ALINEACIÓN HORIZONTAL PARA EXCAVACION DE ZANJA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	EJE	ELEMENTO	LADO 1 (M)	LADO 2 (M)	ALTO (M)	LONG (M)	AREA (M)	PESO. (KG/M)	PIEZAS		
					A				490.00			1.00	490.00
					B				120.00			1.00	120.00
					C				140.00			1.00	140.00
					D				100.00			1.00	100.00
					E				50.00			1.00	50.00
					F				110.00			1.00	110.00
					G				25.00			1.00	25.00
CROQUIS			TOTAL: 1,035.00										

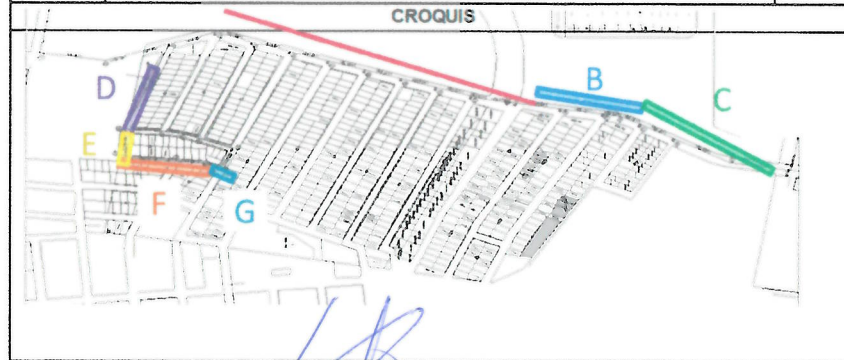

FOTOS



ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA (OBRA NORMAL)

ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
					PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:	No. Y FECHA DE CONTRATO	No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.			ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				MUNICIPIO:	HERMOSILLO
	MONTO S/IVA: \$ 2,405,643.03	POR TIEMPO:		POR MONTO:	LOCALIDAD:	HERMOSILLO
DIRECTA:	ANTICIPO S/IVA: \$ 721,692.91	MONTO S/IVA:			CONTRATISTA:	
SIMPLIFICADA:	INICIO: 09/09/2022	ANTICIPO S/IVA:			2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
PÚBLICA:	X	TERMINO: 07/11/2022	INICIO CONV. MOD:		FECHA DE ESTIMACION:	
	DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:		10/10/2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	GENERADOR DE VOLUMENES										TOTAL
A130A	PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL "A" Y/O "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO Y COMPACTADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS. INCLUYE COLOCACION DE LA PLANTILLA Y COLOCACION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	EJE	ELEMENTO	LADO 1 (M)	LADO 2 (M)	ALTO (M)	LONG (M)	AREA (M)	PESO. (KG/M)	PIEZAS		
				A		0.70	0.10	490.00			1.00		34.30
				B		0.70	0.10	120.00			1.00		8.40
				C		0.70	0.10	140.00			1.00		9.80
				D		0.70	0.10	100.00			1.00		7.00
				E		0.70	0.10	50.00			1.00		3.50
				F		0.70	0.10	110.00			1.00		7.70
				G		0.70	0.10	25.00			1.00		1.75
CROQUIS													TOTAL: 72.45

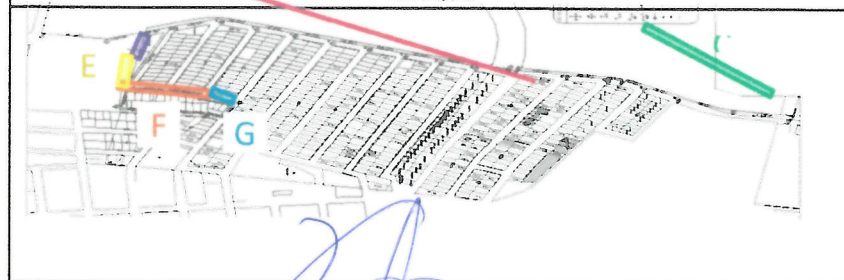

ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA (OBRA NORMAL)

ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
					PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:	No. Y FECHA DE CONTRATO	No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.			ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				MUNICIPIO:	HERMOSILLO
	MONTO S/IVA: \$ 2,405,643.03	POR TIEMPO:		POR MONTO:	LOCALIDAD:	HERMOSILLO
DIRECTA:	ANTICIPO S/IVA: \$ 721,692.91	MONTO S/IVA:			CONTRATISTA:	
SIMPLIFICADA:	INICIO: 09/09/2022	ANTICIPO S/IVA:			2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
PÚBLICA:	TERMINO: 07/11/2022	INICIO CONV. MOD:			FECHA DE ESTIMACION:	
	DIF. ANTICIPO:	TERMINO CONV. MOD:			10/10/2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	GENERADOR DE VOLUMENES										TOTAL
A131E	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO, EN ZANJAS, CON AGUA EN CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR. INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)	M3	EJE	ELEMENTO	LADO 1 (M)	LADO 2 (M)	ALTO (M)	LONG (M)	AREA (M)	PESO (KG/M)	PIEZAS		
				A		0.70	1.20	490.00			1.00		411.60
				B		0.70	1.20	120.00			1.00		100.80
				C		0.70	1.20	140.00			1.00		117.60
				D		0.70	1.20	100.00			1.00		84.00
				E		0.70	1.20	50.00			1.00		42.00
				F		0.70	1.20	110.00			1.00		92.40
				G		0.70	1.20	25.00			1.00		21.00
TOTAL: 869.40													

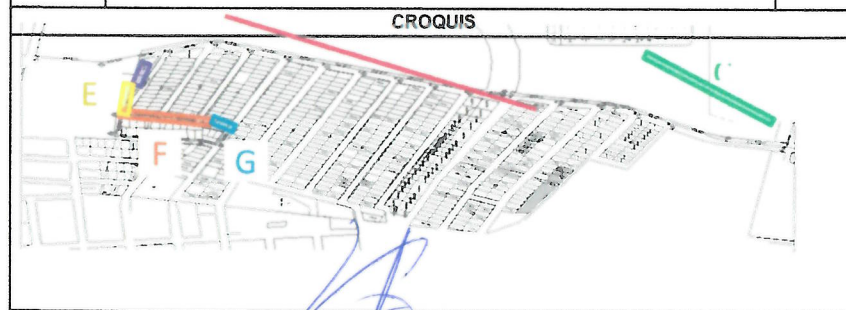

ELABORO
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA


SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA (OBRA NORMAL)

ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
					PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:	No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				MUNICIPIO:	HERMOSILLO
	MONTO S/IVA:	\$ 2,405,643.03	POR TIEMPO:		LOCALIDAD:	HERMOSILLO
DIRECTA:	ANTICIPO S/IVA:	\$ 721,692.91	MONTO S/IVA:		CONTRATISTA:	
SIMPLIFICADA:	INICIO:	09/09/2022	ANTICIPO S/IVA:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
PÚBLICA:	TERMINO:	07/11/2022	INICIO CONV. MOD:		FECHA DE ESTIMACION:	
	DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:		10/10/2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	GENERADOR DE VOLUMENES										TOTAL
B040E	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC RÍGIDO, INCLUYE BAJADO A ZANJA, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA DE 102 MM (4") DE DIAMETRO.	ML	EJE	ELEMENTO	LADO 1 (M)	LADO 2 (M)	ALTO (M)	LONG (M)	AREA (M)	PESO. (KG/M)	PIEZAS		
				A				100.00			1.00		100.00
				B				50.00			1.00		50.00
				C				110.00			1.00		110.00
				D				25.00			1.00		25.00
CROQUIS			TOTAL: 285.00										

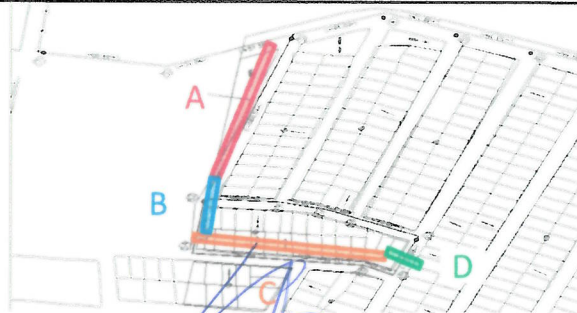

FOTOS



ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA


GENERADOR DE OBRA (OBRA NORMAL)

ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
					PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:	No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				MUNICIPIO:	HERMOSILLO
	MONTO S/IVA:	\$ 2,405,643.03	POR TIEMPO:		LOCALIDAD:	HERMOSILLO
DIRECTA:	ANTICIPO S/IVA:	\$ 721,692.91	MONTO S/IVA:		CONTRATISTA:	
SIMPLIFICADA:	INICIO:	09/09/2022	ANTICIPO S/IVA:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
PÚBLICA:	TERMINO:	07/11/2022	INICIO CONV. MOD:		FECHA DE ESTIMACION:	
	DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:		10/10/2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	GENERADOR DE VOLUMENES										TOTAL
B040G	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC RÍGIDO, INCLUYE BAJADO A ZANJA, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A 1 KM. Y MANIOBRAS LOCALES. TUBERIA DE 203 MM (8") DE DIAMETRO.	ML	EJE	ELEMENTO	LADO 1 (M)	LADO 2 (M)	ALTO (M)	LONG (M)	AREA (M)	PESO. (KG/M)	PIEZAS		
				A				490.00			1.00		490.00
				B				120.00			1.00		120.00
				C				140.00			1.00		140.00

CROQUIS

TOTAL: 750.00

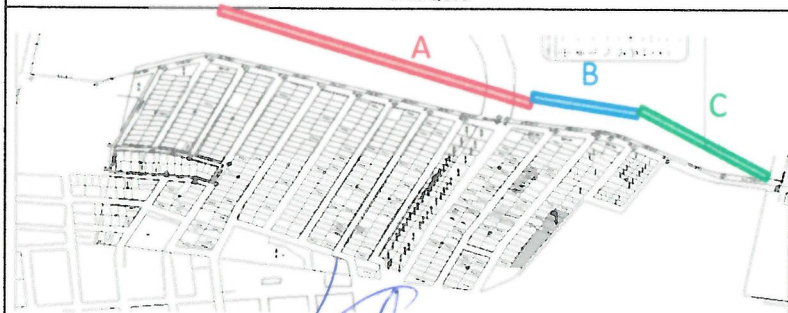

FOTOS



ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA (OBRA NORMAL)

ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACION No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
					PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:	No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				MUNICIPIO:	HERMOSILLO
	MONTO S/IVA:	\$ 2,405,643.03	POR TIEMPO:		LOCALIDAD:	HERMOSILLO
DIRECTA:	ANTICIPO S/IVA:	\$ 721,692.91	MONTO S/IVA:		CONTRATISTA:	
SIMPLIFICADA:	INICIO:	09/09/2022	ANTICIPO S/IVA:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
PÚBLICA:	TERMINO:	07/11/2022	INICIO CONV. MOD:		FECHA DE ESTIMACION:	
	DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:		10/10/2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	GENERADOR DE VOLUMENES										TOTAL
H0051	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SISTEMA INGLES PARA AGUA POTABLE DE 102 MM (4") DE DIAMETRO, RD 26. INCLUYE ANILLO DE HULE.	ML	EJE	ELEMENTO	LADO 1 (M)	LADO 2 (M)	ALTO (M)	LONG (M)	AREA (M)	PESO. (KG/M)	PIEZAS		
							285.00				1.00		285.00
CROQUIS													TOTAL: 285.00



ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA (OBRA NORMAL)

ORIGEN DE LOS RECURSOS	No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	C-00085/0369 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA TRES REINAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.				IMPORTE S/IVA:	\$ 708,688.47
					PERIODO:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 08 OCTUBRE DE 2022
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:	No. Y FECHA DE CONTRATO	No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.			ACUM. ANT. S/IVA:	\$ -
LPO-926009991-017-2022 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	SEDESSON-FISE-2022-034 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022				MUNICIPIO:	HERMOSILLO
	MONTO S/IVA:	\$ 2,405,643.03	POR TIEMPO:	POR MONTO:	LOCALIDAD:	HERMOSILLO
DIRECTA:	ANTICIPO S/IVA:	\$ 721,692.91	MONTO S/IVA:		CONTRATISTA:	
SIMPLIFICADA:	INICIO:	09/09/2022	ANTICIPO S/IVA:		2K17 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
PÚBLICA:	TERMINO:	07/11/2022	INICIO CONV. MOD:		FECHA DE ESTIMACION:	
	DIF. ANTICIPO:		TERMINO CONV. MOD:		10/10/2022	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	GENERADOR DE VOLUMENES										TOTAL
H100F	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SERIE METRICA PARA AGUA POTABLE DE 203 MM (8") DE DIAMETRO, CLASE 10 INCLUYE ANILLO DE HULE.	ML	EJE	ELEMENTO	LADO 1 (M)	LADO 2 (M)	ALTO (M)	LONG (M)	AREA (M)	PESO. (KG/M)	PIEZAS		850.00
								850.00			1.00		850.00
CROQUIS													TOTAL: 850.00



ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

C. FRANCISCO JAVIER ACUÑA LEYVA

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. ABRAHAM ELPIDIO PATIÑO BRACAMONTE
