



INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 21 de Noviembre de 2017.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 27 de Octubre del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisar avances de Obra del Programa de Vivienda e Infraestructura FISE 2017 con Contratistas..


Lugar: Aconchi, Ures, Moctezuma, San Pedro de la Cueva, Hermosillo. Son.

Periodo: del 13 al 18 de Noviembre del 2017.

Resultados: Esta Comisión se encontraba programada inicialmente en el período del 06 al 11 de Noviembre del 2017, pero por cuestiones administrativas se realizó en el período antes mencionado. Se inició con la revisión de las Obra con los Contratistas a los municipios antes mencionados realizando las siguientes actividades que a continuación detallo:

(13 de Noviembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **San Pedro de la Cueva**, visitando las Obra: C-00077/0074 "Ampliación de la Red de Alcantarillado Sector El Brazilar", se dio por recorrido por la obra, para revisar los trabajos generados a la fecha, ya se encuentran construidos 6 pozos de visita y la colocación de la red de atarjeas entre ellos. Siguen trabajando en una zona de roca dura (material "C") extraída con rotomartillo y se empieza con la colocación de descargas domiciliarias, en general se tiene un avance del 75% de la Obra. Después de visitó la Obra perteneciente al Municipio de **URES**, C-00085/0100 "Construcción De Tanque Elevado de 30m³ de Capacidad. En La Localidad del Seguro en Ures" donde se inició, ya se tiene construidas las zapatas, plataforma y piso de concreto donde se montara el tanque. En taller de herrería se tiene la Estructura a un 75% en construcción del tanque elevado. Fecha aproximada de Instalación de estructura el 27 de Noviembre. En general se tiene un avance de la Obra del 60%.

(14-15 de Noviembre 2017).- Este día se continuó con el municipio de **Ures**, visitando las Obras: C-00077/0073 "Rehabilitación de la Red de Drenaje en Blvd. Emiliano Zapata", En Guadalupe De Ures"; y C-00085/0096 "Rehabilitación de la Red de Agua Potable en Blvd. Emiliano Zapata en Guadalupe de Ures"; estas 2 Obras se encuentran en proceso, con trabajos de Red de atarjeas y pozos de visita ya construidos, incluyendo descargas. Teniendo un avance en general del 70% y la Obra de Agua potable con avances en la Línea de Agua Potable del 40% en general. Más tarde se continuó con Vivienda, revisando las Obras: C-00075/0335 "Construcción de Baños con Descargas Domiciliarias en Varias Localidades del Municipio de Ures", C-00075/0345 "Construcción de Piso Firme en Varias Localidades de Ures", C-00075/0334 "Ampliación de Vivienda en Varias Localidades del Municipio de Ures", en estos proyectos se continúan con los avances de la obra, con un avance en general del 45% en el contrato de Vivienda, algunas viviendas con losas ya coladas y otras en proceso de Muros. Los Baños se continúan trabajando solo con 6 beneficiarios, a nivel de muros, por lo que se tiene un avance del 20% de la obra y en el contrato de Pisos ya se tienen ejecutados 29 beneficiarios del Padrón, restando solo 1, por lo que se considera un 97% en general.

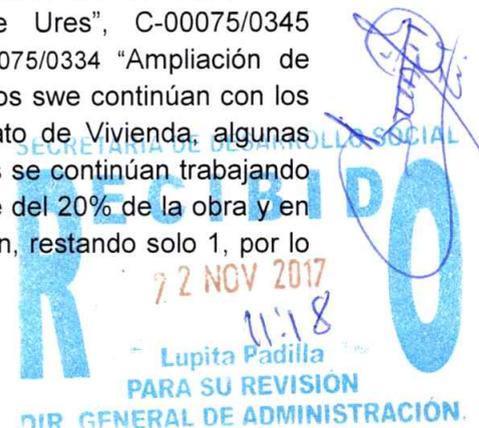

F995

(16 de Noviembre 2017).- Este día se emprendió el viaje al municipio de **Moctezuma**, visitando las Obras: C-00085/0101 "Ampliación del Sistema de Agua Potable en San Patricio de la Mesa", C-00085/0102 "Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Unisierra Sur". Para el caso de San Patricio se trabajan con los armados de la estructura y cadenas de la pila de Almacenamiento de Agua en sitio, ya se encuentra colada de plantilla y empiezan a cimbrar para él colado con un avance en general del 30%; y en la Colonia Unisierra, ya se tiene un avance en general del 65% ya se encuentra instalada parte de la red de agua potable y se trabaja en caja de válvulas y tomás domiciliarias. Más tarde nos trasladamos al Municipio de **Aconchi**, visitando la obras C-00075/0311 "Construcción de Baños con Descargas Domiciliarias en Varias Localidades del Municipio de Aconchi"; para revisar algunos detalles pendientes de la obra, del cual todavía seguían algunas descargas por instalar y pequeñas fugas por reparar por lo que se considera un avance en general del 95% de la obra.

(17 de Noviembre 2017).- Este día se continuó en el municipio de **Aconchi**, visitando las Obras: C-00075/0309 "Ampliación de Vivienda en Varias Localidades del Municipio de Aconchi"; respecto al contrato de Viviendas se tiene un avance en general del 80%, teniendo ya concluidas los cuartos de 10 beneficiarios completos y los otros 8 en proceso de Construcción, levantando muros y cadenas desplante. Más tarde nos trasladamos al Municipio de **Hermosillo** visitándolas Obra Rural: C-00075/0348 "Construcción de Baños con Biodigestor en Área Rural del Mpio. de Hermosillo" y C-00075/0347 "Ampliación de Vivienda en Área Rural del Mpio. de Hermosillo", se tiene un avance en general del 35% de Construcción de la Vivienda y en el caso de los Baños ya se había iniciado con las planchas de 3 baños y otros apenas trabajaban en excavaciones y colocación de red sanitaria.

(18 de Noviembre 2017).- Este día se continuó en el municipio de **Hermosillo**, visitando las Obras: C-00077/0080 "Ampliación de Red de Alcantarillado en Colonia Altares", al día de hoy ya se tiene el trazo para los trabajos de esta obra y ya se suministró el material correspondiente, se empezó con los trabajos de excavación, un avance en general del 15% de la Obra; respecto a la Obra: C-00075/0337 "Construcción de Piso Firme en Varias Localidades del Municipio de Hermosillo", se revisó los avances generados a la fecha se tiene un avance en general del 90%, ya que se modificó padrón y se amplió para cumplir con las metas establecidas.

ATENTAMENTE
ING. ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.
COORDINADOR DE AREA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 27 de octubre de 2017

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de:

REVISAR AVANCES DE OBRAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA FISE 2017 CON CONTRATISTAS.

Se le comisiona a:

ACONCHI, URES, MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA, HERMOSILLO, SON.

Durante el (los) día (s) 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo NP300

| | |
|--------------|------------|
| CONTROL MET: | 70 Litros |
| CASSETAS: | \$0.00 |
| GASOLINA: | \$1,200.00 |

ATENTAMENTE

PA
[Firma]

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Dirección de
Obras Públicas

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



H. AYUNTAMIENTO
SAN PEDRO DE
LA CUEVA, SONORA

Recibi 15/11/2017

Atenta atención

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO
ACONCHI, SONORA.



OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
MOCTEZUMA, SONORA.

[Firma]
