



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

1000-F

Hermosillo, Sonora, a 04 de enero de 2022



Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo
Directora General de Proyectos de Infraestructura Básica
PRESENTE. –

En referencia al **aviso de comisión con fecha 07 de diciembre de 2021**, mediante el cual se me comisionó en el periodo del **09 de diciembre al 11 de diciembre de 2021** a los municipios de **Guaymas y Empalme** con el propósito de realizar recorrido con el contratista para **supervisar avances, calidad de obras y aprobación de números generadores de estimaciones**, por lo que me permito informarle de las actividades realizadas en esta comisión:

- **Municipio de Guaymas:** Para la obra **C-00075/0653 Construcción de cuarto-dormitorio en varias Localidades**, bajo contrato **No. SEDESSON-FISE-2021-026** se realizó recorrido en compañía del contratista el Ing. Carlos Noriega Alegre por todas las ubicaciones de vivienda, iniciando por la Localidad de Vicam, encontrando avances en las 4 viviendas, a nivel de pintura, instalaciones eléctricas, firme de concreto, y en proceso de instalación de puertas y ventanas. Se continuó con el recorrido en la Localidad de Pótam, donde se encuentran 4 ubicaciones a nivel de muro y cadena de cerramiento, preparándose para recibir losa de azotea. En la cabecera municipal se realizó recorrido por las 8 ubicaciones en donde se encuentran 4 a nivel de losa de azotea, recibiendo enjarres y pintura, otras 4 con trabajo de cadena de cerramiento, y preparándose para colado de losa de azotea, alcanzando un avance del 75% aproximadamente del avance general en esta obra.
En las obras de infraestructura **C-00077/0251 Ampliación red de alcantarillado en colonia Humberto Gutiérrez en la Localidad de Heroica Guaymas** y **C-00085/0327 Ampliación red de agua potable en colonia Humberto Gutiérrez en la Localidad de Heroica Guaymas** bajo contrato **No. SEDESSON-FISE-2021-038 Y SEDESSON-FISE-2021-037** respectivamente, en compañía del contratista se comenzó recorrido, se realizaron medidas con odómetro entre los pozos de visita y nodos ubicados a lo largo del trazo, se verificaron la fabricación de registros sanitarios, se tomaron medidas en la totalidad de los pozos construidos y los existentes, se realizó el plano de construcción final con lo ejecutado en campo, se contabilizaron e indicaron en plano las ubicaciones de las tomas y descargas, se revisaron cajas de válvulas, ambas obras se encuentran terminadas y con un avance del 100%, por lo que se procede a realizar la documentación correspondiente y el cierre financiero.
Para culminar con el municipio de Guaymas se realizó una visita a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano con la C. Claudia Villavicencio, con la finalidad de informar los avances y programar las futuras reuniones para el cierre documental.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

1000-I

- **Municipio de Empalme:** Bajo contrato No. **SEDESSON-FISE-2021-043** que corresponde a la obra **C-00077/0252 Construcción de la red de alcantarillado en la Localidad de Cruz de Piedra**, en compañía del contratista se realizó recorrido por el trazo de la obra, iniciando con la red de alcantarillado en medición con odómetro, se abrieron los brocales para medición y revisión de pozos de visita, se contabilizaron las descargas domiciliarias y registros sanitarios, se tomaron medidas en la ubicación de los biodigestores. La obra se encuentra terminada con un avance del 100%. En las oficinas de Desarrollo Urbano se realizó una reunión breve con el Director Ing. Sixto Fraijo.

Por último para la obra **C-00075/0667 Construcción de cuarto-dormitorio en varias Localidades del Municipio** bajo el contrato No. **SEDESSON-FISE-2021-026** se realizó recorrido por las 16 ubicaciones, iniciando por la Localidad de Cruz de Piedra, donde se encuentran avances generales realizando trabajos de puertas y ventanas, en la cabecera municipal se visitaron el resto de las ubicaciones donde 4 se encuentran a nivel de losa de azotea, iniciando con enjarres y piso firme, 4 más trabajando en cimbra de castillos y cadenas de cerramiento lo que representa un avance aproximado del 72% del total de los trabajos de contrato.

De ésta manera me permito informarle de las actividades realizadas durante la comisión. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo,

ATENTAMENTE. -

Mtr, Miguel Angel Mendoza-Tapia
Supervisor de Área





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 07 DE DICIEMBRE DE 2021

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TAPIA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ RECORRIDO CON EL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR AVANCES, CALIDAD DE OBRAS Y APOBACIÓN DE NÚMEROS DE ESTIMACIONES DE LAS OBRAS: C-00077/0251 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COL. HUMBERTO GUTIERREZ, GUAYMAS. C-00077/0252 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO DE EMPALME, C-00077/0667 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EMPALME, C-00075/0653 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS. SE REALIZARÁ RECORRIDO CON EL CONTRATISTA PARA VERIFICAR LAS MEDIDAS FINALES Y PROCEDER CON LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, C-00085/0327 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COL. HUMBERTO GUTIERREZ, GUAYMAS.

Se le comisiona a:

MUNICIPIOS: EMPALME Y GUAYMAS, SONORA.

Durante el (los) día (s) 09 DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 81

Marca TOYOTA

Placas VC-31-215

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$700.00

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO DE EMPALME



C.c.p. Archivo
 C.c.p. Cesar José de la Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
 C.c.p. Interesado

ADMON. 2018 - 2021
EJIDO CRUZ DE PIEDRA

[Firma]
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN







SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

MUNICIPIO DE GUAYMAS

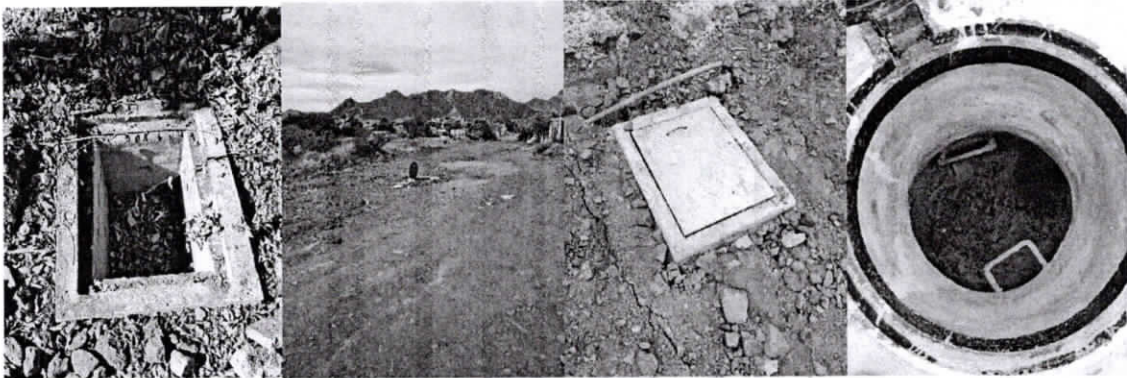

MUNICIPIO DE EMPALME

