



HERMOSILLO, SONORA A 04 DE ENERO DE 2021

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
P R E S E N T E. —

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: URES, NACUZARI DE GARCIA, FRONTERAS, AGUA PRIETA, Y CANANEA, SONORA, CON UNA PROGRAMACION: **DEL 17 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021**, ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021 (CANANEA)

No. DE LA OBRA: C-00085/0321 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE FRONTERAS., AL RESPECTO LE INFORMO LO SIGUIENTE: PRIMERAMENTE ESTE DIA ME TRASLADÉ A LA CIUDAD DE CANANEA DONDE VISITE EL TALLER DONDE OBSERVE QUE TENIAN ARMADA LOS 16 MT. DE ESCALERA, SE TENIA HABILITADO TODO LO DEL ANDADOR Y ADEMÁS SE ESTABA SACANDO TODOS LOS GAJOS DE LA CUPULA INFERIOR Y SUPERIOR Y TAMBIÉN YA SE TENIA CORTADA LA LAMINA DE LA PANZA DEL TANQUE, SE OBSERVO TODO EL SUMINISTRO DE LA LAMINA, EL AVANCE APROXIMADO ES 50 AL 55 %, (CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-055).

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2021 (MUNICIPIO DE AGUA PRIETA)

No. DE LA OBRA: C-00085/0336. AL MOMENTO DE LA VISITA A LA OBRA SE OBSERVO QUE TENIA EJECUTADO LO QUE SE ESTABA CONTEMPLANDO EN LA ESTIMACIÓN No. 4 DE CIERRE COMO ES 35 TOMAS DE LAS CUALES 19 SE INSTALARON CON MEDIDOR, CAJA PROTECTORA Y SIN COLUMPIO Y 16 SE INSTALARON CON MEDIDOR, CAJA PROTECTORA Y CON EL COLUMPIO., LOS 84 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 4" DE DIAMETRO CORRESPONDE AL TRAMO NUEVO QUE PROPUSO EL H. AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRA POR EL MISMO CALLEJON 42-43 ENTRE AVENIDA 15 Y 16 YA SE TENIA EJECUTADO Y EN OPERACIÓN, IGUALMENTE LAS LINEAS DE 10" INSTALADA, LOS TRABAJOS DEL CRUCERO DE EQUIPO DEL POZO A LA RED DE 10" NO SE LLEVO A CABO DEBIDO AL QUE EL ORGANISMO OPERADOR YA LO HABIA HECHO., AVANCE 95%. (CONTRATO SEDESSON FISE-FISE-2021-045)

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2021 (FRONTERAS Y NACUZARI)

No. DE LA OBRA: C-00075/0683 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, FRONTERAS., PRACTICAMENTE EN LA VISITA ANTERIOR LOS TRABAJOS YA ESTABAN COCLUIDOS NADAMÁS TENIAN DETALLES DE PINTURA Y UNAS MEDIDAS DE DESCARGAS QUE ENTRARON EN DISCUSIÓN CON EL CONTRATISTA Y ESTA VISITA FUE PARA DEFINIR ESA SITUACIÓN Y VALIDAR LA ESTIMACIÓN., EL AVANCE ES DEL 100% (CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-032).

No. DE LA OBRA: C-00075/0685 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DE FRONTERAS, SONORA., AL RESPECTO DE ESTA OBRA LE COMENTO SE ENCONTRARON LOS DIEZ CUARTOS TERMINADOS CON UN BUEN ACABADO SIN OBSERVAR DETALLES DE CONTRUCCIÓN 100% (CONTRATO; SEDESSON-FISE-2021-051)



Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



No. DE LA OBRA: C-00075/0662 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, EN LA OCASIÓN ANTERIOR PRACTICAMENTE YA ESTABAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS YA QUE FALTABAN DETALLES QUE YA SE ANDABAN EJECUTANDO Y QUE EN MAXIMO DOS DIAS QUEDABAN, DE HECHO ME ENVIARON FOTOS PARA CONFIRMAR SU EJECUCIÓN, NADA MÁS QUE ENTRO EN DISCUSIÓN LA CANTIDAD DE METROS DE DESCARGA A COBRAR Y POR ELLO SE EFECTUO ESTA NUEVA VISITA PARA VERIFICAR EN CAMPO Y QUEDAR DE ACUERDO CON EL CONTRATISTA, 100% (CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-032)

No. DE LA OBRA: C-00075/0663 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA., AL RESPECTO LE INFORMO QUE EN VISITA ANTERIOR PRACTICAMENTE ESTABAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS YA QUE SI BIEN ES CIERTO SIGNIFICABA UN PORCENTAJE CONSIDERABLE SU EJECUCIÓN SIGNIFICABA UN DIA O CUANDO MUCHO DOS YA QUE SE TENIA LA EXCAVACIÓN Y EL SUMINISTRO, DE HECHO SE ENVIO FOTO PARA CONFIRMAR SU EJECUCIÓN AL SEGUNDO DIA, ESTA VISITA FUE PARA CONFIRMAR FISICAMENTE., AVANCE FISICO ES 100%. (CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-032).

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2021 (URES).

No. DE LA OBRA: C-00077/0237 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL SOL, AL MOMENTO DE LA VISITA A LA OBRA SE OBSERVO QUE SE TRABAJABA EN LA INSTALACIÓN DE 14 POZOS DE VISITA QUE HASTA EL MOMENTO ESTABAN PENDIENTES DE INSTALAR, HASTA EL MOMENTO SE TENIAN 5 INSTALADOS Y SE PREPARABAN PARA INICIAR CON LOS ENCOFRADOS DE LA TUBERIA., EL AVANCE ES 82%. A 87%(SEDESSON,FISE-2021-017)

POR ULTIMO LE INFORMO QUE LA COMISIÓN SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.


ATENTAMENTE

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ
COORDINADOR DE EVALUACIÓN SOCIAL

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL

REPORTE FOTOGRAFICO

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONO A LOS MUNICIPIOS DE URES, NACOSARI DE GARCIA, FRONTERAS Y AGUA PRIETA Y CANANEA, SONORA, EN PERIODO DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE

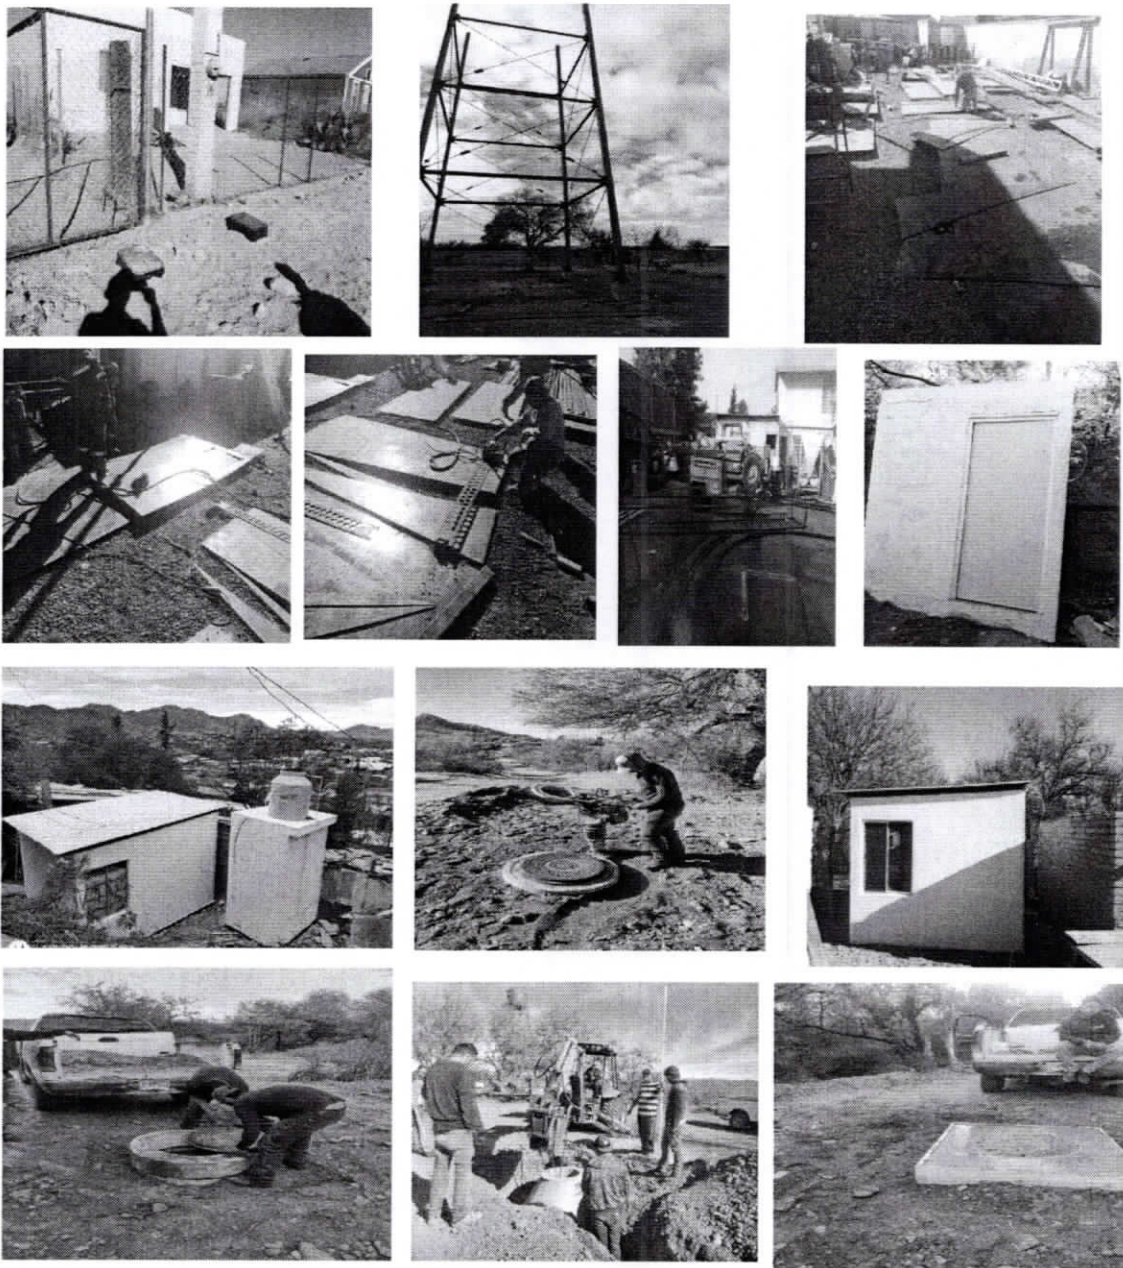

ATENTAMENTE:

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ

1057-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE GASTO DE INVERSIÓN

Hermosillo, Sonora, 14 DE DICIEMBRE DE 2021

CARLOS MARTÍN MORALES DÍAZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO PARA VALIDAR ESTIMACIÓN FINIQUITO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, CONTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA Y CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA, CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS; SEGUIMIENTO NORMAL A LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SOL, MUNICIPIO DE URES, AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE AGUA PRIETA, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINES, MUNICIPIO DE FRONTERAS, DEBIDO A QUE EL TANQUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN UN TALLER EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, SE VISITARA EL MUNICIPIO DE CANANEA.

Se le comisiona a:

MUNICIPIOS: URES, NACAZARI DE GARCÍA, FRONTERAS, AGUA PRIETA Y CANANEA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 17 DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 105

Marca NISSAN


Modelo 2017

Placas

Tipo

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE AGUA PRIETA

D-64-447



Agua Prieta

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,400.00

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SEGURIDAD PUBLICA
FRONTERAS SONORA

C.c.p. Archivo

C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular

C.c.p. Interesado



DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Y TRANSITO MUNICIPAL



DEPARTAMENTO
DE DELIBERACIONES
DE LA HERENCIA URES, SON.
