

753-I



HERMOSILLO, SONORA A 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL AVISO DE COMISION CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONO A LOS MUNICIPIOS DE: BAVISPE, HUACHINERA, BACERAC, NACUZARI DE GARCIA, FRONTERAS Y AGUA PRIETA, SONORA, CON UNA PROGRAMACION: DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021, ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.



FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 (MUNICIPIO DE BAVISPE)

CON ESTA FECHA, SE VISITAN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUELITO, LA GALERIA Y BAVISPE, DEL MUNICIPIO DE BAVISPE, DONDE NOS REUNIMOS CON BENEFICIARIOS DE LAS VIVIENDAS PARA INTEGRAR EL COMITE PRO-OBRA Y FIRMA DE ACTA DE ACEPTACION DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. DE LA OBRA: C-00075/0673-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-030, CON UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 23%

FECHA: 02 DE NOVIEMBRE DE 2021 (MUNICIPIO DE BACERAC)

CON ESTA FECHA, SE VISITA LA LOCALIDAD DE BACERAC, MUNICIPIO DE BACERAC, DONDE NOS REUNIMOS CON BENEFICIARIOS DE LAS VIVIENDAS PARA INTEGRAR EL COMITE PRO-OBRA Y FIRMA DE ACTA DE ACEPTACION DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. DE LA OBRA: C-00075/0680-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACERAC, MUNICIPIO DE BACERAC, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-031, CON UNA AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 65%

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 (MUNICIPIO DE HUACHINERA)

CON ESTA FECHA, SE VISITAN LAS LOCALIDADES DE ARIBABI Y HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA, DONDE NOS REUNIMOS CON BENEFICIARIOS DE LAS VIVIENDAS PARA INTEGRAR EL COMITE PRO-OBRA Y FIRMA DE ACTA DE ACEPTACION DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

No. DE LA OBRA: C-00075/0677-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-034, CON UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 60%

No. DE LA OBRA: C-00075/0678-CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-034, CON UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 10%

No. DE LA OBRA: C-00075/0679-CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE HUACHINERA, MUNICIPIO DE HUACHINERA SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-034, CON UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 80%

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021 (MUNICIPIO DE NACUZARI)

CON ESTA FECHA, SE VISITA LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI, DONDE NOS REUNIMOS CON BENEFICIARIOS DE LAS VIVIENDAS PARA INTEGRAR EL COMITE PRO-OBRA Y FIRMA DE ACTA DE ACEPTACION DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

No. DE LA OBRA: C-00075/0663-CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-035, CON UNA AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 58%

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.

M



No. DE LA OBRA: C-00075/0662-CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI, SONORA, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-035, CON UNA AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 18%

No. DE LA OBRA: C-00075/0661-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-035, CON UNA AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 62%

FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2021 (MUNICIPIO DE FRONTERAS)

CON ESTA FECHA, SE VISITAN LAS LOCALIDADES DE ESQUEDA Y FRONTERAS, MUNICIPIO DE FRONTERAS, DONDE NOS REUNIMOS CON BENEFICIARIOS DE LAS VIVIENDAS PARA INTEGRAR EL COMITE PRO-OBRA Y FIRMA DE ACTA DE ACEPTACION DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

No. DE LA OBRA: C-00075/0683-CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-032, CON UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 31%

No. DE LA OBRA: C-00075/0685-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-051, CON UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 42%

DESCRIPCION DE LA OBRA (CUARTOS DORMITORIOS): LA OBRA CONSISTE: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, QUE CONSIDERA UN CUARTO DE 4.00 M X 3.00 M (MEDIDAS A EJES), A BASE DE CIMENTACIÓN DE ZAPATA CORRIDA, ALBAÑILERÍA CON MUROS DE BLOCK, CADENAS, CASTILLOS Y PISO DE CEMENTO DE 8 CM., ENJARRE INTERIOR Y EXTERIOR, TECHUMBRE DE LÁMINA SOBRE POLIN-MONTEN, PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA VINÍLICA INTERIOR Y EXTERIOR

DESCRIPCION DE LA OBRA (BAÑOS CON DESCARGA): SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, CUYAS VIVIENDAS YA CUENTAN CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PERO NO CON UN BAÑO DIGNO, POR LO QUE SE LE CONSTRUIRÁ A CADA UNA, MÓDULO SANITARIO DE 2.08 X 1.44 M. A BASE DE MUROS DE BLOCK, PISO DE CONCRETO, LOSA ALIGERADA, MUEBLES SANITARIOS, REGADERA, PUERTA Y VENTANA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 450 LITROS, REGISTRO, CONEXIÓN AL REGISTRO DE BANQUETA., CON UN COSTO UNITARIO DE \$45,000.00

DESCRIPCION DE LA OBRA (BAÑOS CON BIODIGESTOR): SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN BENEFICIO DE HABITANTES DE CUYAS VIVIENDAS NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y REQUIEREN DE UN BAÑO DIGNO, POR LO QUE SE LE CONTRUIRA UNA MÓDULO SANITARIO. A BASE DE MUROS DE BLOCK, PISO DE CONCRETO, LOSA ALIGERADA, MUEBLES SANITARIOS, REGADERA, PUERTA Y VENTANA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE 450 LITROS, BIODIGESTOR Y REGISTRO DE LODOS., CON UN COSTO UNITARIO DE \$55,000.00

No. DE LA OBRA: C-00085/0341-AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-060, CON UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 60%

DESCRIPCION DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 669.00 ML A BASE DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA DE 3" DE DIAMETRO RD-26 Y LA CONSTRUCCIÓN DE 35 TOMAS DOMICILIARIAS DE ½" DE DIAMETRO CON COLUMPIO COMPLETO DE FoGo (SIN MEDIDOR), BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 130 PERSONAS DE LA LOCALIDAD.

No. DE LA OBRA: C-00085/0337-AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VARIAS CALLES, COLONIA LA LAGUNA DE LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-033, CON UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 98%

DESCRIPCION DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 1,035.00 ML A BASE DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA DE 4" DE DIAMETRO RD-26 (158 ML), Y DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3" DE DIAMETRO RD-26 (877.00), Y LA CONSTRUCCIÓN DE 30 TOMAS DOMICILIARIAS DE ½" DE DIAMETRO CON COLUMPIO COMPLETO DE FoGo (SIN MEDIDOR), BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 111 PERSONAS DE LA LOCALIDAD.

M



No. DE LA OBRA: C-00085/0335-AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RASTRO FINAL, COLONIA EL RASTRO DE LA LOCALIDAD DE FRONTERAS, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-033, UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 100%

DESCRIPCION DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 200.00 ML A BASE DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA DE 21/2" DE DIAMETRO RD-26 Y LA CONSTRUCCIÓN DE 11 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAMETRO CON COLUMPIO COMPLETO DE FoGo (SIN MEDIDOR), BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 41 PERSONAS DE LA LOCALIDAD

No. DE LA OBRA: C-00085/0340-AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL RIO DE LA LOCALIDAD DE FRONTERAS, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-059, UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 95%

DESCRIPCION DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN 482.00 ML A BASE DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA DE 21/2" DE DIAMETRO RD-26 Y LA CONSTRUCCIÓN DE 13 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAMETRO CON COLUMPIO COMPLETO DE FoGo (SIN MEDIDOR), BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 48 PERSONAS DE LA LOCALIDAD.

No. DE LA OBRA: C-00085/0321-CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO EN ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-055, UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 25%

DESCRIPCION DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 60 M3, CONSIDERANDO CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA METALICA, CRUCERO DE LLEGADA Y SALIDA DE TANQUE, LINEA DE LLEGADA A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DE DIAMETRO EN 22 ML., LINEA DE SALIDA A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DE DIAMETRO EN 13 ML., CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS, BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 80 PERSONAS DE LA LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE FRONTERAS.

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2021 (MUNICIPIO DE AGUA PRIETA)

No. DE LA OBRA: C-00085/0336-AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, SEGÚN CONTRATO No. SEDESSON-FISE-2021-045, UN AVANCE FISICO APROXIMADO DEL 62%

DESCRIPCION DE LA OBRA: LA OBRA CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, CON LA INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION A BASE DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 10" DE DIAMETRO EN 1,357.8 ML, INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 8" DE DIAMETRO EN 28 ML, INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 4" DE DIAMETRO EN 498 ML, CONSTRUCCION DE 4 CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS, CONSTRUCCIÓN DE 50 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIAMETRO, BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 185 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA.

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: SE VISITARON TODAS LAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS COMISIONADOS DONDE NOS REUNIENDONOS CON BENEFICIARIOS DE LAS VIVIENDAS PARA INTEGRAR EL COMITE PRO-OBRA Y FIRMA DE ACTA DE ACEPTACION DE LA MISMA.

NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE ATENDIO AL COMISIONADO: NO FUIMOS ATENDIDOS POR PERSONAL ALGUNO DEL MUNICIPIO POR QUE NO SE REQUIERE LA INTERVENCION DE AUTORIDAD MUNICIPAL ALGUNA EN ESTE TIPO DE COMISIONES

FOTOGRAFIAS DE AVANCE DE LAS OBRAS: SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO A ESTE INFORME DE COMISION.






ATENTAMENTE

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ
COORDINADOR DE EVALUACIÓN SOCIAL

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL

REPORTE FOTOGRAFICO

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **BAVISPE, HUACHINERA, BACERAC, NACUZARI DE GARCIA, FRONTERAS Y AGUA PRIETA, SONORA,**

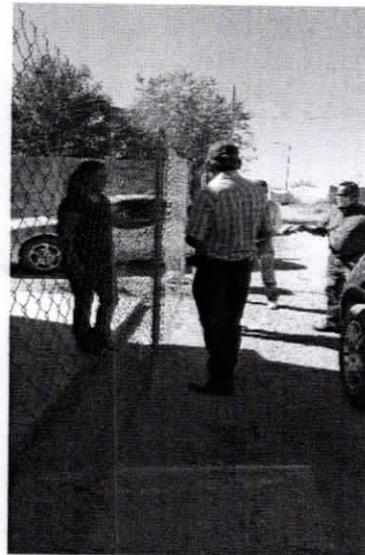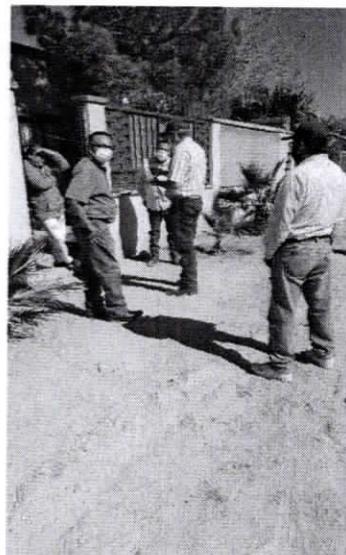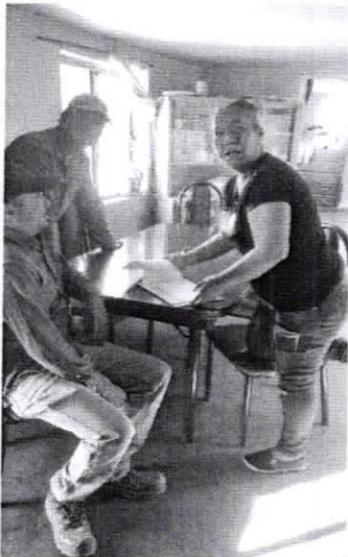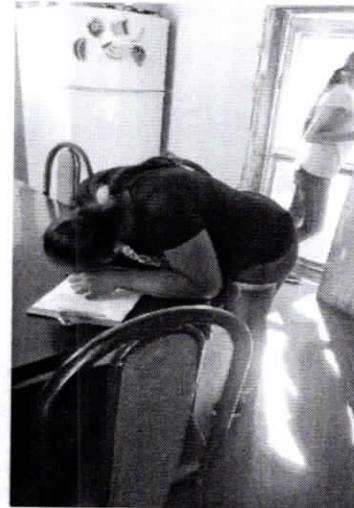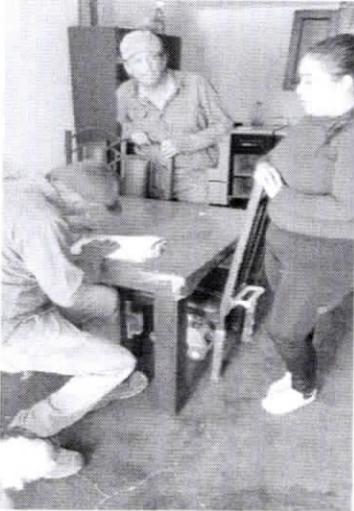

REPORTE FOTOGRAFICO

EN REFERENCIA AL AVISO DE COMISION CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: BAVISPE, HUACHINERA, BACERAC, NACUZARI DE GARCIA, FRONTERAS Y AGUA PRIETA, SONORA ,



M

753-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE GASTO DE INVERSIÓN

Hermosillo, Sonora, 27 DE OCTUBRE DE 2021

CARLOS MARTÍN MORALES DÍAZ
PRESENTE.-



GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
AGUA PRIETA, SONORA.

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ LA INTEGRACIÓN DE 17 COMITES PRO-OBRA, 1 EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE, 1 EN BACERAC, 3 EN HUACHINERA, 3 EN NACOZARI DE GARCÍA Y 2 EN FROTERAS DEL "PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL 2021", 6 OBRAS EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS Y 1 EN AGUA PRIETA DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021", ASÍ COMO FIRMA DE 17 ACTAS DE ACEPTACIÓN DE OBRA POR LOS BENEFICIARIOS.

Se le comisiona a:

BAVISPE, HUACHINERA, BACERAC, NACOZARI DE GARCÍA, FRONTERAS Y AGUA PRIETA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 01 NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 104

Marca NISSAN

Placas VD-64-442

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	<u>0</u> Litros
CASSETAS:	<u>\$0.00</u>
GASOLINA:	<u>\$0.00</u>



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCIA
ESTADO DE SONORA
SEDE SOL
COORDINACION MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
BAVISPE, SONORA

