



HERMOSILLO, SONORA A 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **NACUZARI DE GARCIA, FRONTERAS Y AGUA PRIETA, SONORA,** CON UNA PROGRAMACION: **DEL 10 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021,** ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.



FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 (MUNICIPIO DE AGUA PRIETA)

CON ESTA FECHA SE VISITO LA OBRA C-00085/0336 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA PRIETA, ENCONTRANDO LO SIGUIENTE : SE TENIAN COLOCADOS 173.40 ML MAS DE TUBERIA PVC DE 10" DE DIAMETRO QUE CORRESPONDEN A 96.4 SOBRE LA AVENIDA 11 ENTRE LA CALLE 42 Y 43 Y 77 ML QUE SE INSTALARON POR LA CALLE 44 ENTRE LA AVE. 10 Y 11, ADEMAS DE LOS 1,197 ML QUE YA ESTABAN PAGADOS Y QUE SE INSTALARON POR LA CALLE 43 ENTRE LA AVENIDA 14 Y LA AVENIDA 26, ADEMAS SE ENCONTRO QUE POR EL CALLEJON 42,43 ENTRE LA AVENIDA 23 Y 26 SE TENIAN INSTALADOS 203 ML DE TUBERIA PVC DE 4" DE DIAMETRO Y EN OTRO TRAMO POR EL MISMO CALLEJO SE TENIAN INSTALADOS 211 ML DE TUBERIA PVC DE 4" DE DIAMETRO, NO ESTABAN CONECTADOS AUN Y SE TENIAN INSTALADAS 27 TOMAS DOMICILIARIAS, ADEMAS SE CONTRUIA UNA CAJA DE VALVULAS EN EL CRUCERO DE LA AVENIDA 20 Y CALLE 43. EL AVANCE LA DE OBRA ES DEL 78%.

FECHA: 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 (FRONTERAS)

No. DE LA OBRA: C-00085/0337 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA MUNICIPIO DE FRONTERAS, EN ESTA OBRA ENCONTRE QUE YA SE TENIAN INSTALADAS LAS 30 TOMAS DOMICILIARIAS Y LOS 30 COLUMPIOS Y CONSTRUIDAS LAS DOS CAJAS DE VALVULAS QUE ERA LO QUE LE FALTABAPARA CONCLUIR,EL AVANCE FISICO ES DEL 100% (CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-033)

No. DE LA OBRA: C-00085/0340 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEL RIO, LOCALIDAD FRONTERAS, MUNICIPIO DE FRONTERAS., EN ESTA OBRA ENCONTRE QUE YA ESTABA CONCLUIDA PUES NADAMAS LE FALTABA CONTRUIR LA CAJA DE VALVULAS Y YA ESTABA TERMINAS POR LO QUE EL AVANCE DE LA OBRA ES DEL 100% (CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-059).

No. DE LA OBRA: C-00085/0341 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDAL, LOCALIDAD , ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, AL RESPECTO DE ESTA OBRA LE COMENTO QUE LA OBRA YA SE ENCONTRABA TERMINADA CON LA EJECUCIÓN DE 669 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC. DE 3" DE DIAMETRO, SE INSTALARON 32 TOMAS DOMICILIARIAS, HUBO 13 PERSONAS QUE NO SE LES PUDO INSTALAR EL COLUMPIO YA QUE SE TENIA PISO DE CONCRETO, PERO LA EMPRESA LES HIZO ENTREGA DE LA PIEZA CON LA FIRMA DE UN DOCUMENTO DE RECIBIDO, ADEMAS SE CONTRUYO UNA CAJA DE VALVULAS, EL AVANCE DE LA OBRA ES DEL 100% (CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-060).

No. DE LA OBRA: C-00085/0321 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MUNICIPIO DE FRONTERAS., AL RESPECTO LE INFORMO LO SIGUIENTE: SE TENIA LA EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN PERO SE ENCONTRARON QUE EL MATERIAL A 1.30 M. SE ENCONTRABA SATURADO(HUMEDO) POR LO QUE LLAMARON A UN LABORATORIO PARA DICTAMINARA Y DIERA



RECOMENDACIONES, EL LABORATORIO REALIZO LA PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y NO DIERON POR LO QUE RECOMENDO SACARAN EL BACHE O EL MATERIAL SATURADO Y LO SUSTITUYERAN POR MATERIAL BASE O PIEDRA A RESERVA DE EXPEDIR LOS RESULTADOS POR ESCRITO, EN EL TALLER EN CANANEA SE TENIA LAS CUATRO PATAS DE LA ESTRUCTURA Y EL EMPARRILLADO DE ACERO DE LAS ZAPATAS Y LOS DADOS. EL AVANCE APROXIMADO ES DEL 35%, (CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-055).

No. DE LA OBRA: C-00075/0683 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA, FRONTERAS., AL RESPECTO LE INFORMO QUE ESTA OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA Y HASTA EL MOMENTO SE ENCONTREABAN LOS TRES CON LOS MUROS HASTA NIVEL DE LOSA POR LO QUE EL AVANCE ES DEL 50% (CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-032).

No. DE LA OBRA: C-00075/0685 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DE FRONTERAS, SONORA., AL RESPECTO DE ESTA OBRA LE COMENTO QUE SE ENCONTRABAN COLOCANDOLES LOS ENJARRES A OCHO CUARTOS Y EN DOS CUARTOS NADAMAS SE TENIA LA EXCAVACION DE LA CIMENTACIÓN, EL AVANCE REGISTRO HASTA HOY ES DEL 70% (CONTRATO; SEDESSON-FISE-2021-051)

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2021 (FRONTERAS)

No. DE LA OBRA: C-00075/0661 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, AL RESPECTO DE ESTA OBRA LE COMENTO QUE ENCONTRE QUE OCHO BAÑOS NADAMAS LES FALTABA LA COLOCACIÓN DE LA VENTANA, DOS YA SE TENIAN CON LOS MUROS A NIVEL DE LA PIÑA Y LOS OTROS DOS SE ENCONTRABA CON LOS MUROS A LA MITAS Y UNA SEM ESTABA COLANDO EL PISO, EL AVANCE FISICO HASTA ESTE DIA ES DEL 71% (CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-032).

No. DE LA OBRA: C-00075/0662 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, AL RESPECTO LE COMENTO QUE DE LOS DIEZ BAÑOS QUE SON, CINCO SE ENCONTRABAN CON TECHO YA COLOCADO , TRES MAS SE ENCONTRABAN CON LOS MUROS EJECUTADOS HASTA EL NIVEL DE LA PIÑA Y LOS OTROS DOS SE ENCONTRABA LA PURA PLANCHA COLADA, EL AVANCE HASTA EL DIA DE HOY ES DEL 28% (CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-032)

No. DE LA OBRA: C-00075/0663 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA., AL RESPECTO LE INFORMO QUE HASTA EL MOMENTO SE ENCONTRABAN LOS DOS BAÑOS CON PINTURA, PUERTAS, VENTANA Y MUEBLES SANIARIOS Y WC, PERO AUN LES FALTABA LA COLOCACIÓN DE LOS TINACOS Y EL BIODIGESTOR Y LOS DEMAS ACCESORIOS., AVANCE FISICO ES 68%. (CONTRATO: SEDESSON-FISE-2021-032).

POR ULTIMO LE INFORMO QUE LA COMISIÓN SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE, SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.




ATENTAMENTE


ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ
COORDINADOR DE EVALUACIÓN SOCIAL

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



REPORTE FOTOGRAFICO

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONO A LOS MUNICIPIOS DE NACOSARI DE GARCIA, FRONTERAS Y AGUA PRIETA, SONORA.

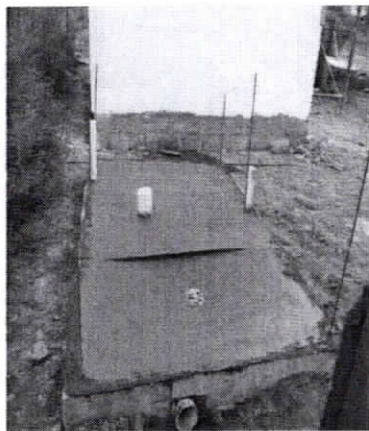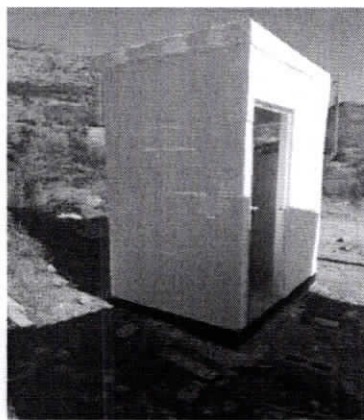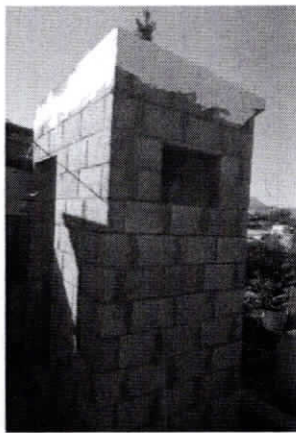

REPORTE FOTOGRAFICO

EN REFERENCIA AL AVISO DE COMISION CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONO A LOS MUNICIPIOS DE NACOSARI DE GARCIA, FRONTERAS Y AGUA PRIETA, SONORA.

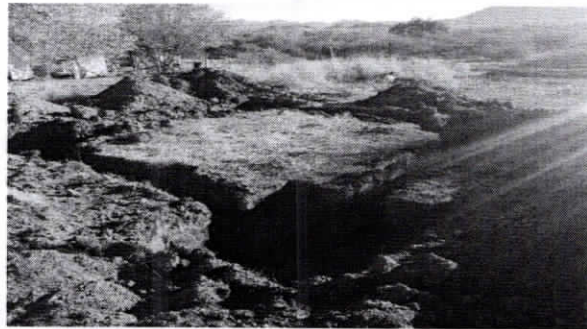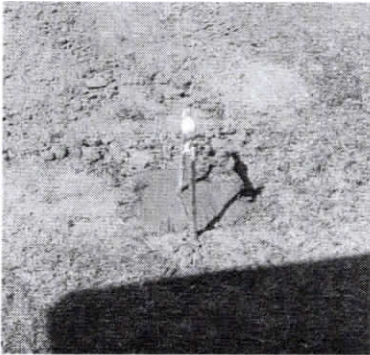

ATENTAMENTE:

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ

787-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE GASTO DE INVERSIÓN

Hermosillo, Sonora, 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

CARLOS MARTÍN MORALES DÍAZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCÍA; CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, BAÑOS CON DESCARGA Y CONTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS; AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLES EN VARIAS CALLES EN AGUA PRIETA.

Se le comisiona a:

NACAZARI DE GARCÍA, FRONTERAS Y AGUA PRIETA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 10 NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 103

Marca NISSAN

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,400.00

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Director
C.c.p. Cesar José De La Cruz Sánchez, Jefe del Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado
GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
AGUA PRIETA, SONORA.



AYUNTAMIENTO DE NACAZARI DE GARCÍA
ESTADO DE SONORA
SEDESOL
COORDINACIÓN MUNICIPAL
