


INFORME DE COMISION

Hermosillo Sonora, a 21 de Noviembre de 2021



ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 08 de noviembre de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Supervisión de avances de Obras para autorización del pago de Estimaciones y Recabar Actas de Entrega Recepción en su caso en los Municipios de Cajeme, Benito Juárez, Álamos y Etchojoa.

Lugar: Cajeme, Benito Juárez, Etchojoa, Álamos, Sonora.

Periodo: del 10 al 13 de Noviembre de 2021.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios mencionados, para llevar acabo la Supervisión de calidad de las Obras, realizando las actividades que a continuación menciono:

(10-13 de Noviembre 2021).- Primeramente se inició con la Supervisión del contrato No. SEDESSON-FISE-2021-027, para revisión de la Obra: C-00075/0669 Construcción de Cuarto Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Cajeme, en compañía del contratista, se dio recorrido por todas las ubicaciones de las 15 viviendas beneficiadas en las localidades de Providencia (1), Col. Presidentes (4), Col. Esperanza Tiznado (1), Ejido Morelos 1 (1), Ejido Morelos 2 (4), Pueblo Yaqui (2) y Nueva Casa de Teras (2), para una revisión y supervisión de avances a la fecha, encontrando la obra en proceso, con 6 viviendas prácticamente terminadas, solo detalles de pintura y resanes por instalación de puertas y ventanas. Otras 5 viviendas en proceso de aplanados con enjarres interior y exterior en los ejidos Morelos 1 y 2, mientras que 2 más en muros de block a la 5 hilada y 2 más en colado de zapatas y muros de enrase. Todos los trabajos se aprecian de buena calidad, de acuerdo a especificaciones y dimensiones de proyecto. A este contrato se realizó convenio modificatorio, autorizando prorroga del 25% del tiempo por cuestiones climatológicas y sucesos de violencia organizada en las zonas rurales. Con todo esto se cuantifica un avance en general del 70% de la obra aproximadamente. También se Supervisó el Contrato No. SEDESSON-FISE-2021-036, para revisión de la Obra: C-00085/0326 Ampliación de Red de Agua Potable en Varias Calles de la Localidad de Providencia, Municipio de Cajeme; donde esta obra se encontraba en proceso, pero el organismo operador del agua, ya suspendió los trabajos de excavación ya que a la fecha no se cuenta con la tubería hidráulica, por lo que solamente se trabaja con la construcción de cajas de válvulas Tipo "2" y Tipo "5" con plantillas y pegado de ladrillo. Se tienen zanjas excavadas para la colocación de 450 ml de red, con plantilla con limo ya colocado, en espera del suministro. Con todo esto se

INFORME DE COMISION

considera un avance en general del 15% de la Obra aproximadamente, por lo que contratista solicitó prorroga a causa del desabasto de resinas por la entrega del material por parte del proveedor. Después nos trasladamos al Municipio de Benito Juárez a Supervisión del Contrato No. SEDESSON-FISE-2021-048, para revisión de la Obra: C-00075/0668 Construcción de baños con Descarga Domiciliaria en la Localidad de Paredón Colorado, Municipio de Benito Juárez, de la misma forma de dio recorrido por las 30 ubicaciones de los módulos sanitarios en Paredón Colorado, encontrando la obra en proceso, faltando en algunas ubicaciones, puertas y ventanas, en otras instalación de tinaco y accesorios eléctricos, teniendo prácticamente terminados alrededor de 16 baños completos, mientras que otros se encuentran en colado de losa de azotea, colocación de muros de block, y 4 de ellos en proceso de plancha de cimentación. Todos ellos con trabajos de buena calidad, de acuerdo a especificaciones y dimensiones del plano, cuantificando un avance en general de la obra del 76% aproximadamente. Después nos trasladamos al Municipio de Etchojoa para la Supervisión del Contrato No. SEDESSON-FISE-2021-058, para revisión de la Obra: C-00077/0258 Ampliación de Red de Alcantarillado en Varias Calles de la Colonia San Ángel en la Localidad de Bacobampo, Municipio de Etchojoa, dando recorrido por varias calles encontrando ya zanjas compactadas, con tubería Sanitaria PVC de 8" de diámetro ya instalada en red de atarjeas, pozos de visita completamente terminados, descargas ya colocadas y registros de banquetas en proceso del colado de tapas y detallado de enjarre interior, se inicia con la excavaciones para la colocación del colector, por lo que se aprecian trabajos de buena calidad de acuerdo a especificaciones de proyecto, por lo que se cuantifica un avance en general del 60% de la obra aproximadamente. Más tarde se visitó el contrato No. SEDESSON-FISE-2021-044, para revisión de la Obra: C-00077/0254 Ampliación de Red de Alcantarillado en Varias Calles de la Localidad de Chucarit, Municipio de Etchojoa, dando recorrido por la obra prácticamente terminada, revisando pozos de visita, registros de banquetas y descargas colocadas para un total de 24 familias beneficiadas, trabajando en el recarpeteo, con la compactación del material para su colocación. Se aprecian trabajos de buena calidad cuantificando un avance en general del 98% de la obra. Mientras que la Obra: C-00077/0253 Ampliación de Red de Alcantarillado en la Localidad de San Pedro Nuevo, Municipio de Etchojoa, se cuentan con trabajos de colocación de tubería PVC de 8" de diámetro en red de atarjeas en algunos tramos, pero se realiza trabajos de levantamiento topográfico de la red sanitaria existente por variaciones de los puntos de conexión., con todo esto se considera un avance en general del 20% en la obra, recabando archivo fotográfico de los trabajos. Por fallas mecánicas del vehículo no se pudo continuar con la supervisión de los Contratos No. SEDESSON-FISE-2021-053; SEDESSON-FISE-2021-041; SEDESSON-FISE-2021-042 Y SEDESSON-FISE-2021-057, en el Municipio de Álamos, ya que la unidad empezó a fallar en la Localidad del Paredón Colorado, se empezó a encender el foco de Pila en tablero, y la luz estaban muy tenúas, por lo que se decidió salir de la Localidad y llegar a la ciudad más cercana para poder revisar el vehículo, llegando a Navojua e informando al departamento de Vehículos de esta dependencia lo sucedido, haciendo un diagnóstico previo de fallas en el alternador, informándome que se tendría que llevar dicha unidad al taller más cercano autorizado por la sedesson en la ciudad de Obregón, pero para ello se tendría que comprar una pila nueva, ya que se había descargado en su totalidad la pila de vehículo, ya que las luces no prendían en lo absoluto, por lo que se tomó la

INFORME DE COMISION

decisión pernoctar en Navojoa. Con el Vehículo en marcha por más de 2 horas en busca de un hotel, mismo que no se decidió apagar por las fallas mecánicas presentadas, con el fin de poder moverse en busca de un hotel, pero no se encontró hotel en toda la ciudad donde poder descansar ya que ese semana se realizaba un torneo juvenil y se encontraban estos agotados, por lo que se tuvo que dormir en la unidad en las afueras del hotel sicomoro, ya que hasta ahí duro la carga de la batería. Al día siguiente antes de realizar la compra de otra batería para poder trasladar el Vehículo a Obregón, me comuniqué con un contratista de la ciudad, donde se puso a disposición de ayudarnos y conseguir un taller eléctrico automotriz, ya que no se encontraba en la ciudad en esa fecha, reportándose conmigo a los 30 minutos después, pidiendo la ubicación donde me encontraba para ir a revisarlo, informando al departamento vehicular para autorización, aprobando la cotización el departamento administrativo. Al llegar y reparar alternador y carga lenta de pila, se solicitó el importe total y la factura correspondiente, pagando dicho importe con recurso destinado a la gasolina de la comisión y la otra parte con recurso propio, motivo la cual ya no se pudo continuar con la comisión faltando el municipio de Álamos, con 6 obras por supervisar, es por lo cual el aviso de comisión no cuenta con el sello de ese municipio. Una vez ya reparada la unidad, además del tiempo perdido por la reparación, desocupándonos del taller después del medio día del sábado 13 de Noviembre, se emprendió el regreso a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino ya sin ningún contratiempo.






Se anexa reporte fotográfico.



ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA

INFORME DE COMISION




REPORTE FOTOGRÁFICO

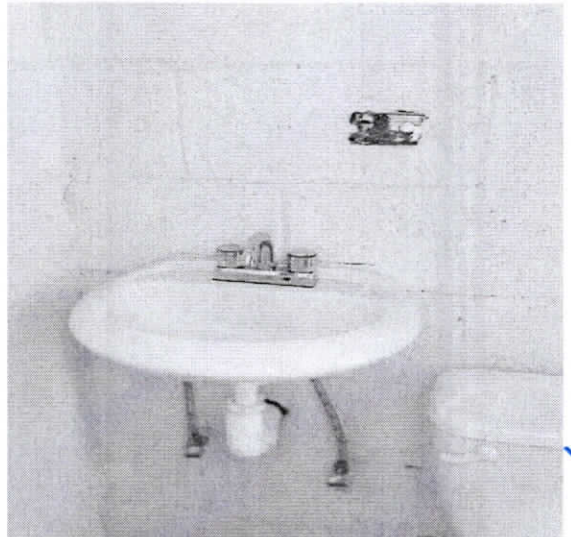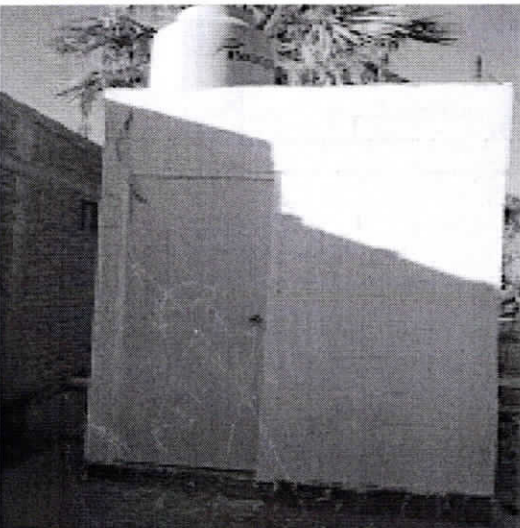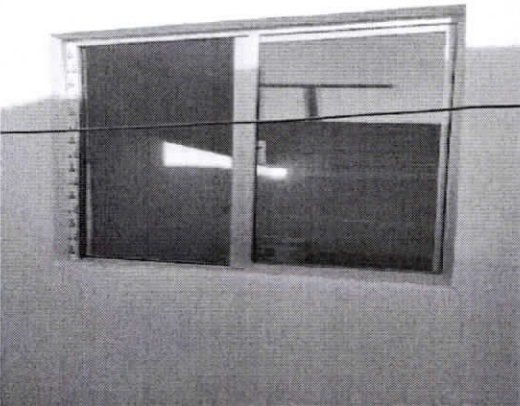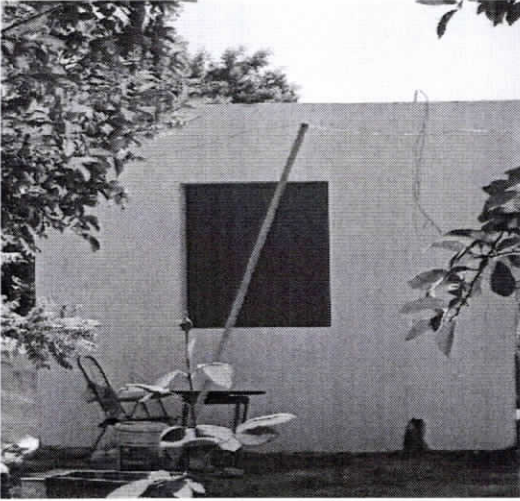

Ch

INFORME DE COMISION





REPORTE FOTOGRÁFICO

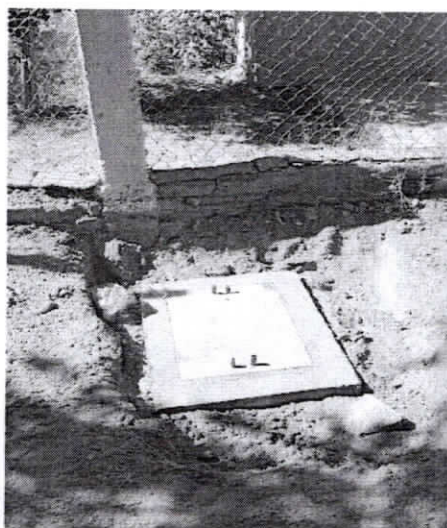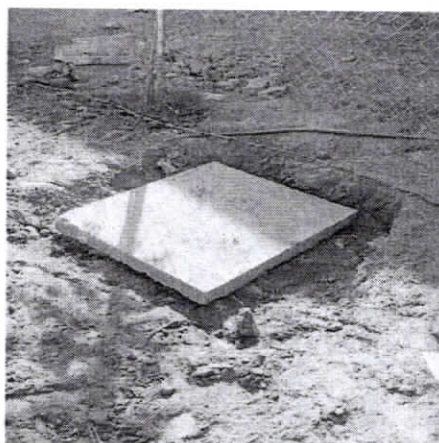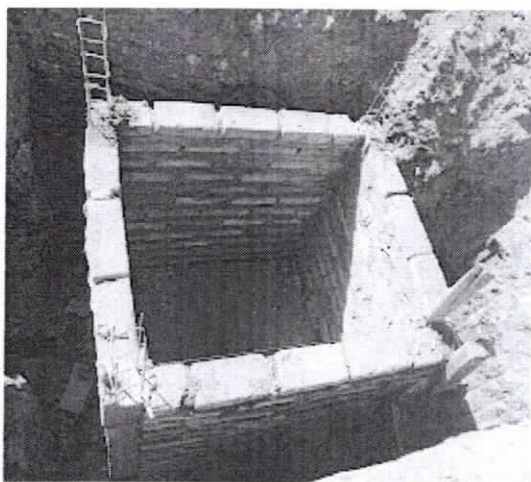

A handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Cv'.

INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRAFICO (REPARACIÓN VEHÍCULO)

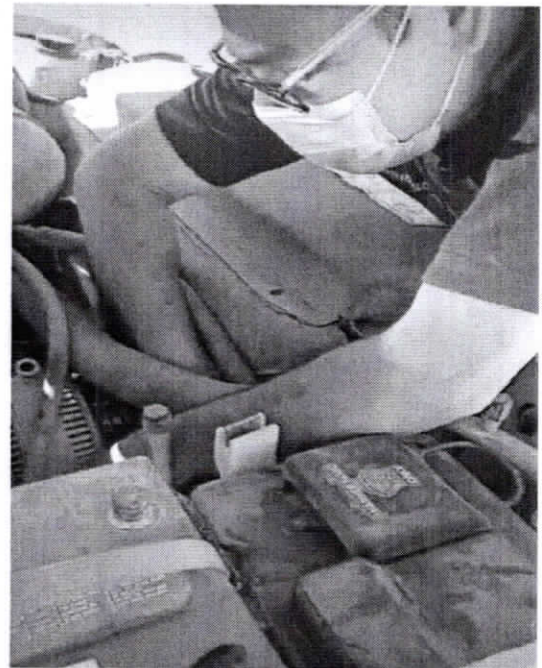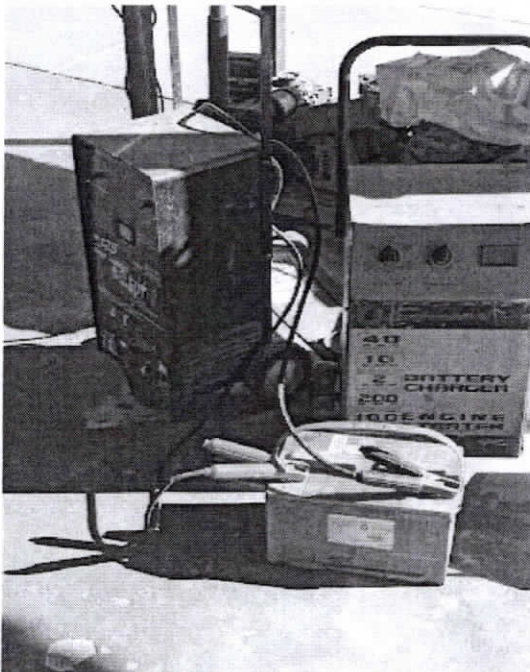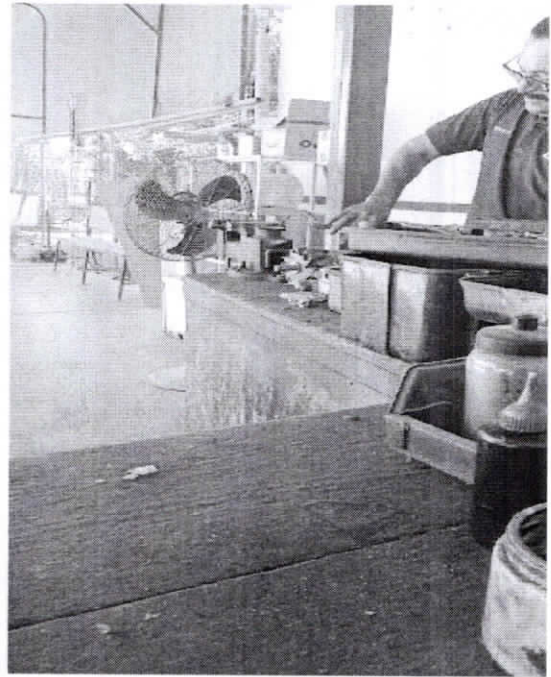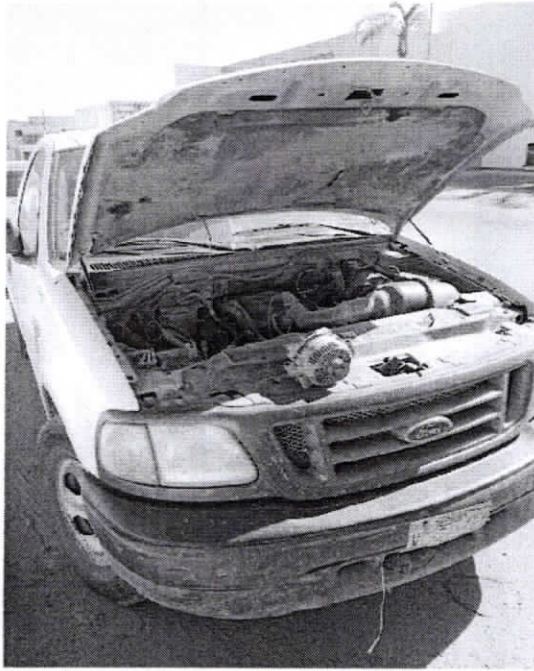

A blue handwritten signature, possibly reading "Ch", located at the bottom right of the page.

788-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 08 DE NOVIEMBRE DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRAS PARA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE ESTIMACIONES Y RECABAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN SU CASO EN LOS MUNICIPIOS DE CAJEME, BENITO JUÁREZ, ÁLAMOS Y ETCHOJOA.

Se le comisiona a:

CAJEME, BENITO JUÁREZ, ÁLAMOS Y ETCHOJOA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 10 **NOVIEMBRE** AL 13 DE **NOVIEMBRE** DE 2021

Vehículo No. 7

Marca FORD

Modelo 2007

Placas VC-31-181

Tipo PICK UP F-150



CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$3,150.00

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SONORA
ESTADO DE OPORTUNIDADES



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz, Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

