



Hermosillo, Sonora; a 06 de diciembre de 2021

Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo
Directora General de Proyectos de Infraestructura Básica
PRESENTE. –

En referencia al **aviso de comisión con fecha 10 de noviembre de 2021**, mediante el cual se me comisionó en el periodo del **16 de noviembre al 19 de noviembre de 2021** a los municipios de **Guaymas y Empalme** con el propósito de realizar recorrido con el contratista para supervisar avances, calidad de obras y aprobación de números generadores de estimaciones, además de acompañar a personal de la Contraloría General del Estado en recorrido para verificación física de las obras, por lo que me permito informarle de las actividades realizadas en esta comisión:

- **Municipio de Guaymas:** Se realizó recorrido en compañía del contratista el Ing. Carlos Noriega Alegre por todas las ubicaciones de vivienda, iniciando por la Localidad de Vicam, encontrando avances en las 4 viviendas, 3 a nivel de pintura, instalaciones eléctricas, listas para recibir, firme de concreto, puertas y ventanas. Además de una que se encuentra recibiendo enjarre grueso, fino y aplanado de yeso. Se continuó con el recorrido en la Localidad de Pótam, donde se encuentran 4 ubicaciones a nivel de muro de enrase, preparándose para colado de cadena de cimentación, se encuentra suministrado el material de block y cemento para comenzar con la colocación para muros. En la cabecera municipal se realizó recorrido por las 8 ubicaciones en donde se encuentran 4 a nivel de muros, esperando colado de losa de azotea, y otras 4 con trabajo de colocación de block para muros y preparación para colado de castillos, alcanzando un avance del 42% aproximadamente del avance general en esta obra.

En las obras de infraestructura en compañía del Ing. Luis Torres de la Contraloría General del Estado se comenzó recorrido por las obras de agua potable y alcantarillado ubicadas en la Colonia Humberto Gutiérrez, se realizaron medidas con odómetro entre los pozos de visita y nodos ubicados a lo largo del trazo, se verificaron la fabricación de registros sanitarios, se tomaron medidas en los pozos ya fabricados que ya cuentan con su brocal y tapa, relacionando el plano de proyecto con lo ejecutado en campo, se informó al auditor que existen algunas diferencias en el proyecto debido a situaciones propias del terreno natural, como alturas de pozos variantes o reacomodo en el trazo y metraje de algunas calles, ambas obras se encuentran en proceso y con un avance general aproximado de 90% en el agua potable y 75% en el alcantarillado sanitario.

Para culminar con el municipio de Guaymas se realizó una visita a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano con la C. Claudia Villavicencio, quien realizó la entrega de documentación propia de la obra, se le informó de los avances con la finalidad de a su término realizar el acto de entrega – recepción de la obra.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
DE SONORA

- **Municipio de Empalme:** En compañía del Ing. Luis Torres de la Contraloría General del Estado se realizó recorrido por el trazo de la obra, iniciando con la red de alcantarillado en medición con odómetro, se abrieron los brocales para medición y revisión de pozos de visita, se contabilizaron las descargas domiciliarias y registros sanitarios, se tomaron medidas en la ubicación de los biodigestores y se observó el procedimiento de la instalación de uno de ellos, zona donde se encontraban realizando los trabajos en ese momento, se terminó con la revisión de algunos pozos en fabricación, tomando fotografías del proceso. La obra se encuentra con un avance general de 78%. En las oficinas de Desarrollo Urbano se realizó una reunión breve con el Director Ing. Sixto Fraijo. Por último se realizó recorrido por las 16 ubicaciones de vivienda en el municipio, iniciando por la Localidad de Cruz de Piedra, donde se encuentran avances generales realizando trabajos de pintura, instalaciones eléctricas, y fabricación de firme de concreto, en la cabecera municipal se visitaron el resto de las ubicaciones donde 4 se encuentran a nivel de cadena de desplante, listas para iniciar con la colocación de muros y 4 más trabajando en cimbra de castillos y cadenas de cerramiento lo que representa un avance aproximado del 60% del total de los trabajos de contrato.

Se hace de su conocimiento que debido a situaciones de trabajo para la presentación de documentación a la Contraloría General del Estado tanto para la visita física como para la revisión documental, se debió recorrer 1 día la comisión, iniciando el día 17 de noviembre y terminando el 20 de noviembre, continuando con la misma cantidad de días.

De ésta manera me permito informarle de las actividades realizadas durante la comisión. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE. -

Mtr. Miguel Angel Mendoza Tapia
Supervisor de Área






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

MUNICIPIO DE GUAYMAS

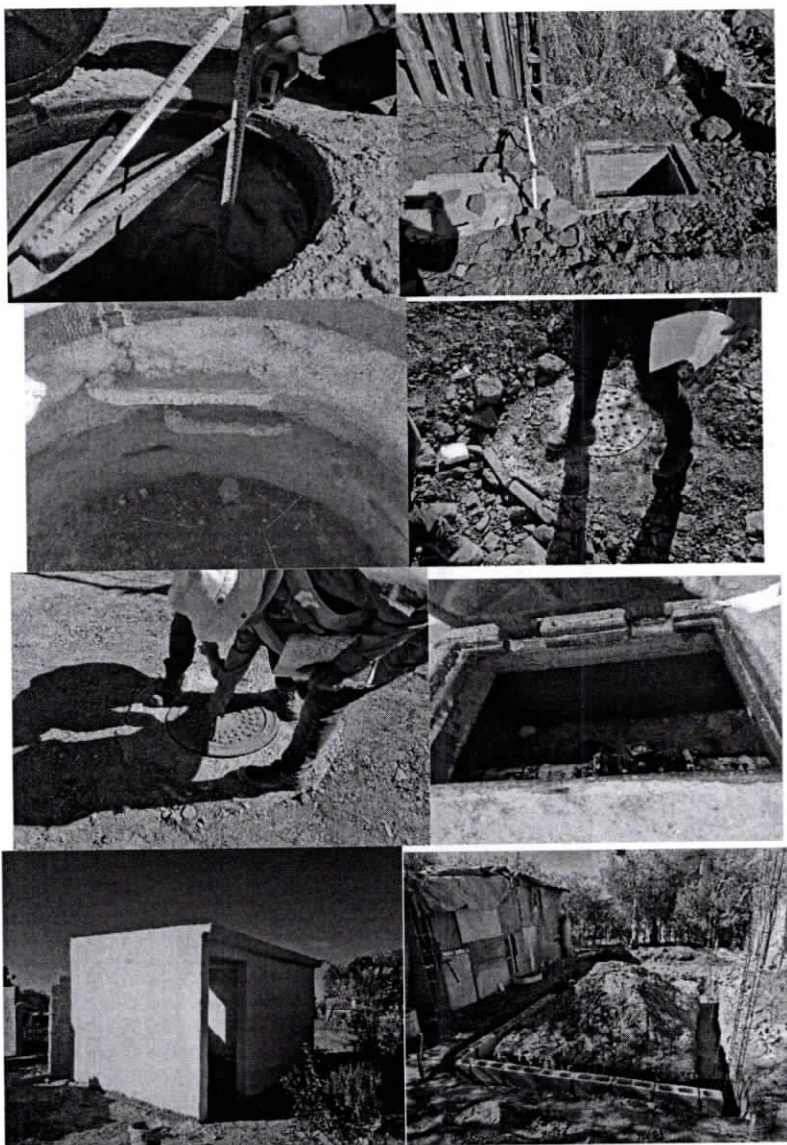

C




Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

MUNICIPIO DE EMPALME

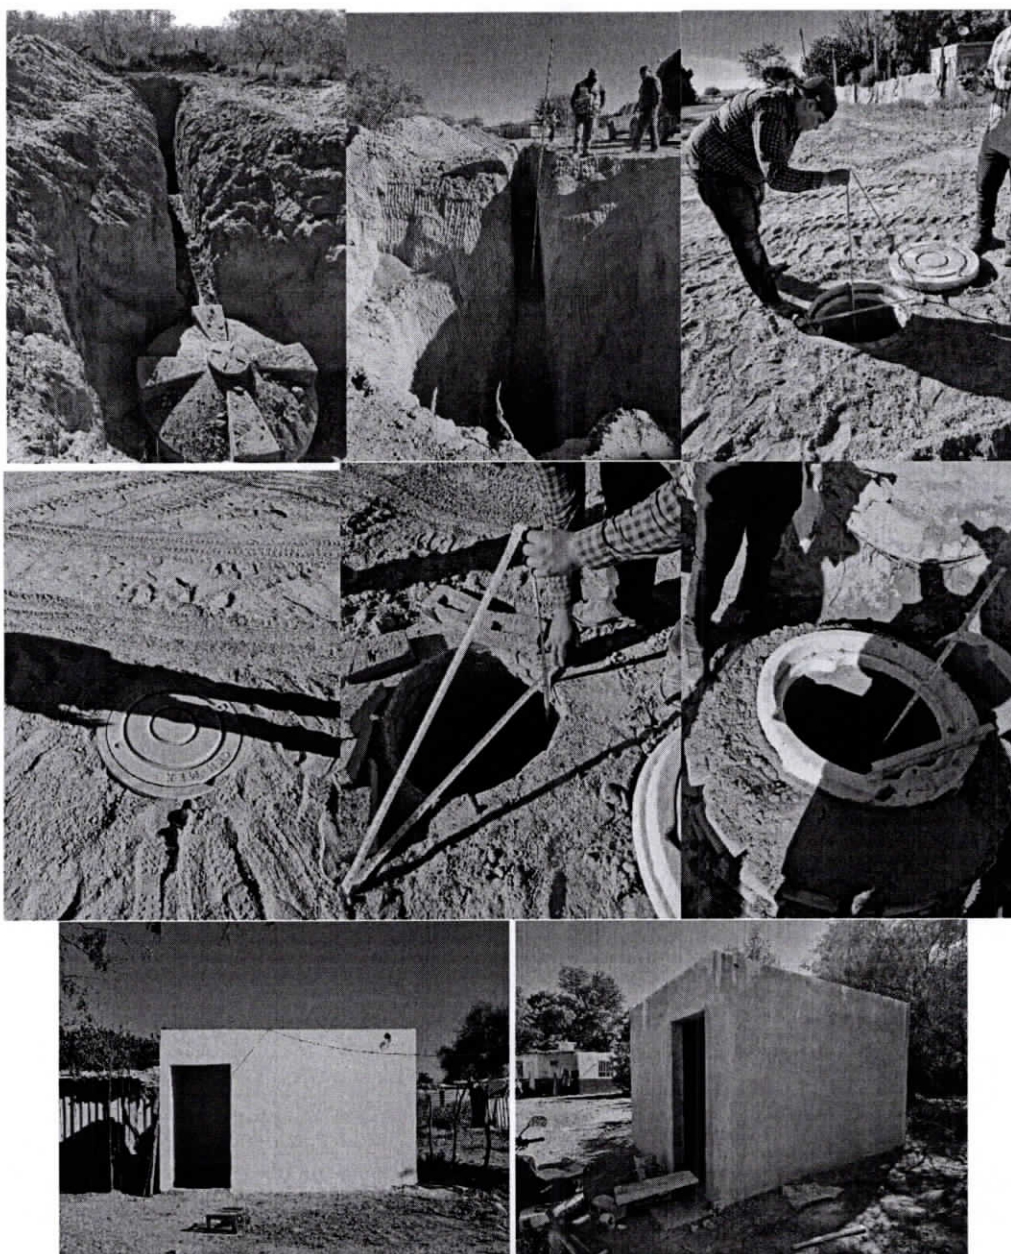

Q



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx

795-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TAPIA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ RECORRIDO CON EL CONTRATISTA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR AVANCES, CALIDAD DE OBRAS Y APROBACIÓN DE NÚMEROS DE ESTIMACIONES DE LAS OBRAS: C-00077/0251 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COL. HUMBERTO GUTIERREZ, GUAYMAS, C-00085/0327 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLES EN COL. HUMBERTO GUTIERREZ, GUAYMAS, C-00077/0252 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE CRUZ DE PIEDRA, MPIO. DE EMPALME, C-00075/0667 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO- DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MPLAME, C-00075/0653 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS. SE ACOMPAÑARA AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL RECORRIDO PARA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LA OBRA PÚBLICA.

Se le comisiona a:

GUAYMAS Y EMPALME, SONORA.

Durante el (los) día (s) 16 NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$500.00

ATENTAMENTE


LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



H. AYUNTAMIENTO DE
EMPALME, SONORA

