

Hermosillo, Sonora; a 26 de Noviembre del 2021.

ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
P R E S E N T E. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 18 al 18 de noviembre del 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA FISE 2021 DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON DESCARGA Y BAÑOS CON BIODIGESTOR, CON NÚMERO DE OBRA C-00075/0674 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-039 Y LAS OBRAS C-00075/0675 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LA OBRA C-00075/0676 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, AMBOS DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-040.

LUGAR DE COMISION: HERMOSILLO (VARIAS LOCALIDADES), SONORA.

RESULTADOS







El día 18 de noviembre me dirigí a la supervisión de cuartos y baños con descarga domiciliaria en la localidad de Hermosillo, con número de obra C-00075/0674 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Hermosillo, del contrato SEDESSON-FISE-2021-039 y la obra C-00075/0675 construcción de baños con descarga domiciliaria en varias localidades del municipio de Hermosillo, del contrato SEDESSON-FISE-2021-040 en donde se observó poca actividad en el tramo mencionado, y que las observaciones antes señaladas no se habían atacado, por lo que se le hizo de nuevo la observación al contratista solventar dichas observaciones de calidad, los cuartos ubicados hacia el norte de Hermosillo estaban iniciándose, estaban algunas en trazos y otras en nivel de colado de cimentación, en lo que respecta a los baños se encontraban sin iniciar. Una vez terminado el recorrido recorrido en esta localidad me dirigí a localidad del Poblado Miguel Alemán, donde además de las obras antes mencionadas se está ejecutando la obra C-00075/0676 construcción de baños con biodigestor en varias localidades del municipio de Hermosillo, en donde se observó que se encontraban trabajando en yeso en losa, primera mano de pintura en muros, enjarres, colocación de puertas y ventanas, y trabajando en colocación de biodigestores. En total los contratos tienen un avance aproximado del 60%.

Se le solicitó al contratista abrir nuevos frentes para cumplir en tiempo y forma con estos contratos. En este recorrido no fuimos atendidos por personal del municipio.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:

Obra: C-00075/0674 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Hermosillo:






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**




GOBIERNO
de SONORA

842-I

Obra: C-00075/0676 construcción de baños con biodigestores en varias localidades en el municipio de Hermosillo.

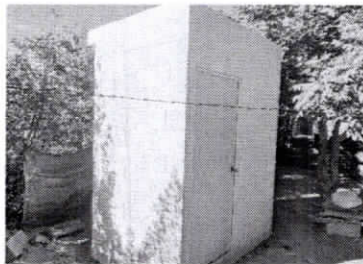


Obra: C-00075/0675 construcción de baños con descarga domiciliaria en varias localidades en el municipio de Hermosillo.

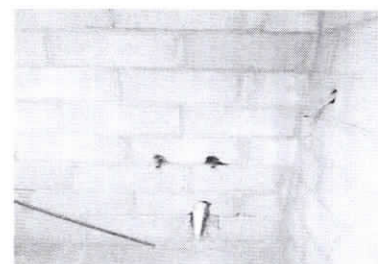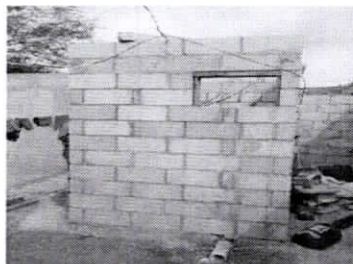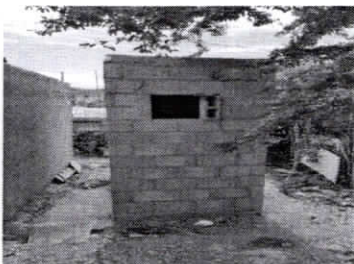

Terminando la revisión en éstas localidades, me dirigí a Hermosillo.

Se concluyó el recorrido de supervisión sin novedad.

ATENTAMENTE.-



ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN


SONORA

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx

842-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
P R E S E N T E .-

Con el propósito de :

REVISIÓN DEL PROGRAMA FISE 2021 DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA Y BAÑOS CON BIODIGESTOR, CON NÚMERO DE OBRA C-00075/0674 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-039 Y LAS OBRAS C-00075/0675 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LA OBRA C-00075/0676 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, AMBOS DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-040.

Se le comisiona a:

HERMOSILLO (VARIAS LOCALIDADES), SONORA.

Durante el (los) día (s) 18 **NOVIEMBRE** AL 18 DE **NOVIEMBRE** DE 2021

Vehículo No. 25

Marca FORD

Placas VC-31-189

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE


LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

