

Hermosillo, Sonora; a 26 de Noviembre del 2021.

ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
P R E S E N T E. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 19 al 19 de noviembre del 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA FISE 2021 DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON DESCARGA Y BAÑOS CON BIODIGESTOR, CON NÚMERO DE OBRA C-00075/0674 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-039 Y LAS OBRAS C-00075/0675 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LA OBRA C-00075/0676 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, AMBOS DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-040.

LUGAR DE COMISION: HERMOSILLO (VARIAS LOCALIDADES), SONORA.




RESULTADOS

El día 19 de noviembre me dirigí a la supervisión de cuartos y baños con descarga domiciliaria en la localidad de Plan de Ayala, con número de obra C-00075/0674 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Hermosillo, del contrato SEDESSON-FISE-2021-039 y la obra C-00075/0676 construcción de baños con biodigestor en varias localidades del municipio de Hermosillo, del contrato SEDESSON-FISE-2021-040 ,hice el recorrido con el superintendente , el ing. Juan R. Cruz C. en donde se observó poca actividad en el tramo de baños con biodigestor, debido a que por la inseguridad que impera en la región el contratista no ha podido mantener de forma constante la mano de obra para la realización de los trabajos que la obra requiere, se le hicieron observaciones en cuanto a detallado de muros aparentes, terminación de impermeabilización de cimentaciones, rematar correctamente las áreas impermeabilizadas en losas de azotea, también en acabados de enjarres para su solventación. Se estaban realizando trabajos de detallado enjarres, exteriores e interiores, Las obras presentan un avance aproximado del 60%. Se le solicitó al contratista abrir nuevos frentes para cumplir en tiempo y forma con estos contratos. En este recorrido no fuimos atendidos por personal del municipio.




Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:

Obra: C-00075/0674 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Hermosillo:

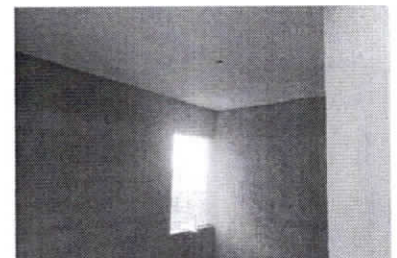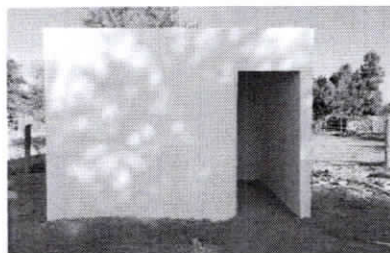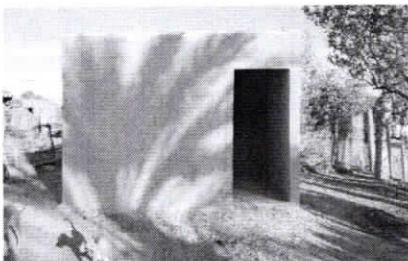

Obra: C-00075/0676 construcción de baños con biodigestores en varias localidades en el municipio de Hermosillo.

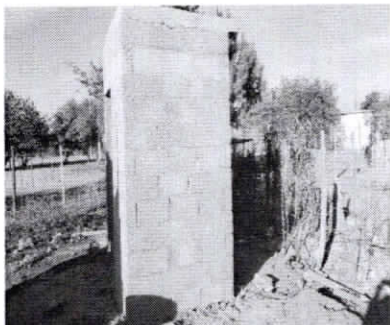

Terminando la revisión en éstas localidades, me dirigí a Hermosillo.

Se concluyó el recorrido de supervisión sin novedad.

ATENTAMENTE.-


ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISIÓN DEL PROGRAMA FISE 2021 DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA Y BAÑOS CON BIODIGESTOR, CON NÚMERO DE OBRA C-00075/0674 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-039 Y LAS OBRAS C-00075/0675 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LA OBRA C-00075/0676 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, AMBOS DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-040.

Se le comisiona a:

HERMOSILLO (VARIAS LOCALIDADES), SONORA.

Durante el (los) día (s) 19 **NOVIEMBRE** AL 19 DE **NOVIEMBRE** DE 2021

Vehículo No. 25

Marca FORD


Placas VC-31-189

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE


LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

