


INFORME DE COMISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Hermosillo Sonora a 13 de Diciembre de 2021



ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 19 de Noviembre de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Supervisión de Obras en Campo con Personal de la Contraloría del Estado en los Municipios de Álamos, Etchojoa, Benito Juárez.

Lugar: Álamos, Etchojoa y Benito Juárez.

Periodo: del 23 al 27 de Noviembre de 2021.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios mencionados, para llevar acabo la Supervisión en Campo de los Avances de Obras, realizando las actividades que a continuación menciono:

(23 al 27 de Octubre 2021).- Primeramente nos trasladamos al Municipio de Benito Juárez, se inició con la Supervisión del contrato de Obra No. SEDESSON-FISE-2021-048, con la revisión de las Obras C-00075/0668 Construcción de Banos con Descarga Domiciliaria en la Localidad Paredon Colorado Municipio de Benito Juárez, donde en compañía del contratista Superintendente de Obra, Ing. Francisco Javier Toledo Ruiz, y personal de la Contraloría, Ing. Luis Ignacio Terrones, se dio recorrido por cada uno de los módulos sanitarios a beneficio de la localidad, se encontraron en 25 baños prácticamente terminados y 5 más en proceso, faltando la conexión a descargas y tapaderas de registros, además de algunos detalles adicionales marcados en la visita, para un avance en general de la Obra del 90% aproximadamente. En esta localidad o Municipio no fue posible recabar el sello de alguna dirección o dependencia del ayuntamiento, ya que terminamos la revisión muy tarde y no se encontró personal quién nos pudiera sellar dicho aviso. Después nos trasladamos al Municipio de Etchojoa a Supervisión del contrato No. SEDESSON-FISE-2021-044, para la Obra: C-00077/0254 Ampliación de Red de Alcantarillado en varias calles de la Localidad de Chucarit, Municipio de Etchojoa, en compañía del Superintendente de la Obra, se dio recorrido por la obra que se encuentra terminada a la fecha, revisando los metros lineales de Red de Atarjeas de 8" de diámetro, de acuerdo a plano de Obra terminada, se verificaron Pozos de Visita, profundidades y acabados en instalación de brocales, así como la instalación de descargas domiciliarias y registros de banquetas, estando acorde a las cantidades de obra pagadas teniendo una obra terminada y operando, pero teniendo algunas pequeñas observaciones pidiendo el contralor su corrección y evidencia fotográfica de las reparaciones. Después se continuó con la Obra: C-00077/0253 Ampliación de Red de Alcantarillado en la Localidad de San Pedro Nuevo, Municipio de Etchojoa, se dio recorrido por la obra, encontrando

INFORME DE COMISION


trabajos en proceso con excavaciones para la instalación de tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro en Red de Atarjeas, Fabricación de Pozos de Visita a base de ladrillo y algunas Descargas Domiciliarias, con silletas, codo de 45° de 6" de diámetro y tubería hasta límite de predio, así como también relleno de zanjas con material de banco en acostillado y material producto de excavación en capas de 20 cm compactadas con bailarina, para un avance en general del 50% aproximadamente. Después nos trasladamos en el Municipio de Etchojoa a Supervisión del Contrato No. SEDESSON-FISE-2021-053, para revisión de las Obras: C-00077/0257 Electrificación de Cárcamo de bombeo de Alcantarillado Sanitario en la Localidad El Chapote, Municipio de Etchojoa, en compañía del Superintendente de la Obra, se visitó el punto del Cárcamo de Bombeo, que a la fecha ya se encuentra terminada, con la instalación de transformador, bajadas eléctricas, acometida y centro de carga y control de mando dentro de caseta de operaciones, quedando solo pendiente la guía autorizada por CFE para la contratación e instalación de medidor, revisado que todo se encuentra de acuerdo a especificaciones, estando pagado lo que a la fecha ya se tiene instalado. Recabando archivo fotográfico y cuantificando un avance del 95% en general aproximadamente. Después nos trasladamos al Municipio de Álamos a Supervisión del contrato No. SEDESSON-FISE-2021-042, para la Obra: C-00085/0332 Construcción de Red de Agua Potable y Línea de Conducción en la Localidad de la Esperanza, Municipio de Álamos, en compañía del superintendente de la Obra se dio recorrido por la localidad, encontrando trabajos en proceso, realizando medición de los ml de red instalada, de línea de conducción y red de distribución, para una avance en general del 65% de la obra aproximadamente, se encontraban en reparación de retroexcavadora, pero se continuaba con la compactación de zanjas con material producto de excavación. Más tarde nos trasladamos a la Localidad de la Aduana para revisión de la Obra: C-00085/0328 Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de La Aduana, Municipio de Álamos, dando recorrido por la obra terminada y operando, revisando la línea a base de manguera poliducto de 2" de diámetro en su llegada a la localidad, dando recorrido rumbo a la sierra hacia el aguaje de alimentación, revisando la red, válvulas de expulsión de aire y cajas de protección a base de concreto de caja una de ellas, revisando solamente un 50% de la obra, por cuestiones de tiempo, medidas de acuerdo a plano de Obra y especificaciones del proyecto considerando un avance del 100% de la Obra. Se continuó con la revisión de la Obra: C-00085/0329 Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable La Cieneguita a Agua Caliente en la Cieneguita, Municipio de Álamos, dando recorrido por la obra en proceso, con la instalación de tubería de PVC de 3" de diámetro serie RD-26, levantando medición de 3523.00 ml de red y la instalación de 7 válvulas de expulsión y registro de concreto circulares de 1.00 mt de diámetro, considerando un avance del 74% de la Obra aproximadamente. Se continuó con la revisión de la Obra: C-00085/0331 Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Tetagiosa, Municipio de Álamos, donde esta obra se encuentra prácticamente terminada, ya que se revisó la longitud de la red de agua con manguera poliducto de 2" de diámetro, desde pozo de hasta el punto de llegada en pila de almacenamiento, cantidad de metros que corresponden a catálogo, faltando conexiones en ambos puntos de la red, con válvulas de expulsión de aire ya instaladas con registros de concreto, 5 piezas en total, considerando un avance en general del 95% de la obra aproximadamente. Después nos trasladamos al Norte del mismo Municipio de Álamos a Supervisión del contrato

INFORME DE COMISION

No. SEDESSON-FISE-2021-041, para la Obra: C-00085/0324 Construcción de Línea de Conducción del Sistema de agua Potable Casa Colorada – Techobampo en la Localidad de Techobampo, Municipio de Álamos, en compañía del superintendente de la Obra se dio recorrido por la localidad, encontrando trabajos en proceso, realizando medición de los ml de red instalada, de línea de conducción, para una avance en general del 95% de la obra aproximadamente, faltando punto de conexión en la Localidad de Techobampo y registro de válvulas de expulsión de concreto. Más tarde nos trasladamos a la Localidad de San Bernardo para revisión de la Obra: C-00085/0334 Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Bernardo, Municipio de Álamos, dando recorrido por la obra terminada, revisando la línea a base de manguera poliducto de 3" de diámetro en su llegada al equipo de bombeo y también pila de Almacenamiento, revisando la longitud de la red, medidas de acuerdo a plano de Obra y especificaciones del proyecto, faltando por colocar válvulas de expulsión de aire y cajas de protección a base de concreto, por lo que se considera un avance en general del 90% de la obra aproximadamente. Después se continuó con la revisión de la Obra: C-00085/0333 Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable en los Camotes – Yoricarichic en la Localidad de los Camotes, Municipio de Álamos, dando recorrido por la obra en proceso, con la instalación de tubería de PVC de 3" de diámetro serie RD-26, levantando medición de 1900.00 ml de red solamente, faltando la instalación de válvulas de expulsión y registro de concreto circulares, además de conexiones en pozo y llegada a pila de almacenamiento, considerando un avance del 50% de la Obra aproximadamente, por cuestiones en tiempo y lluvias no se continuó este día con la revisión junto con los contralores. Por último, me traslade a supervisar los avances de la Obra: C-00085/0331 Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Huicochic, Municipio de Álamos, donde esta obra se encuentra en proceso, se revisa la longitud de la red de agua con manguera poliducto de 2" de diámetro, se encuentran trabajando con excavaciones, colocación de tubería y rellenos compactados, con una medición de 580 ml en total, se aprecian trabajos de buena calidad de acuerdo a especificaciones de proyecto, considerando un avance en general del 40% de la obra aproximadamente.

Se anexa reporte fotográfico.

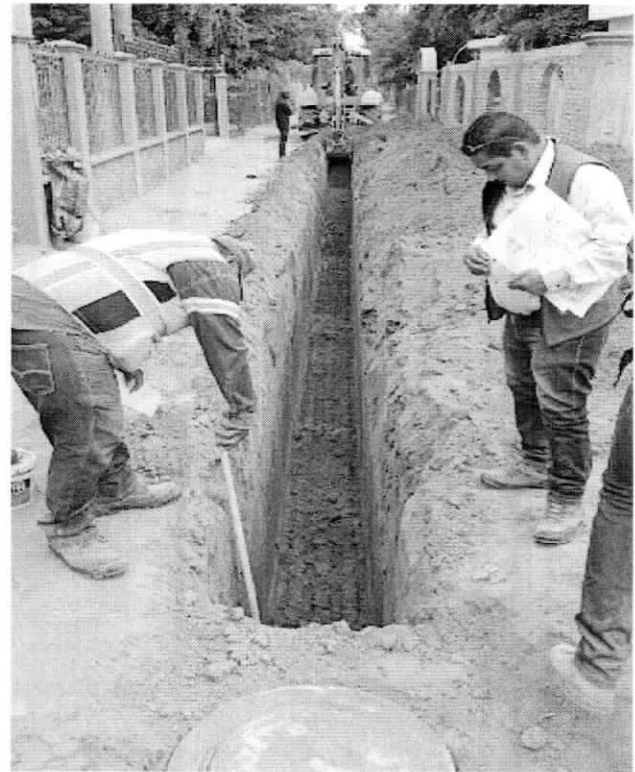
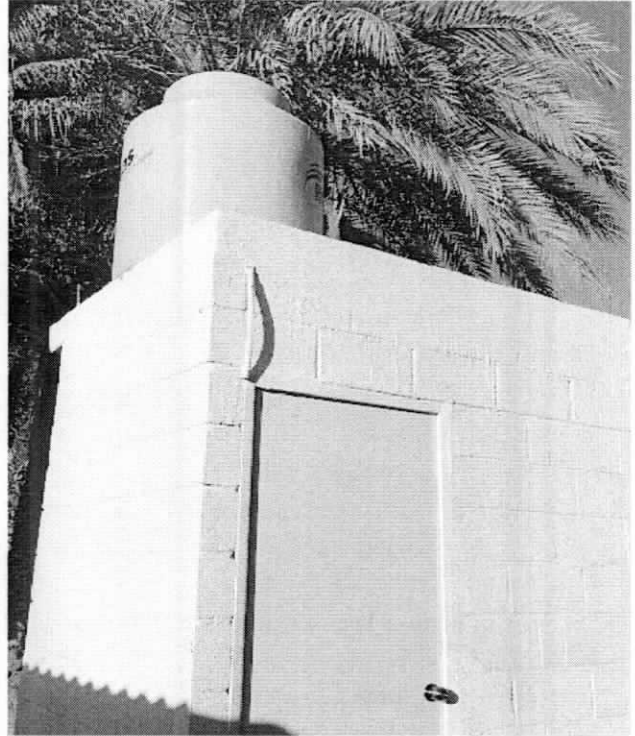
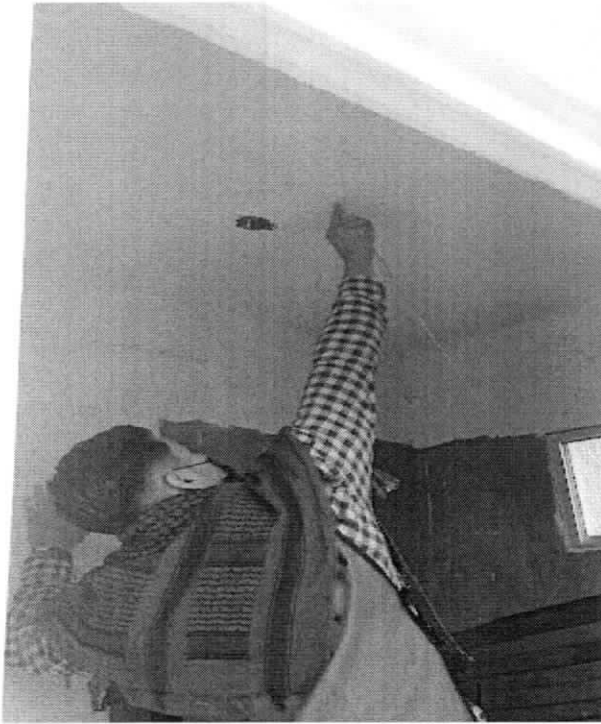
Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.



ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA

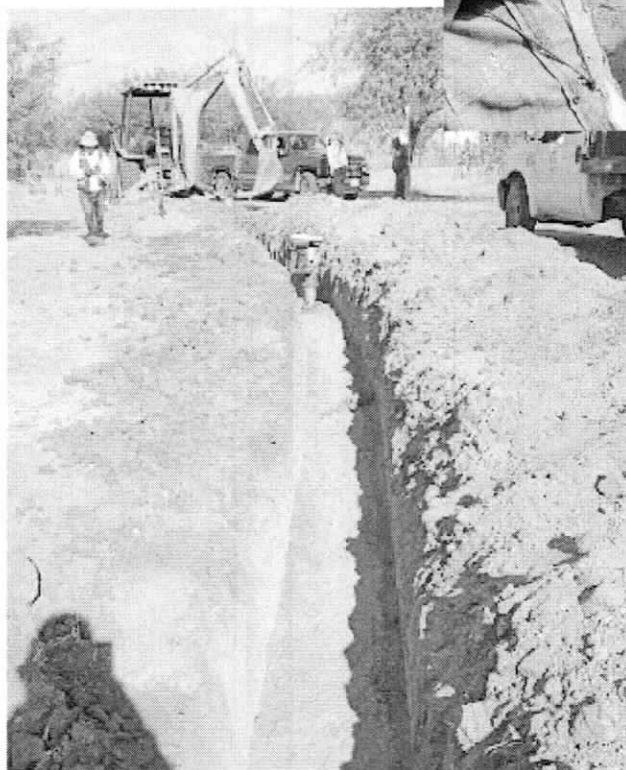
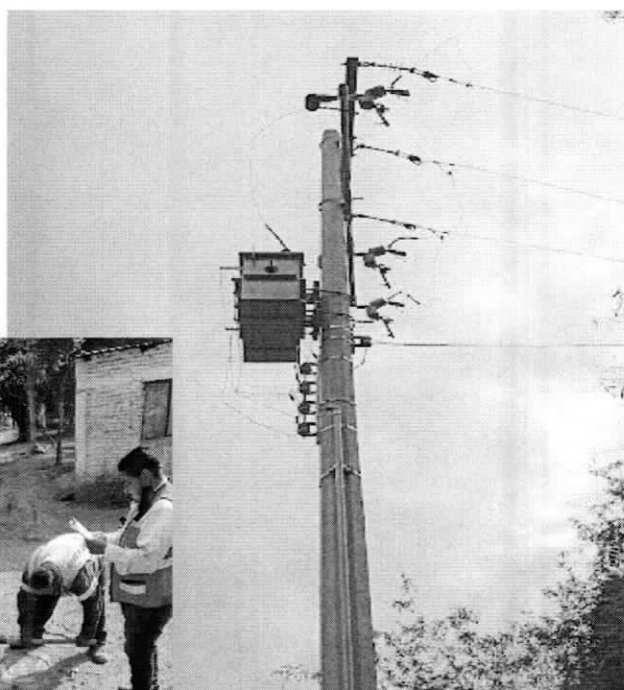
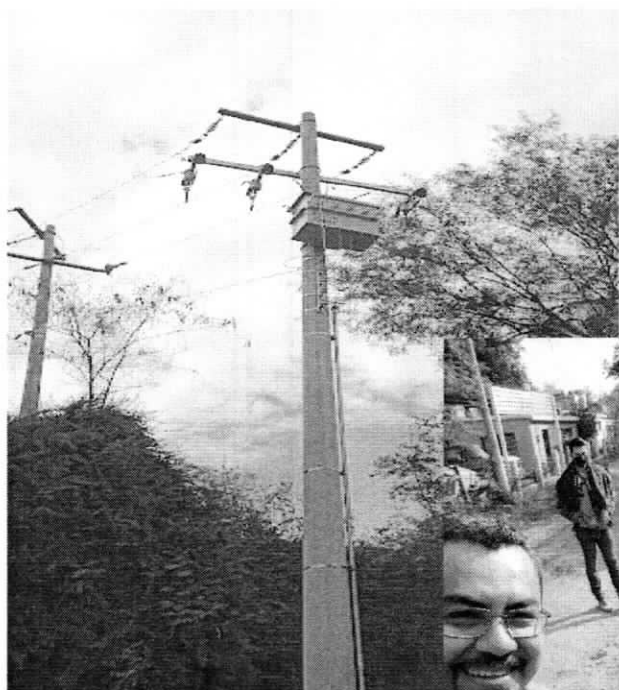
INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRÁFICO

*de*

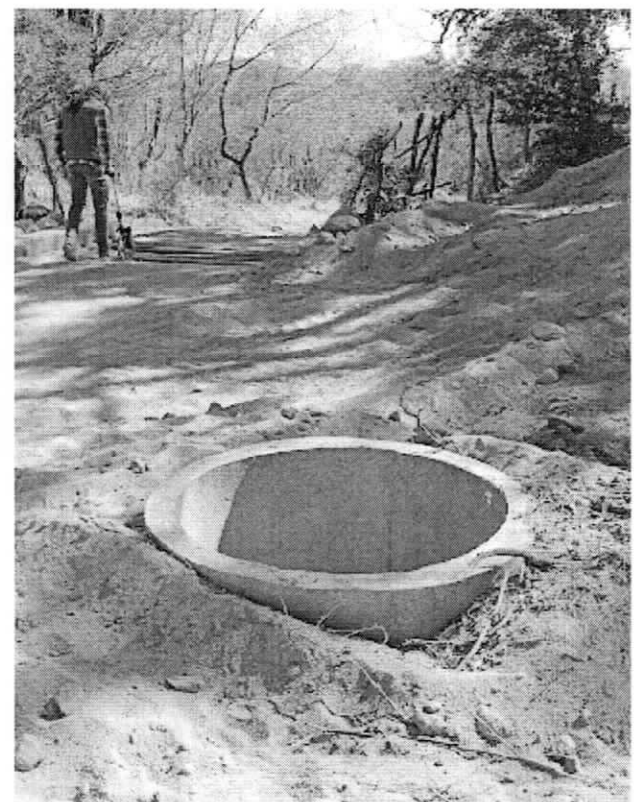
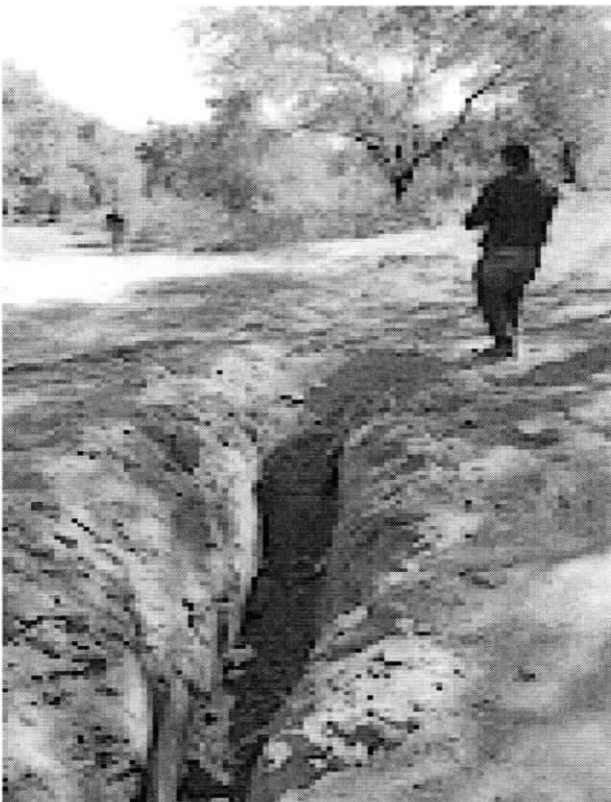
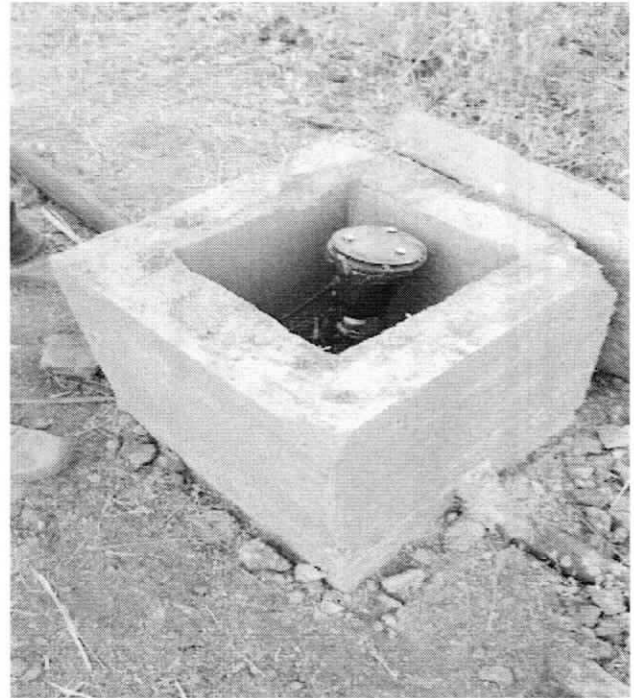

INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRÁFICO

*De*

INFORME DE COMISION

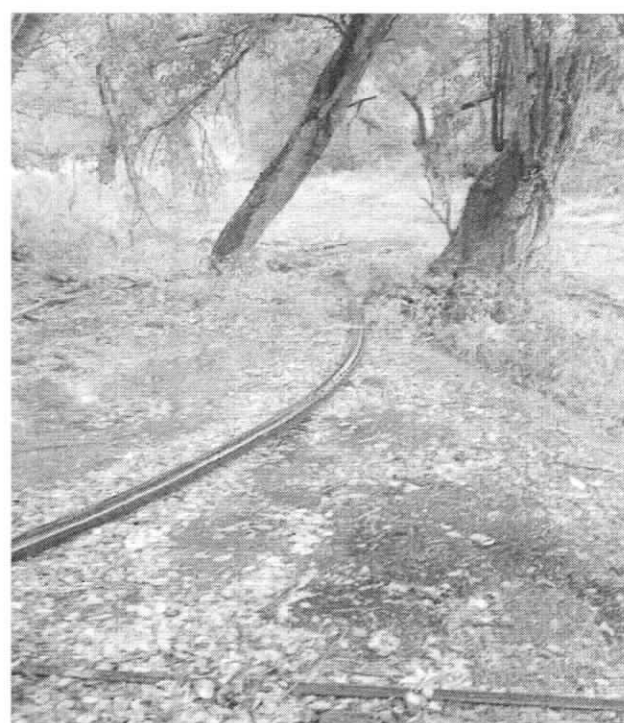
REPORTE FOTOGRAFICO



g

INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRÁFICO

*d*



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRAS EN CAMPO CON PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, ETCHOJOA Y BENITO JUÁREZ.

Se le comisiona a:

ÁLAMOS, BENITO JUÁREZ Y ETCHOJOA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 23 NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS UNIDOS	\$0.00
GASOLINA	\$3,950.00

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y RURAL
ÁLAMOS, SONORA

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRAS EN CAMPO CON PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, ETCHOJOA Y BENITO JUÁREZ.

Se le comisiona a:

ÁLAMOS, BENITO JUÁREZ Y ETCHOJOA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 23 **NOVIEMBRE** AL 27 **DE** NOVIEMBRE **DE** 2021

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$3,950.00



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y RURAL
ÁLAMOS, SONORA

ATENTAMENTE

Lic. Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

