


999-I

INFORME DE COMISION

Hermosillo Sonora, a 05 de Enero de 2022



ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 07 de Diciembre de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Supervisión de avances de Obras para autorización del pago de Estimación y Recabar Actas de Entrega Recepción en su caso de los Municipios Mencionados.

Lugar: Cajeme, Benito Juárez y Etchojoa, Sonora.

Periodo: del 09 al 11 de Diciembre de 2021.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó la visita a los Municipios antes mencionados, para llevar acabo la Supervisión de Avances de Obras, realizando las actividades que a continuación menciono:

(09 al 11 de Diciembre 2021).- Primeramente se realizó la supervisión del Contrato: SEDESSON-FISE-2021-036, con la Obra: C-00085/0326 Ampliación de Red de Agua Potable en la Localidad de Providencia; dando recorrido por varias calles de la localidad, para revisar los avances de la obra generados a la fecha, recabando información de los metros lineales de red instalados revisando los cruceros y conexiones a red existente, además de compactación de zanjas, acostillados con limo para un avance en general de la obra del 61% aproximadamente, con trabajos de buena calidad de acuerdo a las especificaciones de proyecto, recabando archivo fotográfico de los trabajos. Después se realizó la Supervisión del contrato SEDESSON-FISE-2021-024, con la Obra: C-00075/0660 Construcción de Cuarto Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Benito Juárez, dando recorrido por todos los Cuartos Dormitorios ubicados en las localidades de (Jecopaco, Villa Juárez y Paredón Colorado), encontrando trabajos de aplanados interiores y exteriores, impermeabilización de losas y colado de Losas de azotea en la localidad de Paredón colorado. Todos los trabajos se aprecian de buena calidad, de acuerdo a las especificaciones de proyecto, considerando un avance en general del 88% de la obra aproximadamente. Más tarde se continuó con la Supervisión del Contrato: SEDESSON-FISE-2021-048, con la Obra: C-00075/0668 Construcción de Baños con Descarga Domiciliaria en la localidad de Paredón Colorado, Municipio de Benito Juárez, dando recorrido por todos los módulos sanitarios ubicados en varias colonias de la localidad, encontrando todas las acciones prácticamente terminadas, con algunos detalles de fugas en tinacos y cespól de lavabos o flotador de WC, además de sellado con silicón en ventanas y puertas, pero se trabajan en las reparaciones correspondientes. También se observan algunas descargas pendientes de conectar mismas que el contratista notifica, por lo que se considera un avance en general de la obra del 97%

INFORME DE COMISION

de la obra aproximadamente. Después nos trasladamos al Municipio de Etchojoa para revisar el contrato: SEDESSON-FISE-2021-058, con la Obra: C-00077/0258 Ampliación de Red de Alcantarillado en Varias Calles de la colonia San Ángel en la Localidad de Bacobampo, Municipio de Etchojoa, dando recorrido por varias calles de la Obra terminada, cuantificando los metros de Red de atarjeas instalados, número de descargas domiciliarias, registros y pozos de visita, encontrado los trabajos de acuerdo a proyecto y a las especificaciones marcadas. Por lo que se considera una obra terminada al 100% de su ejecución, quedando pendiente la conexión de los beneficiarios, por lo que se autoriza el pago de estimación de cierre de contrato. Más tarde se continuó con el Contrato: SEDESSON-FISE-2021-044, con la Obra: C-00077/0253 Ampliación de la Red de Alcantarillado en la Localidad de San Pedro Nuevo, Municipio de Etchojoa, dando recorrido por las calles del proyecto, encontrando ya instalados los metros de red de atarjeas cuantificando la instalación de 807.00 ml, 7 pozos de visita de profundidades variables terminados con su brocal de policoncreto, además de 46 descargas domiciliarias y con la fabricación de 31 registros de banquetta terminados a la fecha, por lo que se considera un avance en general del 94% de la obra aproximadamente, todo los trabajos de acuerdo a las especificaciones de proyecto y de buena calidad.
Se anexa reporte fotográfico.

Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.





ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA

INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRÁFICO



- Ampliación de Red de Agua Potable en Providencia, Cajeme

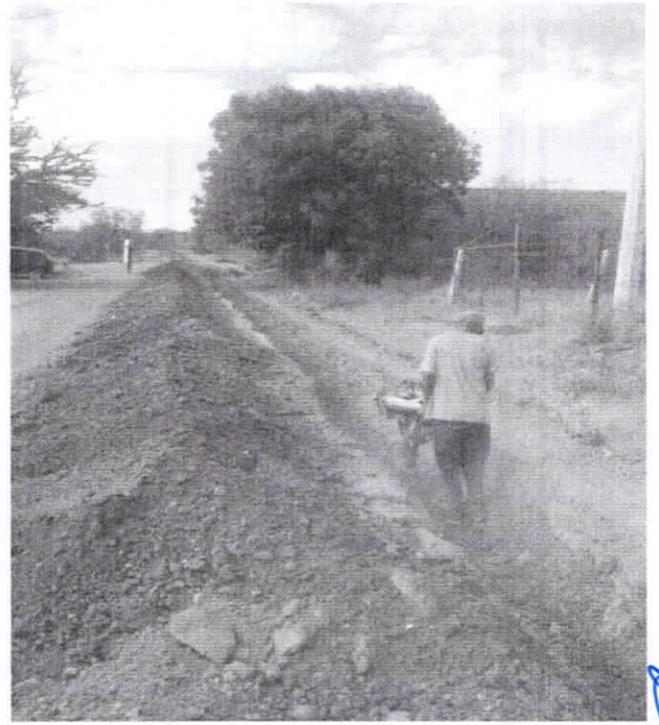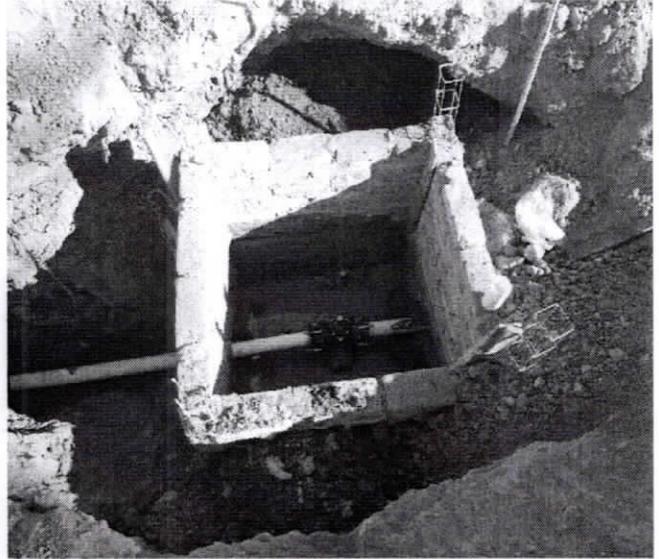

INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRÁFICO

- Cuartos Dormitorio en Varias Localidades de Benito Juárez

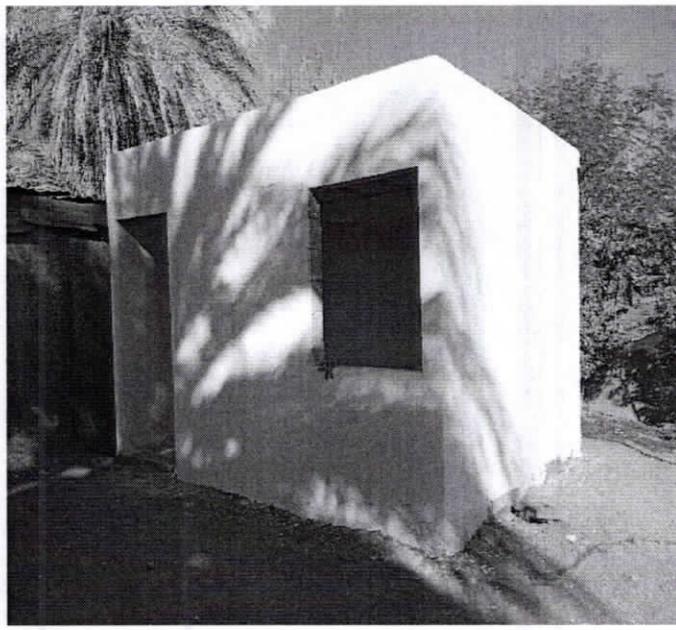
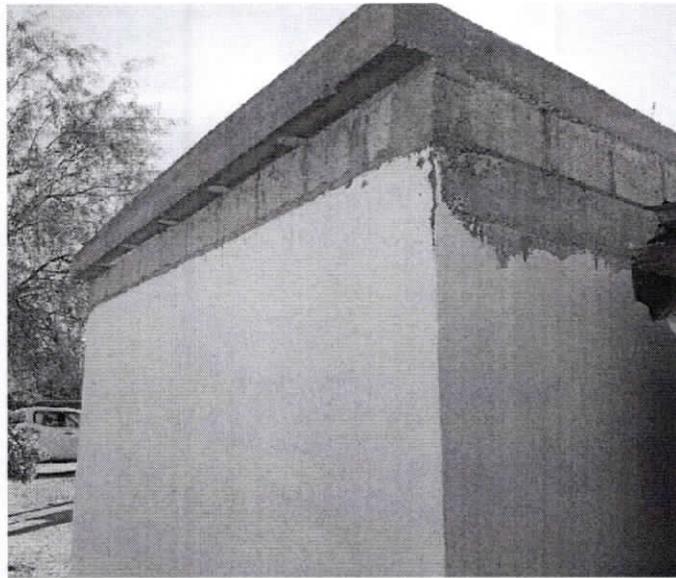


A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.

INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRÁFICO

- Baños con Descarga Domiciliaria en la Localidad Paredón Colorado, Benito Juárez


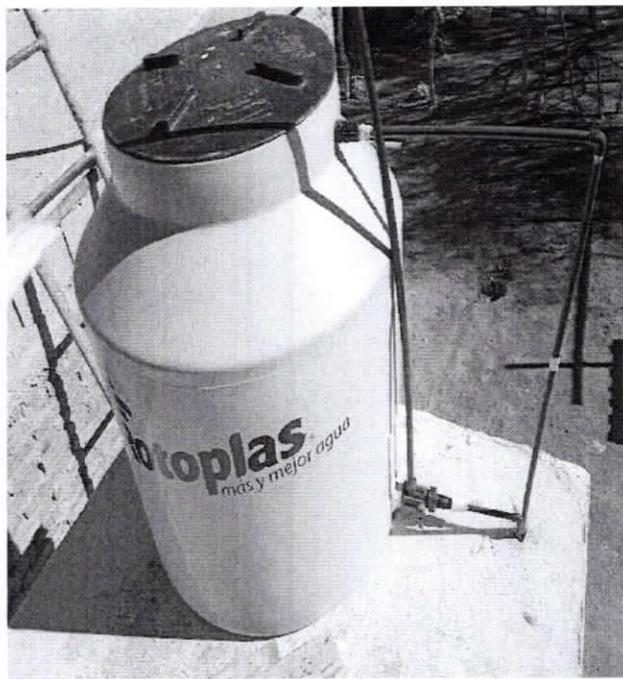
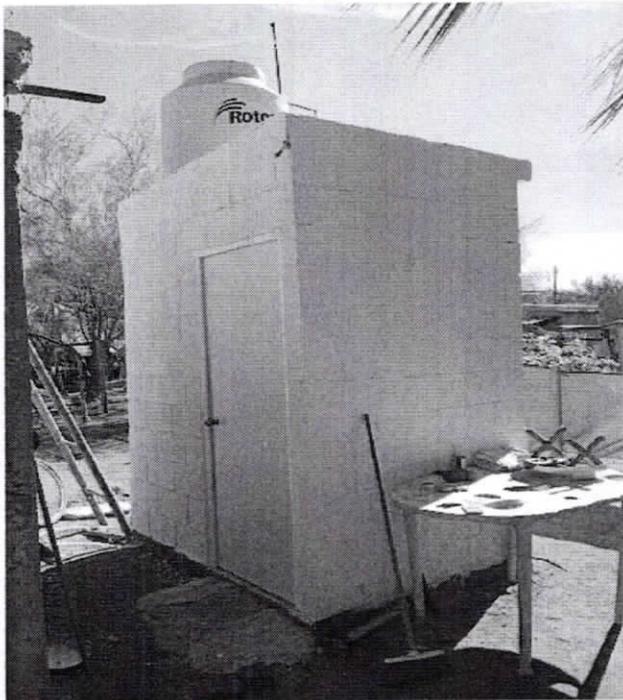


A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRÁFICO

- Ampliación Red de Alcantarillado en Col. San Angel, Localidad Bacobampo, Etchojoa

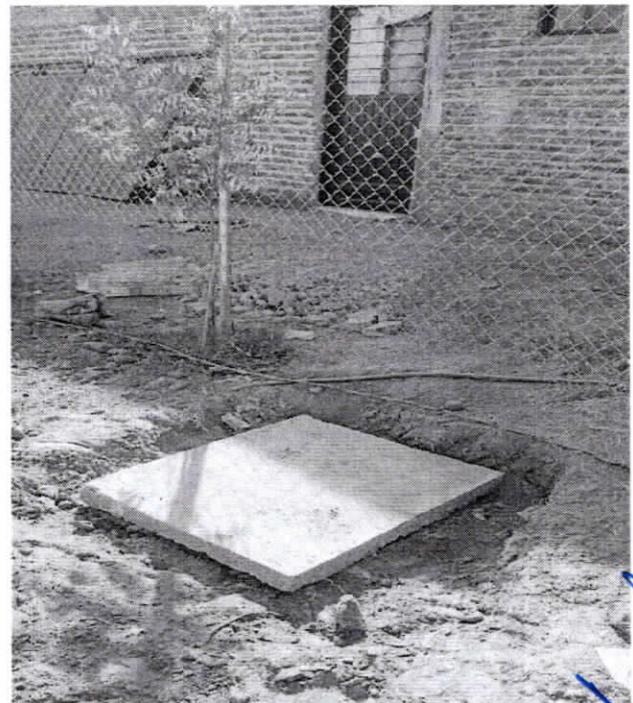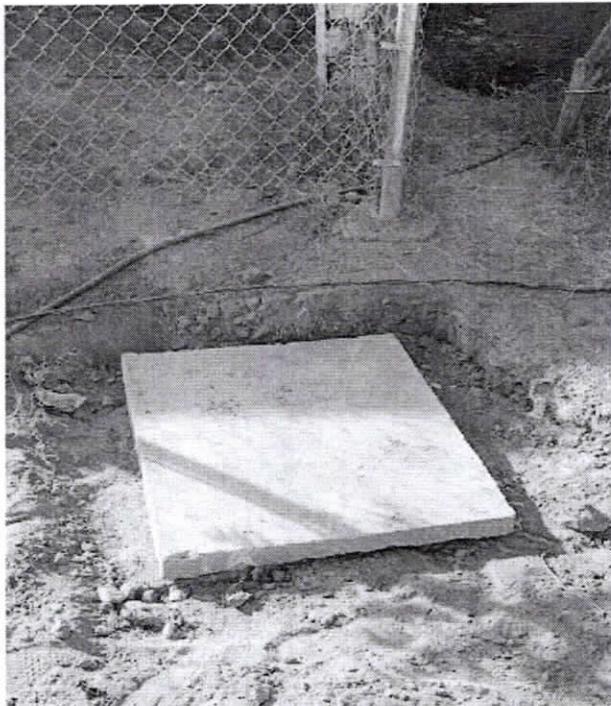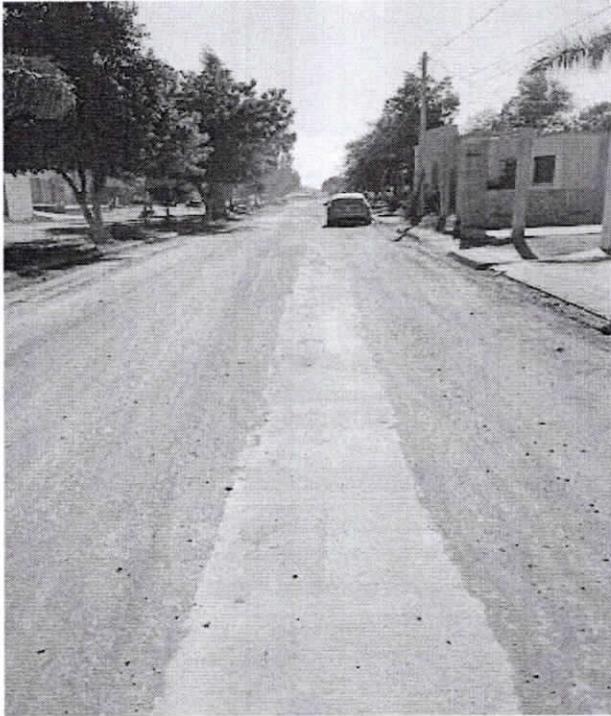

INFORME DE COMISION

REPORTE FOTOGRÁFICO

- Ampliación de la Red de Alcantarillado en la Localidad de San Pedro Nuevo, Etchojoa



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname.

999-I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA



Hermosillo, Sonora, 07 DE DICIEMBRE DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE AVANCES DE OBRAS PARA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE ESTIMACIONES Y RECABAR ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN EN SU CASO DE LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS.

Se le comisiona a:

MUNICIPIOS: CAJEME, BENITO JUÁREZ Y ETCHOJOA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 09 DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$2,300.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

