



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

1082-I

Hermosillo, Sonora a 06 de julio de 2022

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
PRESENTE. –

En atención al aviso de comisión con fecha del 22 de junio de 2022, con ruta de traslado del 28 de junio al 01 de julio de 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión de obras en proceso y verificación de obras terminadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022, asesorar a los municipios en la captura de sus proyectos en la MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social) y recabar evidencia fotográfica.

LUGAR DE COMISIÓN: Municipios de General Plutarco Elías Calles, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.

General Plutarco Elías Calles

En éste Municipio me recibió el C. Juan Fernando Andrade Mora, Encargado de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio. Comentamos sobre la Capacitación sobre el tema de CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica), que personal de ésta Coordinación Estatal del FAIS, impartirá en fecha próxima en la Cd. de Hermosillo, Sonora. También comenté con él la habilitación del apartado de Cédulas de verificación en la MIDS y le mencioné que ya pueden ir ingresando las cédulas de verificación de sus proyectos. Posteriormente el C. Juan Fernando Andrade Mora y el Lic. Cosme Josué Sidón González, Director de Comunicación Social, me acompañaron a hacer un recorrido de supervisión y verificación, por las obras que tienen capturadas en la MIDS. Antes de salir al recorrido, nos encontramos con el C. Juan Sánchez, Secretario particular del presidente Municipal, comentamos la posibilidad de acompañamiento de seguridad al Ejido Valdez, para verificar una obra de Raspado de caminos que no se pudo visitar en la comisión anterior, por cuestión de la inseguridad. Acordamos en reunirnos a las 10:40 am en las oficinas del DIF, para ver si podíamos unirnos a una comitiva que saldría a las 11:00 am a un evento social del DIF en dicho ejido.

Las obras que visitamos fueron las siguientes:

ID 70801 Mantenimiento de caminos vecinales del Valle, monto planeado a invertir \$273,152.16, fecha de inicio de ejecución: 14 de marzo de 2022, fecha de fin de ejecución: 03 de abril de 2022, porcentaje de avance de la obra: **No se pudo ir verificar la obra por cuestión de la inseguridad que existe en el Municipio de General Plutarco Elías Calles.**

ID 71475 Construcción de techos firmes en Ej. Hombres blancos a nombre de Francisca Hocker y Marielena Villanueva, monto planeado a invertir: \$24,610.53, fecha de inicio de ejecución: 14/03/2022, fecha de fin de ejecución: 14/04/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 75318 Construcción de techos firmes en varias ubicaciones del Ejido Pápago, monto planeado a invertir: \$127,403.63, fecha de inicio de ejecución: 14/03/2022, fecha de fin de ejecución: 03/04/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ID 76657 Construcción de techo en Ej. Morelia en la localidad del Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, monto planeado a invertir: \$27,707.94, fecha de inicio de ejecución: 14/03/2022, fecha de fin de ejecución: 14/04/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 76710 Construcción de techo en el Ej. Desierto de Sonora localidad de Sonoyta. Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, monto planeado a invertir: \$6,528.34, fecha de inicio de ejecución: 14/03/2022, fecha de fin de ejecución: 14/04/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 76749 Mejoramiento de vivienda Guadalupe Balderrama, monto planeado a invertir \$29,077.30, fecha de inicio de ejecución: 14/03/2022, fecha de fin de ejecución: 03/04/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 80906 Construcción de 4 cuartos dormitorios en varias colonias del Municipio Gral. Plutarco Elías Calles. A nombre de Lucero Corona Braulio Balderrama Kismeth Cortez y Crystal, monto planeado a invertir \$489,514.12, fecha de inicio de ejecución: 14/03/2022, fecha de fin de ejecución, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 81863 Construcción de 4 cuartos para baño con nombre de Lucero Corona, Braulio Balderrama, Kismeth Cortez y Crystal, monto planeado a invertir: \$149,837.29, fecha de inicio de ejecución: 14/03/2022, fecha de fin de ejecución: 03/04/2022, porcentaje de avance de la obra: 95%.

ID 84767 Construcción de 3 techos firmes en varias localidades del Mpio. Gral. Plutarco Elías Calles. Presa 2 y Callejón Los Carrizos, monto planeado a invertir: \$79,574.13, fecha de inicio de ejecución: 14/03/2022, fecha de fin de ejecución: 14/04/2022, porcentaje de avance de la obra: 67%, en uno de los domicilios, no estaba el beneficiario (Sra. Yesenia Villalobos) y los perros no permitieron la verificación de la obra.

ID 94869 Piso del Sr. Epifanio Ramirez localizado en el Ej. Papagos, monto planeado a invertir: \$7,381.23, fecha de inicio de ejecución: 14/03/2022, fecha de fin de ejecución: 03/04/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

A la hora acordada fuimos a las oficinas del DIF para reunirnos con el C. Juan Sánchez, nos comentó que la salida de la comitiva al evento en el ejido Valdez, se pospuso hasta las 2:00 pm. No pudimos unirnos a la comitiva, por lo que quedó pendiente la verificación de la obra en el Ejido Valdez.








SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

Evidencia fotográfica (General Plutarco Elías Calles)

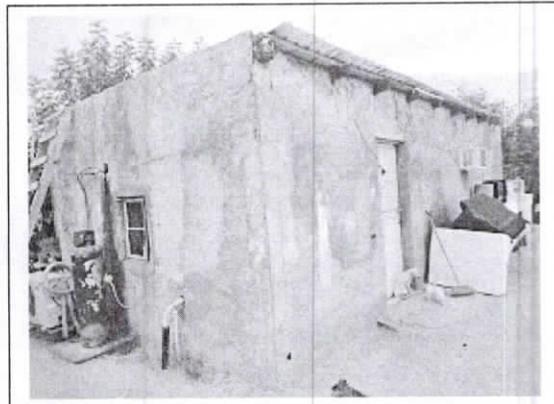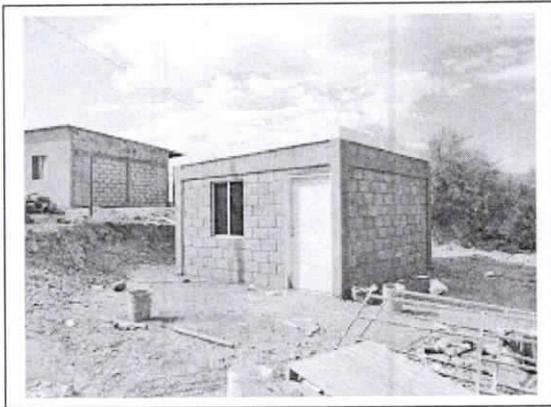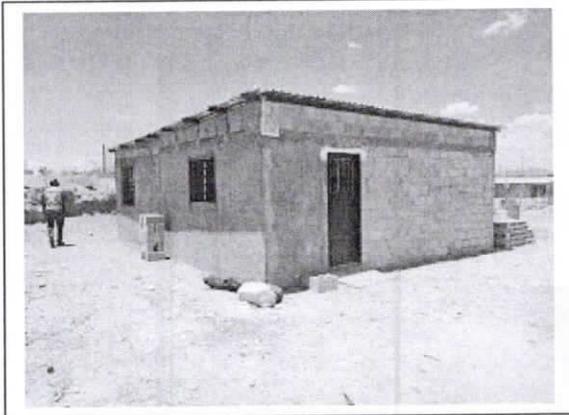

SAN LUIS RÍO COLORADO

En éste Municipio, me recibió el Ing. Germán de los Reyes Aceves, Coordinador Administrativo de Obras y Servicios Públicos y encargado de capturar la información en la MIDS. Comentamos sobre la Capacitación sobre el tema de CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica), que personal de ésta Coordinación Estatal del FAIS, impartirá en fecha próxima en la Cd. de Hermosillo, Sonora. Así mismo le comenté que ya se habilitó el apartado de Cédulas de verificación en la MIDS y que ya podían empezar a ingresar las cédulas de sus proyectos. El Ing. Germán de los Reyes me informo de las obras que planea ejecutar con recursos del FAIS y que próximamente capturarán en la MIDS. Posteriormente, el Ing. Germán de los Reyes y yo nos dirigimos a hacer





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

Gobierno
de SONORA

un recorrido de supervisión y verificación, por las obras que ya están capturadas en la MIDS. Las obras que se verificaron se indican en la siguiente relación:

ID 99302 Construcción de drenaje pluvial en diversos puntos de la ciudad Proyecto 1, monto planeado a invertir: \$670,334.61, fecha de inicio de ejecución: 28/04/2022, fecha de fin de ejecución: 26/06/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.



ID 99435 Construcción de drenaje pluvial en diversos puntos de la ciudad 3, monto planeado a invertir: \$383,048.35, fecha de inicio de ejecución: 28/04/2022, fecha de fin de ejecución: 26/06/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 99501 Construcción de drenaje pluvial en diversos puntos de la ciudad 4, monto planeado a invertir: \$670,334.61, fecha de inicio de ejecución: 28/04/2022, fecha de fin de ejecución: 26/06/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 99529 Construcción de drenaje pluvial en diversos puntos de la ciudad Proyecto 5, monto planeado a invertir: \$191,524.18, fecha de inicio de ejecución: 28/04/2022, fecha de fin de ejecución: 26/06/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 99578 Construcción de drenaje pluvial en diversos puntos de la ciudad Proyecto 6, monto planeado a invertir: \$95,762.09, fecha de inicio de ejecución: 28/04/2022, fecha de fin de ejecución: 26/06/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.


Evidencia fotográfica (San Luis Río Colorado)

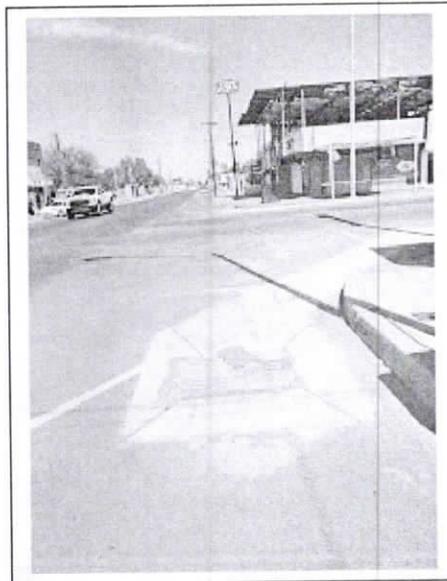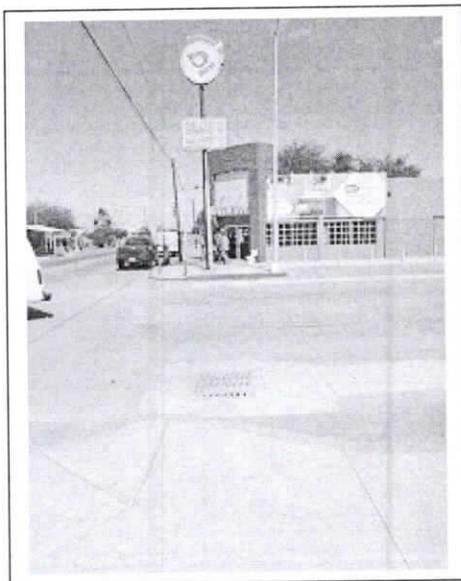



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

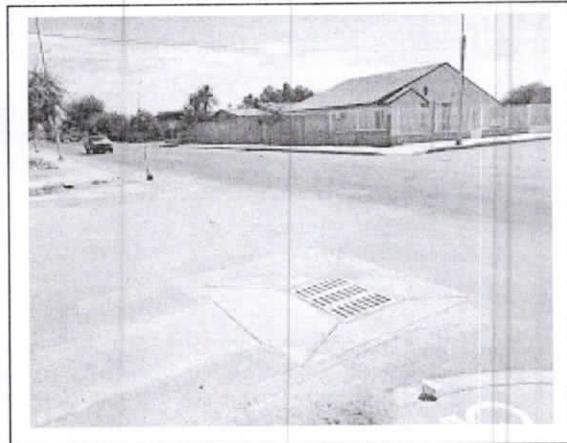

PUERTO PEÑASCO

En la Ciudad de Puerto Peñasco, me recibió la Ing. Guadalupe Barrera Acuña, Supervisor de Obra y encargada de capturar la información en la plataforma MIDS. Comentamos sobre la Capacitación sobre el tema de CUIS (Cuestionario Único de Información Socioeconómica), que personal de ésta Coordinación Estatal del FAIS, impartirá en fecha próxima en la Cd. de Hermosillo, Sonora. Así mismo le comenté que ya se habilitó el apartado de Cédulas de verificación en la MIDS y que ya podían empezar a ingresar las cédulas de sus proyectos. Me comentó que ya recibieron los usuarios y contraseñas para captura de CUIS, por parte de la DGDR de la Secretaría de Bienestar. Posteriormente me pasó con el Ing. José Luis Montijo Torres, Director de Obras Públicas Municipal. Con él también comenté sobre la Capacitación sobre el tema de CUIS en Hermosillo, y también comentamos sobre la habilitación del apartado de cédulas de verificación en la MIDS. Posteriormente le dio indicaciones a los Ingenieros Daniel Salazar y Alberto Casillas, Supervisores de Obra, para que me acompañaran a hacer un recorrido para verificar las obras que están ingresadas en la MIDS.

Las obras que se visitaron son las siguientes:

ID 587 Ampliación de red de energía eléctrica por calle Cacatua entre Ave Brisas del Mar y Ave Constitución Colonia Brisas del Mar en la localidad de Puerto Peñasco Mpio de Puerto Peñasco, monto planeado a invertir \$334,403.73, fecha de inicio de ejecución: 11/02/2022, fecha de fin de ejecución: 22/03/2022, porcentaje de avance de la obra: 85%, falta instalar un poste por parte de CFE y energizar la red.

ID 1013 Construcción de Cancha Cívica en Escuela Secundaria Veintiuno ubicada en Ave Sesenta y Cuatro entre calle Río Santiago y calle Río Asunción Colonia San Rafael en la localidad de Puerto Peñasco Mpio de Puerto Peñasco Sonora, monto planeado a invertir: \$965,063.52, fecha de inicio de ejecución: 15/02/2022, fecha de fin de ejecución: 31/03/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 59376 Construcción de Cancha Multifuncional en Jardín de niños Enriqueta Montijo ubicado en Ave Guillermo Prieto entre calle Nogales y calle Sonoyta Colonia Nueva Esperanza en la localidad de Puerto Peñasco Municipio de Puerto Peñasco, monto planeado a invertir: \$791,800.92, fecha de inicio de ejecución: 28/04/2022, fecha de fin de ejecución: 06/06/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.








SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

ID 60690 Ampliación de red de drenaje en calle Independencia entre Ave Constitución y Derecho de Vía Colonia La Herradura en la localidad de Puerto Peñasco Municipio de Puerto Peñasco, monto planeado a invertir: \$272,481.66, fecha de inicio de ejecución: 28/04/2022, fecha de fin de ejecución: 06/06/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.


Evidencia fotográfica (Puerto Peñasco)

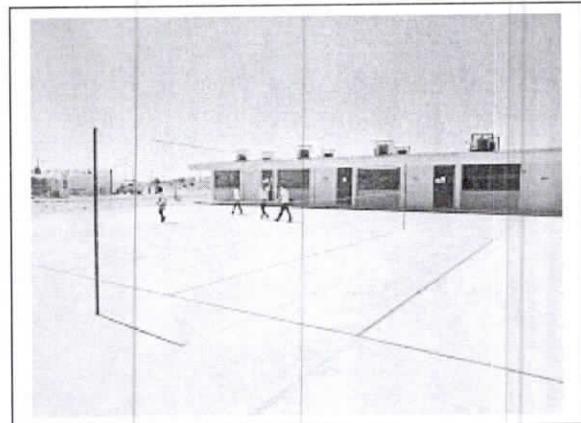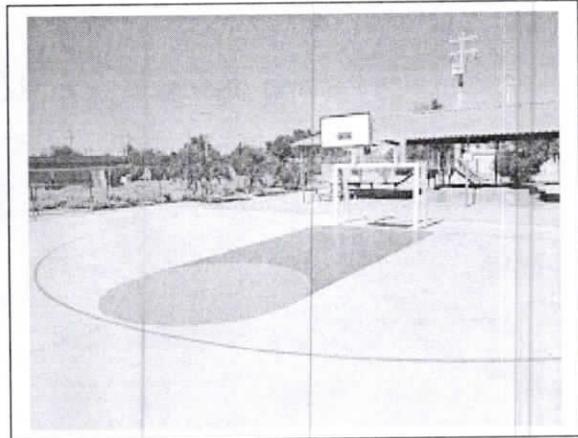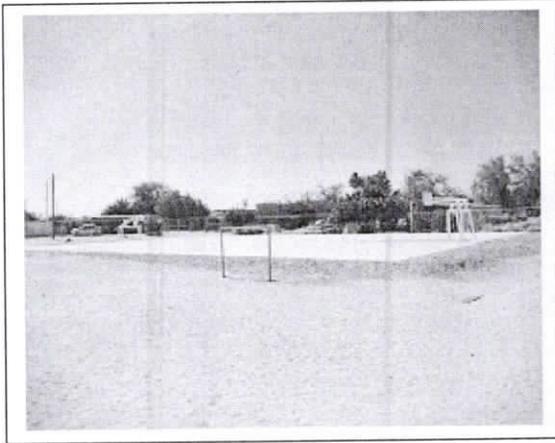



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

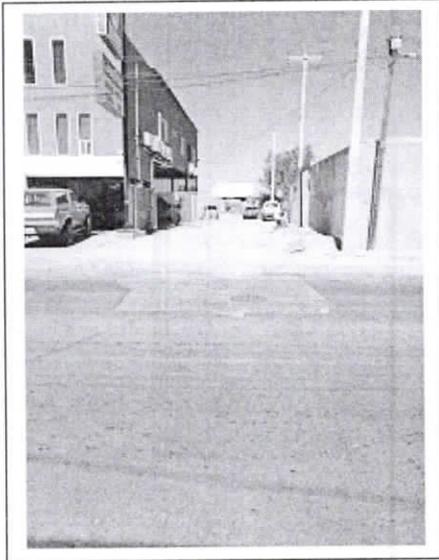

Seguidamente, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.

Nota aclaratoria: El vehículo originalmente asignado era el número 108, marca NISSAN modelo 2017 placas VD-64-443 Tipo Pickup NP 300, el cuál de última hora fué asignado a otra persona. Por lo que a mí me asignaron el vehículo número 107 marca NISSAN modelo 2017 placas VD-64-444 Tipo Pickup NP 300. Cabe mencionar que en la información de éste vehículo, por un error involuntario, se le puso placas VD-64-445.

ATENTAMENTE.-

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS**

Hermosillo, Sonora, 22 DE JUNIO DEL 2022

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISAR OBRAS EN PROCESO, VERIFICAR PROYECTOS QUE YA ESTAN TERMINADOS, ASESORAR Y SOLVENTAR DUDAS.

Se le comisiona a:

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO Y PUERTO PEÑASCO, SONORA

Durante el (los) día (s) 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	240 LTS.
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



C.p. Archivo
C.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.p. Interesado



XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PENASCO, SONORA
2021 - 2024
**DIRECCION DE OBRA PUBLICA
Y DE SARROLLO URBANO**



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Sonoyta, Sonora**



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 22 de junio del 2022

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
P R E S E N T E . -

Con el propósito de :

SUPERVISAR OBRAS EN PROCESO, VERIFICAR PROYECTOS QUE YA ESTAN TERMINADOS, ASESORAR Y SOLVENTAR DUDAS.

Se le comisiona a:

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO Y PUERTO PEÑASCO, SONORA

Durante el (los) día (s) 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2022

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Placas VD-64-443

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	240 LTS.
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE


LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
