

SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

1670-I

Hermosillo, Sonora a 08 de septiembre de 2022

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

En atención al aviso de comisión con fecha del 23 de agosto de 2022, con ruta de traslado del 29 de agosto al 02 de septiembre de 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Comisión para dar seguimiento a la supervisión y verificación de las obras realizadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022; asesorar a los municipios en la captura de sus proyectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS); Reiterar la importancia de la planeación oportuna de acuerdo al calendario de fechas importantes, de la captura de los reportes de anexos de participación social y de la captura de las cédulas de verificación de obras; tomar evidencia fotográfica de las obras.

LUGAR DE COMISIÓN: Municipios de Moctezuma, Cumpas, Nacoziari, Fronteras y Agua Prieta, Sonora.

MOCTEZUMA

En la localidad de Moctezuma me recibió el Ing. Jorge Luis Ruelas Yanez, Director de Obras Públicas del Municipio de Moctezuma. Me presenté como su asesor interino de FAIS y me puse a la orden y disposición para ayudarles a resolver dudas y problemas de captura en la MIDS y en temas relacionados con el FAIS. Le recordé que la fecha límite para capturar proyectos en la MIDS ya está próxima, es el 4 de septiembre, para que tomen sus previsiones para hacer la Planeación de sus proyectos oportunamente, conforme al calendario de actividades del FAIS 2022. Así mismo mencioné la importancia de la conformación de los comités de obra, de la captura de los anexos de participación social y de la captura de las cédulas de verificación de obra, en la MIDS. De la misma manera comenté con el Ingeniero Jorge Luis Ruelas lo importante que es solventar las observaciones que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) hizo a sus proyectos en la MIDS. Igualmente le hice mención que los proyectos capturados en la MIDS no serán informados a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), mientras los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUI) no hayan sido asociados a dichos proyectos, en la MIDS. Después lo asesoré para hacer unas correcciones, en la MIDS, a cierta información de los proyectos. Posteriormente el Ingeniero Ruelas me acompañó a hacer un recorrido por las obras que tienen capturadas en la MIDS. Las obras son las siguientes:

ID 35913 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, SONORA. Monto planeado en la MIDS: \$ 79,121.80, el proyecto consta de 12 viviendas a beneficiar, se recorrieron 2 por cuestión de tiempo, las cuales presentan un porcentaje de avance del 100%.

ID 37241 REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA. Monto planeado en la MIDS: \$ 517,159.90, el proyecto consta de 46 viviendas a beneficiar, se recorrieron 2 por cuestión de tiempo, las cuales presentan un porcentaje de avance del 100%.

ID 39115 CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA. Monto planeado en la MIDS: \$ 89,240.40, el proyecto consta de 6 viviendas a beneficiar, se recorrieron 2 por cuestión de tiempo, las cuales presentan un porcentaje de avance del 100%.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIDO
08 SEP 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ID 135290 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA TERCERA ENTRE BOULEVARD REFORMA Y CALLE 24 DE FEBRERO MOCTEZUMA, SONORA. Monto planeado en la MIDS: \$ 125,522.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 174846 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIMERA COLONIA CODORACHI. Monto planeado en la MIDS: \$ 230,323.00, porcentaje de avance de la obra: 100%.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

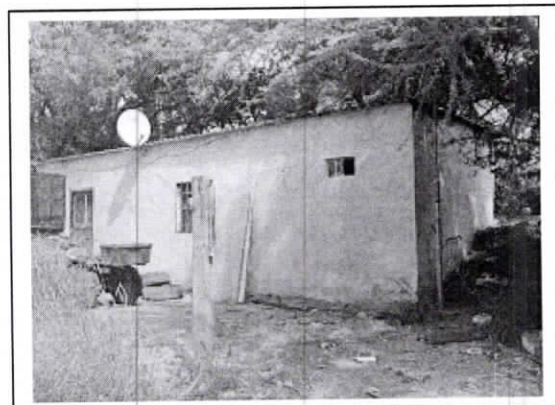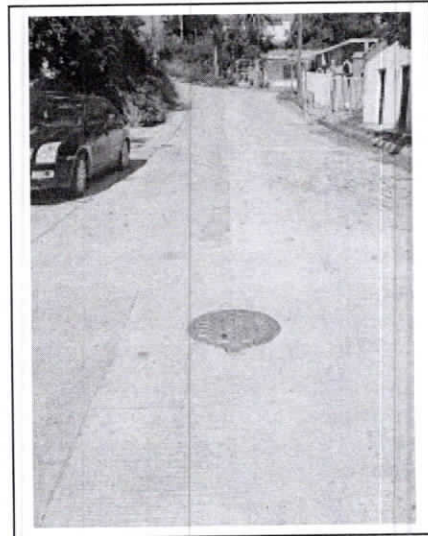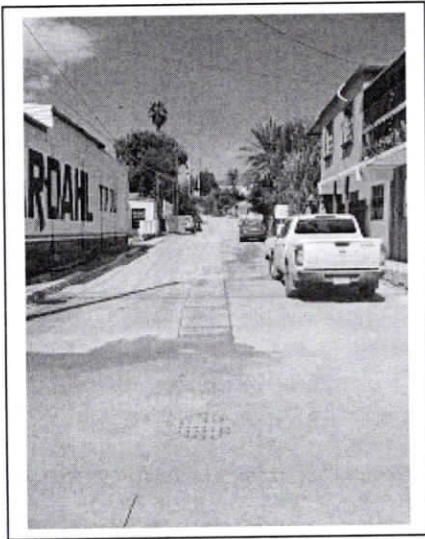

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

CUMPAS

En éste Municipio me recibió y atendió la Arquitecta Alondra Zamarrón Durazo, Directora de Obras Públicas del Municipio. Me presenté como su asesor interino de FAIS y me puse a la orden y disposición para ayudarlos a resolver dudas y problemas de captura en la MIDS y en temas relacionados con el FAIS. Le recordé que la fecha límite para capturar proyectos en la MIDS ya está próxima, es el 4 de septiembre, para que tomen sus previsiones para hacer la Planeación de sus proyectos oportunamente, conforme al calendario de actividades del FAIS 2022. Así mismo mencioné la importancia de la conformación de los comités de obra, de la captura de los anexos de participación social y de la captura de las cédulas de verificación de obra, en la MIDS. De la misma manera comenté con la Arq. Alondra Zamarrón Durazo lo importante que es solventar las observaciones que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) hizo a sus proyectos en la MIDS. Igualmente le hice mención que los proyectos capturados en la MIDS no serán informados a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), mientras los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIIS) no hayan sido asociados a dichos proyectos, en la MIDS. Después lo asesoré para hacer unas correcciones, en la MIDS, a cierta información de los proyectos. Posteriormente la Arq. Alondra Zamarrón me acompañó a hacer un recorrido por las obras que tienen ingresadas en la MIDS. Las obras visitadas fueron las siguientes:

ID 137086 CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA, CUMPAS, SONORA. Monto planeado en la MIDS: \$ 2,980.01, porcentaje de avance de la obra: 100%.



ID 137670 REHAB RED DRENAJE EN AV PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE TRES Y CUATRO EN CUMPAS. Monto planeado en la MIDS: \$ 21,061.54, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 140142 REHABILITACIÓN RED DRENAJE EN AVENIDA MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE UNO Y DOS EN CUMPAS. Monto planeado en la MIDS: \$ 112,855.45, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 141510 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AV CLUB DE LEONES Y AV BENITO JUAREZ EN CUMPAS, MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA. Monto planeado en la MIDS: \$ 121,673.03, porcentaje de avance de la obra: 75% falta construir el pozo de visita y reponer el pavimento de concreto.

ID 148485 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE NUEVE ENTRE AVENIDA ZAPATA Y AVENIDA H EN CUMPAS. Monto planeado en la MIDS: \$ 90,009.39, porcentaje de avance de la obra: 100%.


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

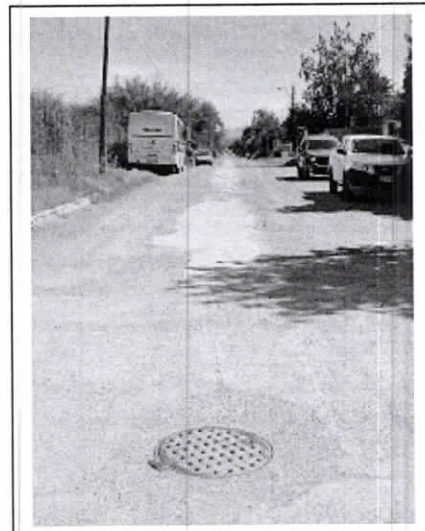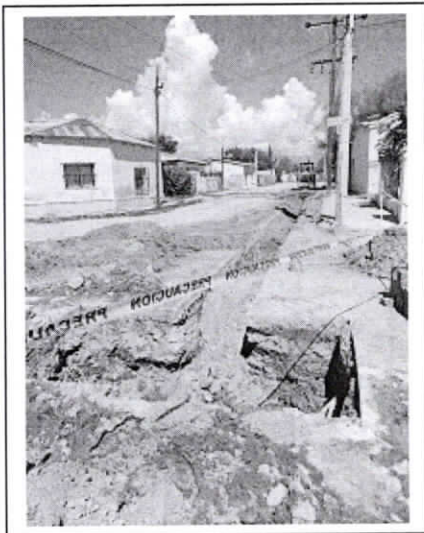



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

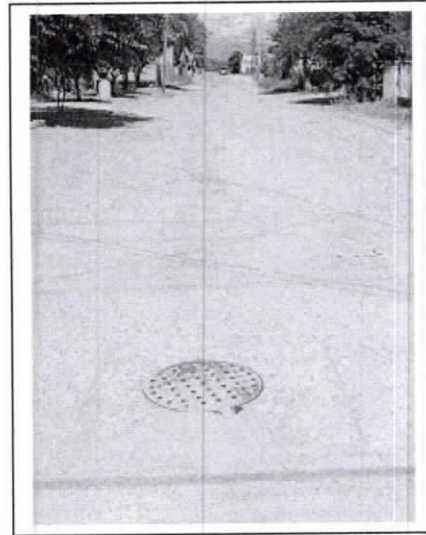

NACOZARI

En ésta localidad me recibieron la Ingeniera Dámaris García Navarro, Directora de Desarrollo Social del Municipio de Nacozari y el Ingeniero Cesar Francisco de la Ree Dávila. Me presenté como su asesor interino de FAIS y me puse a la orden y disposición para ayudarlos a resolver dudas y problemas de captura en la MIDS y en temas relacionados con el FAIS. Les recordé que la fecha límite para capturar proyectos en la MIDS ya está próxima, es el 4 de septiembre, para que tomen sus previsiones para hacer la Planeación de sus proyectos oportunamente, conforme al calendario de actividades del FAIS 2022. Así mismo mencioné la importancia de la conformación de los comités de obra, de la captura de los anexos de participación social y de las cédulas de verificación de obra, en la MIDS. De la misma manera comenté con los mencionados funcionarios lo importante que es solventar las observaciones que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) hizo a sus proyectos en la MIDS. Igualmente les hice mención que los proyectos capturados en la MIDS no serán informados a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), mientras los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) no hayan sido asociados a dichos proyectos, en la MIDS. Después estuve asesorando a la Ingeniera Dámaris García, quien es la que captura los proyectos en la MIDS, para hacer unas correcciones a cierta información de dichos proyectos, en dicha plataforma. Posteriormente la Ing. Dámaris García y el Ing. Cesar de la Ree, me acompañaron a hacer un recorrido por las obras que tienen ingresadas en la MIDS. Las obras visitadas fueron las siguientes:

ID 52862 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN NACOZARI DE GARCÍA EN LA COLONIA COLOSIO CERRO DE LA VIRGEN. Monto planeado en la MIDS: \$ 130,661.53, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 60786 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA COLOSIO. Monto planeado \$ 48,595.46, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 69330 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JESUS GARCIA. Monto planeado \$130,661.53, porcentaje de avance de la obra: 100%.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ID 69441 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA JESUS GARCIA. Monto planeado: \$48,595.46, porcentaje de avance de la obra: 100%.



ID 123301 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRACCIONAMIENTO DEL RIO. Monto planeado \$79,688.90, porcentaje de avance de la obra: 75%, faltan puerta, ventana y techumbre de lámina galvanizada.

ID 123677 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN FRACCIONAMIENTO DEL RIO. Monto planeado \$32,762.95, porcentaje de avance de la obra 65%, faltan puerta, ventana, muebles sanitarios y techumbre de lámina galvanizada.

ID 123777 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN AMPLIACION VILLA REAL. Monto planeado \$79,688.90, porcentaje de avance de la obra: 65%, faltan puerta, ventana, techumbre de lámina galvanizada y polines montén.

ID 123866 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN AMPLIACION VILLA REAL. Monto planeado \$ 32,762.95, porcentaje de avance de la obra: 55%, faltan puerta, ventana, muebles sanitarios, techumbre de lámina galvanizada y polines montén.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

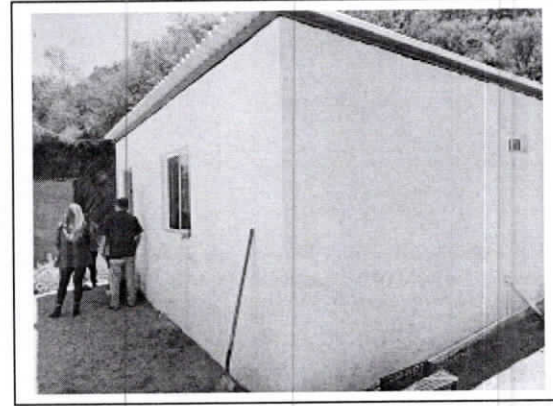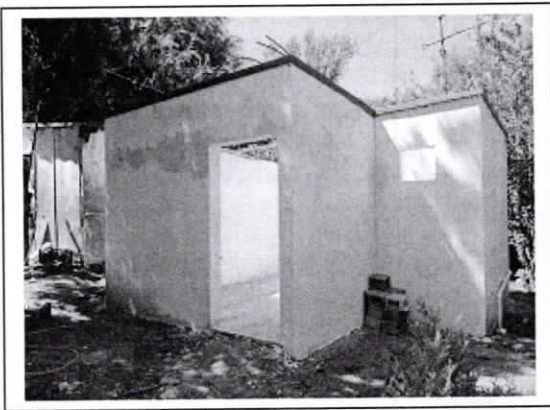

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA


FRONTERAS

En ésta localidad me recibieron la C. Ana Melisa Castillo Zamudio, Auxiliar Administrativo y el Ingeniero José de la Cruz Luna Rosas, Director de Obras Públicas del Municipio de Fronteras. También me presenté como su asesor interino de FAIS y me puse a la orden y disposición para ayudarlos a resolver dudas y problemas de captura en la MIDS y en temas relacionados con el FAIS. Les recordé que la fecha límite para capturar proyectos en la MIDS ya está próxima, es el 4 de septiembre, para que tomen sus previsiones para hacer la Planeación de sus proyectos oportunamente, conforme al calendario de actividades del FAIS 2022. Así mismo mencioné la importancia de la conformación de los comités de obra, de la captura de los anexos de participación social y de las cédulas de verificación de obra, en la MIDS. De la misma manera comenté con los mencionados funcionarios lo importante que es solventar las observaciones que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) hizo a sus proyectos en la MIDS. Igualmente les hice mención que los proyectos capturados en la MIDS no serán informados a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), mientras los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIIS) no hayan sido asociados a dichos proyectos, en la MIDS. Después estuve asesorando a la C. Ana Melisa Castillo, quien es la que captura los proyectos en la MIDS, para hacer unas correcciones a cierta información de dichos proyectos, en dicha plataforma. Posteriormente el Ing. José de la Cruz Luna, me acompañó a hacer un recorrido por las obras que tienen capturadas en la MIDS. Las obras visitadas fueron las siguientes:

ID 60104 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA. Monto planeado en la MIDS: \$ 102,950.00, porcentaje de avance de la obra: 100 %.

ID 180292 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS, LOCALIDAD CUQUIARACHI. Monto planeado en la MIDS: \$ 37,584.00, porcentaje de avance de la obra: 100 %.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

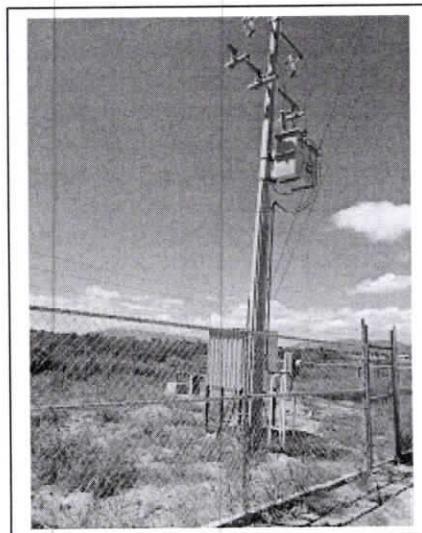



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

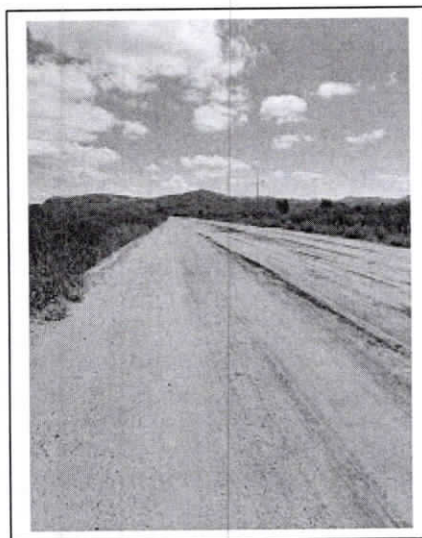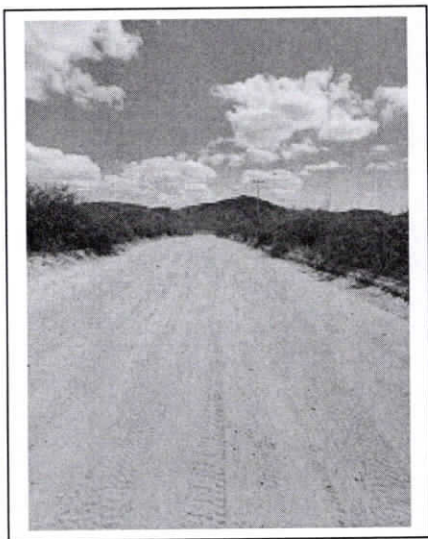

AGUA PRIETA

En ésta localidad me recibió la Ingeniera Cinthia Vanesa Moreno Campa, Encargada de contratos y licitaciones. Al igual que en los demás municipios, me presenté como su asesor interino de FAIS y me puse a la orden y disposición para ayudarlos a resolver dudas y problemas de captura en la MIDS y en temas relacionados con el FAIS. Le recordé que la fecha límite para capturar proyectos en la MIDS ya está próxima, es el 4 de septiembre, para que tomen sus previsiones para hacer la Planeación de sus proyectos oportunamente, conforme al calendario de actividades del FAIS 2022. Así mismo mencioné la importancia de la conformación de los comités de obra, de la captura de los anexos de participación social y de las cédulas de verificación de obra, en la MIDS. De la misma manera comenté con la Ing. Cinthia Moreno lo importante que es solventar las observaciones que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) hizo a sus proyectos en la MIDS. Igualmente le hice mención que los proyectos capturados en la MIDS no serán informados a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), mientras los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) no hayan sido asociados a dichos proyectos, en la MIDS. Después estuve asesorando a la Ing. Cinthia Moreno, quien es la que captura los proyectos en la MIDS, para hacer unas correcciones a cierta información de dichos proyectos, en dicha plataforma. Posteriormente el Ingeniero Raymundo Rascón, Subdirector de Planeación, me acompañó a hacer un recorrido por las obras que tienen capturadas en la MIDS. Las obras visitadas fueron las siguientes:

ID 84902 REHABILITACIÓN DE PARQUE AQUAMUNDO EN AGUA PRIETA. Monto planeado en la MIDS: \$1,014,450.15, porcentaje de avance de la obra: 100%.

ID 115292 CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN GIMNASIO MUNICIPAL GUTY GONZALEZ BAZ. Monto planeado en la MIDS: \$ 423,302.78, porcentaje de avance de la obra: 60%, faltan la techumbre de lámina galvanizada, enjarres en muros, pintura en muros, puertas, ventanas, muebles sanitarios, instalación eléctrica.



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ID 134041 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TECHO EN AUDITORIO CÍVICO MUNICIPAL. Monto planeado en la MIDS: \$ 414,232.33, porcentaje de avance de la obra: 95%, la impermeabilización presenta agrietamientos y resequeidades en algunas áreas.

ID 134332 PAVIMENTACIÓN EN CALLE 14 AVENIDA 10 Y 13 EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA. Monto planeado en la MIDS: \$ 1,455,756.26, porcentaje de avance de la obra: 35%, faltan los trabajos de terracerías, pavimentación asfáltica, pintura reflectiva, señalamientos.

ID 135193 PAVIMENTACION EN AVENIDA 13 ENTRE CALLES 14 Y 16 EN LA CIUDAD DE AGUA PRIETA, SONORA. Monto planeado en la MIDS: \$ 424,352.48, porcentaje de avance de la obra: 35%, faltan los trabajos de terracerías, pavimentación asfáltica, pintura reflectiva, señalamientos.

ID 176923 CONSTRUCCION DE RED DE MEDIA TENSION ELECTRICA EN CALLES A 32 ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y RIO AGUA PRIETA. Monto planeado en la MIDS: \$ 1,170,207.50, porcentaje de avance de la obra: 25%, solo están colocados los postes de concreto.

ID 180111 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 27 AVENIDA 13 Y 18. Monto planeado en la MIDS: \$ 1,014,247.93, porcentaje de avance de la obra: 0 %, proyecto por iniciar.

Ya de regreso en la oficina, la C. Patricia Consuelo Baños Peralta, Auxiliar de la Ing. Cinthia Moreno, me entregó 2 actas de entrega recepción de obras ya concluidas, firmadas por los beneficiarios y por el Arquitecto José Ursus Martinez Corral, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Las actas entregadas fueron las de las siguientes obras:

ID 84902 REHABILITACIÓN DE PARQUE AQUAMUNDO EN AGUA PRIETA.

ID 134041 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE TECHO EN AUDITORIO CÍVICO MUNICIPAL.

Seguidamente, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.

ATENTAMENTE.-

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS



Hermosillo, Sonora, 23 de agosto de 2022

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION DE OBRAS EN PROCESO Y VERIFICAR PROYECTOS YA TERMINADOS, EJECUTADOS CON EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FISMDF)

Se le comisiona a:

MOCTEZUMA, CUMPAS, NACOSARI, FRONTERAS, AGUA PRIETA, SONORA

Durante el (los) día (s) 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2022

Vehículo No. 103

Marca NISSAN

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	200 LTS.
CAJETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

