

2059-I



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
de SONORA

Hermosillo, Sonora a 05 de octubre de 2022

**ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO**  
**COORDINADOR ESTATAL FAIS**  
**P R E S E N T E. –**

En atención al aviso de comisión con fecha del 19 de septiembre de 2022, con ruta de traslado del 26 al 30 de septiembre de 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO:** Supervisión de obras en proceso y verificar proyectos ya terminados, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022, asesorar a los municipios en la captura de sus proyectos en la MIDS y recabar evidencia fotográfica.

**LUGAR DE COMISIÓN:** Municipios de Trincheras, Altar, Pitiquito, Caborca, General Plutarco Elías Calles, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.

**TRINCHERAS**

En ésta localidad me recibió y atendió el Ingeniero Jesús Ángel Murrieta Ochoa, Director de obras del Municipio de Trincheras. Comentamos sobre las capacitaciones de Planeación de Proyectos, que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) impartirá de manera presencial en la Ciudad de Hermosillo, en fechas próximas. El Ing. Jesús Murrieta se disculpó ya que por motivos de mucha carga de trabajo no podrán asistir a dichas capacitaciones. Le recordé que el día 01 de octubre se vá a habilitar de nuevo la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) para continuar con la captura de proyectos. Me aseguró que ya tiene planeado las obras en que invertirá el resto del recurso que le falta por capturar en la MIDS. Comprometiéndose a tener planeado su recurso al 100%, en el mes de octubre. Posteriormente, el Ingeniero Jesús Ángel Murrieta Ochoa me acompañó a verificar el proyecto que recientemente capturaron en la MIDS. El proyecto verificado fue el siguiente:

**ID 178739 REHABILITACION DE TECHO FIRME EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS**, monto planeado \$ 755,254.91, el proyecto consta de 10 techos firmes, los cuáles **se visitaron todos**, los cuales presentan un avance de obra del 100%. Las viviendas visitadas son propiedad de los siguientes beneficiarios:

1. Antonio Canastillo Ochoa.
2. José Paredes Montijo.
3. Martha Gastelum.
4. Esperanza Murrieta.
5. Octavio Yescas Yescas.
6. Auricela Ochoa Yescas.
7. Rafael Luis Rivera.
8. Ruben Cañez
9. Analú Reyna Garcia.
10. Antonio Murrieta.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
07 OCT 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN









SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

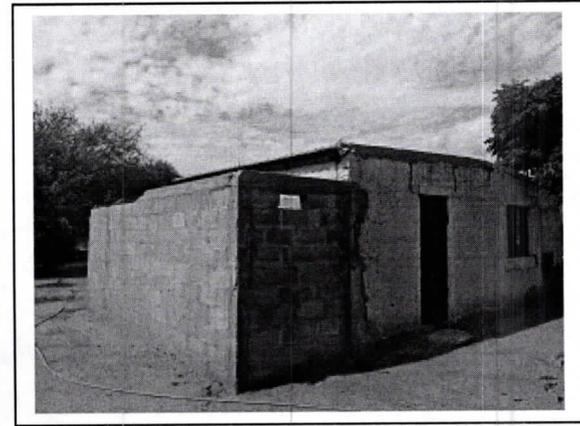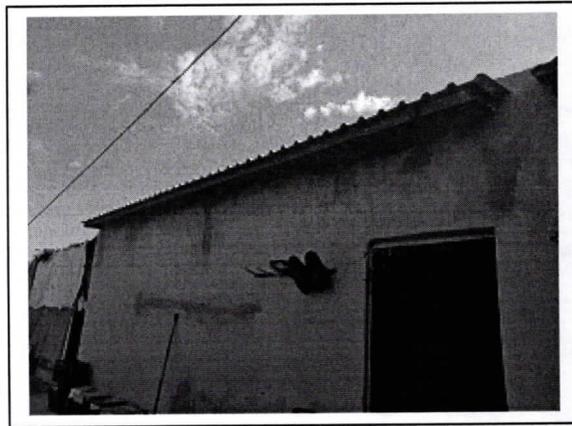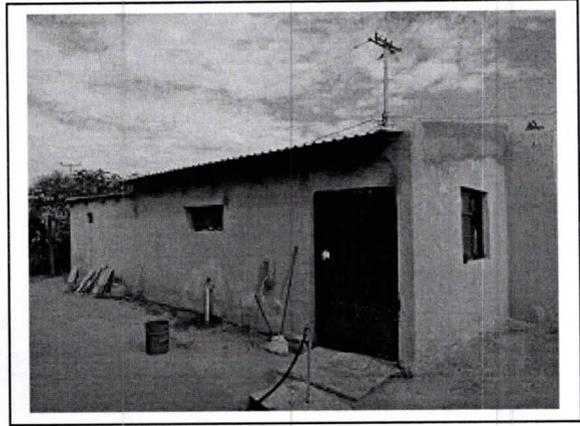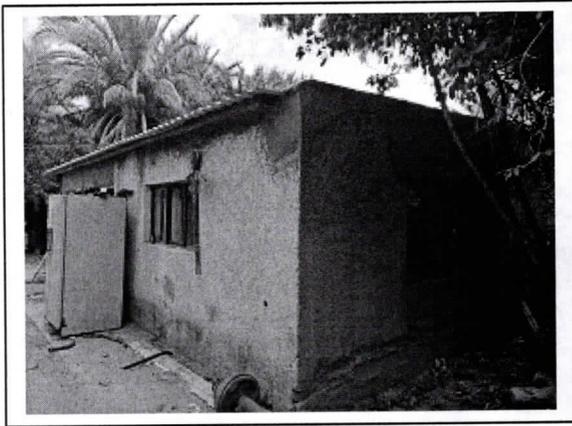



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

Gobierno  
de SONORA

**ALTAR**

Me recibió el C. Jorge Arsenio Espinoza Limón, Director de Obras Públicas. Comentamos sobre las capacitaciones de Planeación de Proyectos, que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) impartirá de manera presencial en la Ciudad de Hermosillo, en fechas próximas. El Ing. Espinoza confirmó la asistencia de 2 personas (el Ing. Rafael Luis Coronado y él mismo) a dichas capacitaciones. Le recordé que el día 01 de octubre se vá a habilitar de nuevo la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) para continuar con la captura de proyectos. Me aseguró que ya tiene bien identificadas las obras en que invertirá el resto del recurso que le falta por capturar en la MIDS. Comprometiéndose a tener capturado su recurso al 100%, antes del día último de noviembre. Posteriormente, el C. Jorge Arsenio Espinoza Limón, me acompañó a dar un recorrido por las obras pendientes de verificar, que están ingresadas en la MIDS y otras que aún no se capturan en la Matriz de Inversión. Los proyectos que se verificaron son los siguientes:



**ID 74176 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALTAR LOCALIDAD ALTAR COLONIA BENITO JUÁREZ CALLE BLVD PINO**, monto planeado \$ 33,302.95, plazo de ejecución planeado del 23/05/2022 al 23/06/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**Proyecto Sin ID** Construcción de techo firme con lámina galvanizada y polines metálicos propiedad del Sr. José Alberto Ruiz Grijalva, ubicada en carretera a Oquitoa final sn Col. Las Lomas, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**Proyecto Sin ID** Construcción de techo firme con lámina galvanizada y polines metálicos propiedad del Sr. Marcos Eduardo Vizcarra Velazquez, ubicada en la Col. Buenos Aires, porcentaje de avance de la obra: 95%, falta limpieza de escombros.

**Proyecto Sin ID** Construcción de techo firme con lámina galvanizada y polines metálicos propiedad del Sr. Emir Urias Chaira, ubicada en la Col. Buenos Aires, porcentaje de avance de la obra: 40%, están colocadas 3 hiladas de block en promedio, en el perímetro del cuarto, faltan los polines metálicos y la lámina galvanizada.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

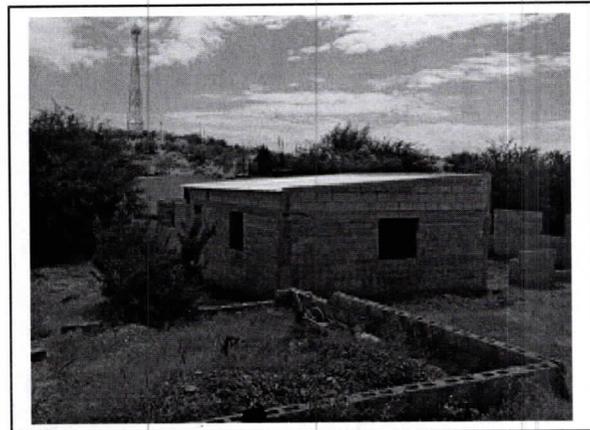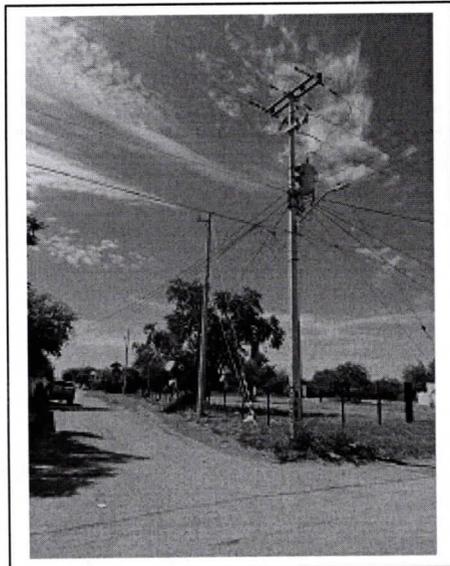



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
de SONORA

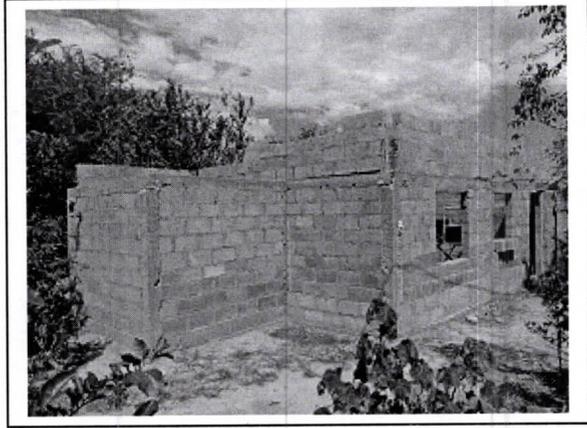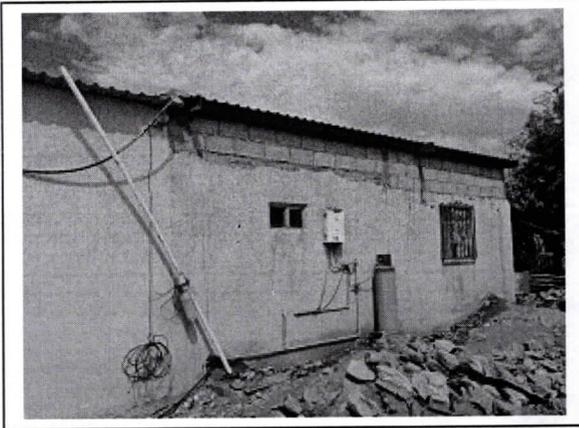

#### CABORCA

En ésta localidad me recibió la C. Martha Elba Alonso Valdivia, encargada de capturar la información en la MIDS. Comenté con ella sobre las capacitaciones de Planeación de Proyectos, que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) impartirá de manera presencial en la Ciudad de Hermosillo, en fechas próximas. La C. Martha Alonso quedó en confirmar la asistencia a dicha capacitación. Posteriormente me pasó con el Lic. Carlos Alberto Quijada Marcial, Director de Desarrollo Social del Municipio. Le recordé al Lic. Quijada, que el próximo periodo para la captura de la planeación de proyectos en la MIDS inicia el día 01 de octubre y termina el día 4 de diciembre. Por lo que para ésta fecha se debe tener planeado el 100% de su recurso del FAIS. El Lic. Quijada me comentó que ya tienen bien identificados los proyectos en que invertirán el recurso faltante por capturar en la MIDS. Me indicó que piensan terminar la captura de la planeación al 100%, antes de que termine el plazo de captura. Enseguida le dió instrucciones a la C. Martha Elba Alonso Valdivia, para que me acompañara a hacer un recorrido por las obras ejecutadas y en proceso de ejecución y que ya están capturadas en la MIDS. Las obras verificadas fueron las siguientes:

**ID 174594** EQUIPAMIENTO DE 25 DEPOSITOS DE AGUA ENTUBADA DE 600 LITROS EN DIFERENTES UBICACIONES EN H CABORCA EN LA CIUDAD DE CABORCA SONORA. Monto planeado \$ 178,214.85, el proyecto consta de 25 tinacos en diferentes viviendas, de los cuáles se visitaron solo 4 por cuestión de tiempo, presentando éstos un porcentaje de avance del: 100%. Las viviendas visitadas son propiedad de los siguientes beneficiarios:

1. Ramona Alicia Madero Rodriguez.
2. Alejandrina Higuera Ramirez.
3. Rosa Armida González Clavero.
4. Ana Lilia Higuera Ramirez.









SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE **SONORA**

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**

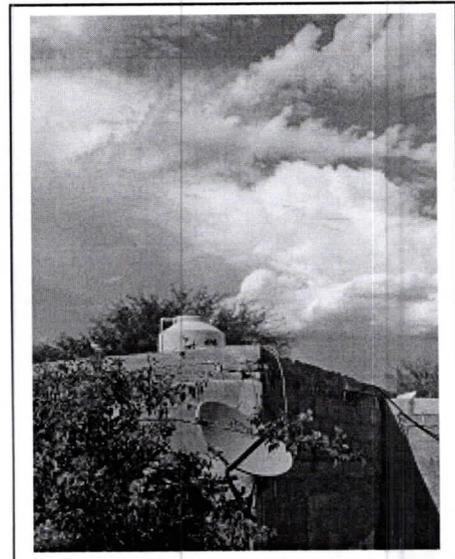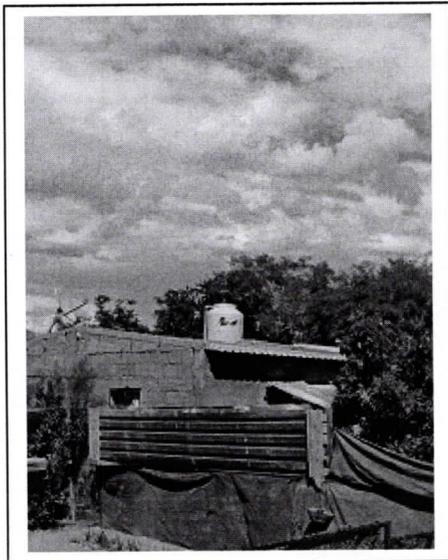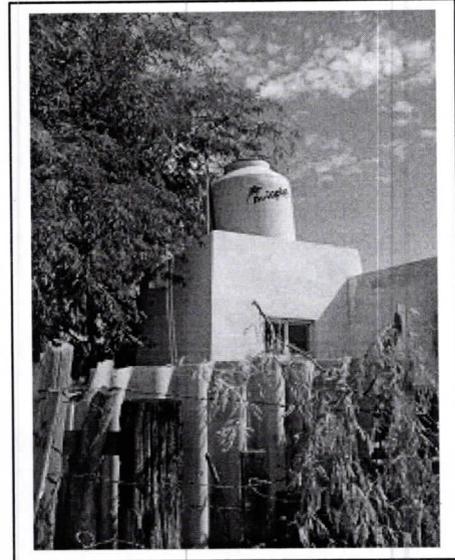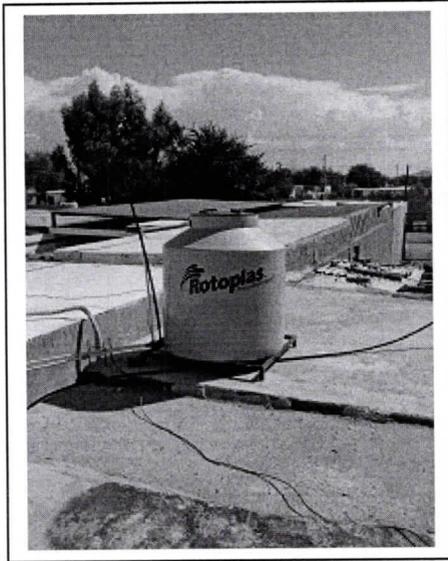

  
**SONORA**  
TIERRA DE OPORTUNIDADES



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

Gobierno  
de SONORA

**GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES**

En ésta localidad me recibió y atendió la Maestra Carmen Eugenia Ruiz Ibarra, Directora de Desarrollo Social, del Municipio, quién recientemente acaba de tomar posesión del cargo. Me presenté como su Supervisor y Asesor del FAIS, poniéndome a la disposición para apoyarla en lo concerniente a los temas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), como son la captura de la planeación de proyectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), solventación de observaciones a proyectos, Participación Social, cédulas de verificación, etc. Comenté con ella sobre las capacitaciones de Planeación de Proyectos, que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) impartirá de manera presencial en la Ciudad de Hermosillo, en fechas próximas. La Maestra Eugenia Ruiz quedó en confirmar la asistencia a dicha capacitación. Le recordé a la Maestra, que el próximo periodo para la captura de la planeación de proyectos en la MIDS inicia el día 01 de octubre y termina el día 4 de diciembre. Por lo que para ésta fecha se debe tener planeado el 100% de su recurso del FAIS. Después apoyé al C. Juan Fernando Andrade Mora, encargado de la captura de la planeación de proyectos en la MIDS, para descargar el mapa de Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y también para descargar el Informe Anual de Pobreza, de su Municipio. Posteriormente la Maestra y el C. Juan Andrade, me acompañaron a hacer un recorrido por las obras ejecutadas y en proceso de ejecución, pero que aún no se capturan en la Matriz de Inversión. Las obras verificadas fueron las siguientes:

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Techo de lámina con fajilla de madera, en la Col. López Mateos, propietaria de la vivienda: Eduwiges Valle Ávila (2 cuartos), porcentaje de avance de la obra: 100%.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Techo de lámina con polín metálico (cocina), en la Col. La Copa, propietaria de la vivienda: Agustina López Valenzuela, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Techo de lámina con fajilla de madera en la Col. La Botella, propietaria de la vivienda: María del Socorro Gamez Salas, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Cuarto dormitorio con baño, en la Col. Obregón Final, propietaria de la vivienda: Francisca Guadalupe Sanchez Ruiz, porcentaje de avance de la obra: 35%.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Piso firme de concreto, en la Col. El Desierto, propietaria de la vivienda: Mariana Mariscal Alegría, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Cuarto dormitorio con baño, en la Col. El Desierto, propietaria de la vivienda: Martha Yolanda Sanchez, porcentaje de avance de la obra: 95%.

**ID 70801 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE**, monto planeado \$ 273,152.16, plazo de ejecución planeado del 14/03/2022 al 03/04/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Techo de lámina con polín metálico, en el Ejido La Nariz, propietaria de la vivienda: Elizabeth Romero Camacho, porcentaje de avance de la obra: 10%, únicamente se ha construido la piña para recibir el techo.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Techo de lámina, en el Ejido La Nariz, propietaria de la vivienda: Ailyn Emely López Beltrán, porcentaje de avance de la obra: 0%, todavía no se inicia, vá a ser únicamente la colocación de la lámina.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Techo de lámina con fajilla de madera en la Col. El Chamizal, propietaria de la vivienda: Rosa María Carrera López, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Cuarto dormitorio con baño, en la Col. Ejido Pápagos, propietario de la vivienda: Rafael Villa Miranda, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Techo de lámina con polín metálico, en la col. Ejido Pápagos, propietaria de la vivienda: Rebeca Nohemí Miranda, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de Piso firme de concreto de 4x8 mts., en la Col. Obregón, propietario de la vivienda: Manuel Barajas Camarillo, porcentaje de avance de la obra: 100%.









SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**

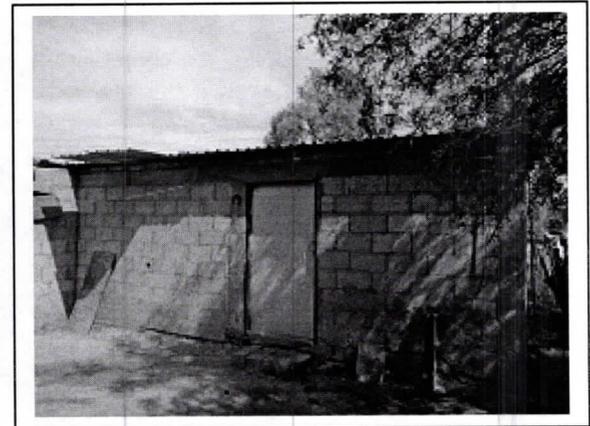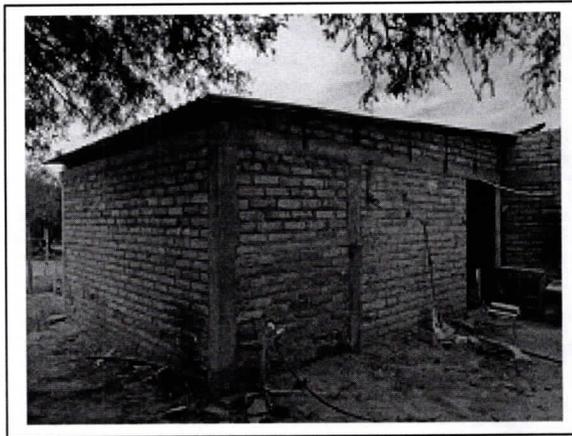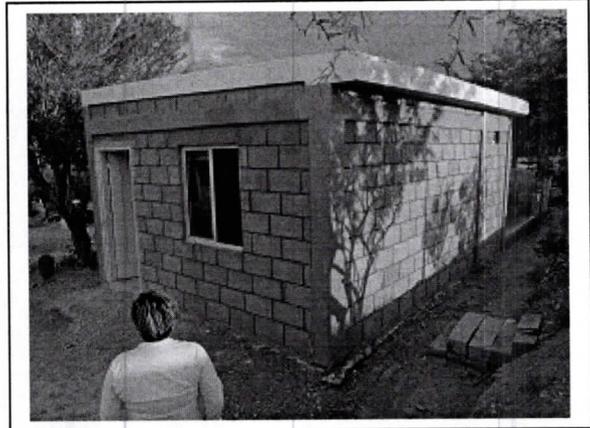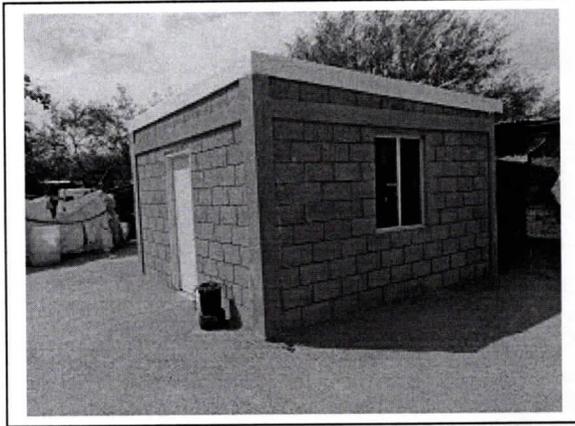

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737  
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: [sedesson@sonora.gob.mx](mailto:sedesson@sonora.gob.mx)



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

### **SAN LUIS RÍO COLORADO**

En éste Municipio, me recibió el Ing. Germán de los Reyes Aceves, Auxiliar Administrativo y encargado de capturar la información en la MIDS. Comentamos sobre las capacitaciones de Planeación de Proyectos, que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) impartirá de manera presencial en la Ciudad de Hermosillo, en fechas próximas. El Ing. Germán de los Reyes se disculpó, ya que por motivos de mucha carga de trabajo no podrán asistir a dichas capacitaciones. También le recordé al Ing. Germán de los Reyes, que el próximo periodo para la captura de la planeación de proyectos en la MIDS inicia el día 01 de octubre y termina el día 4 de diciembre. Por lo que para ésta fecha se debe tener planeado el 100% de su recurso del FAIS. Me aseguré que ya tiene planeado las obras en que invertirán el resto del recurso que le falta por capturar en la MIDS. Posteriormente, el Ing. Germán de los Reyes y yo nos dirigimos a hacer un recorrido por las obras pendientes de verificar, que están capturadas en la MIDS y otras que aún no se capturan. Las obras que se verificaron se indican en la siguiente relación:

**ID 178387** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AV 5 DE MAYO DE CALLE 26 A CALLE 30, monto planeado en la MIDS: \$ 5,441,532.00, plazo de ejecución planeado del 08/08/2022 al 16/10/2022, porcentaje de avance de la obra: 55%, falta construir la carpeta asfáltica.

**ID 178504** REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV DALIAS DE CALLE 31 A CALLE 34, monto planeado en la MIDS: \$ 1,595,960.36, plazo de ejecución planeado del 18/08/2022 al 26/09/2022, porcentaje de avance de la obra: 98%, falta señalamiento.

**ID 180137** REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 1, monto planeado en la MIDS: \$ 1,863,717.23, plazo de ejecución planeado del 11/07/2022 al 09/08/2022, el proyecto consta de 265 lámparas tipo led, de éstas se revisaron 60, por cuestión de tiempo. Las cuales presentan un porcentaje de avance del: 100%.

**ID 180240** REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUIS RIO COLORADO ETAPA 2, monto planeado en la MIDS: \$ 731,832.19, plazo de ejecución planeado del 11/07/2022 al 09/08/2022, el proyecto consta de 104 lámparas tipo led, de éstas se revisaron 53, por cuestión de tiempo. Las cuales presentan un porcentaje de avance del: 100%.

**(Proyecto sin ID)** Ampliación y mejoramiento de la red de agua potable por la Ave. Leandro Valle B, porcentaje de avance de la obra: 90%, faltan las cajas de válvulas.

**(Proyecto sin ID)** Construcción de pavimento en calle 8 de Ave. Argentina "A" a Ave. Dominicana "A", porcentaje de avance de la obra: 45%, falta construir la carpeta asfáltica.

**(Proyecto sin ID)** Construcción y equipamiento de pozo profundo en el Ejido Islita, porcentaje de avance de la obra: 15%.

**(Proyecto sin ID)** Construcción y equipamiento de pozo profundo en el Ejido Lagunitas, porcentaje de avance de la obra: 10%.








SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**

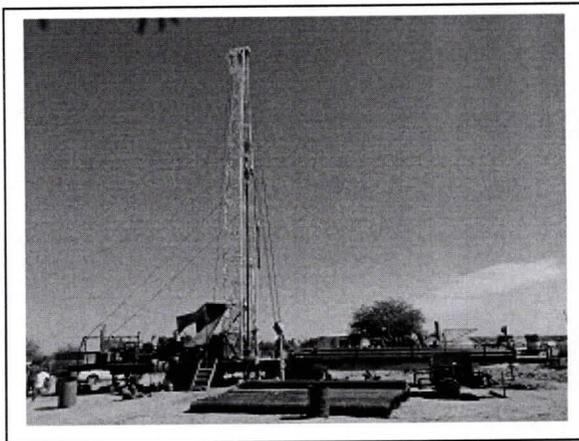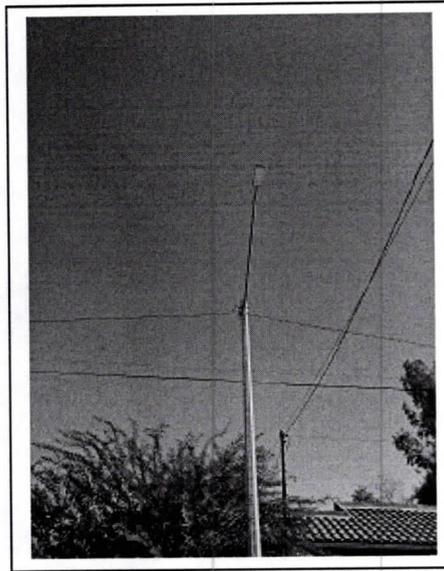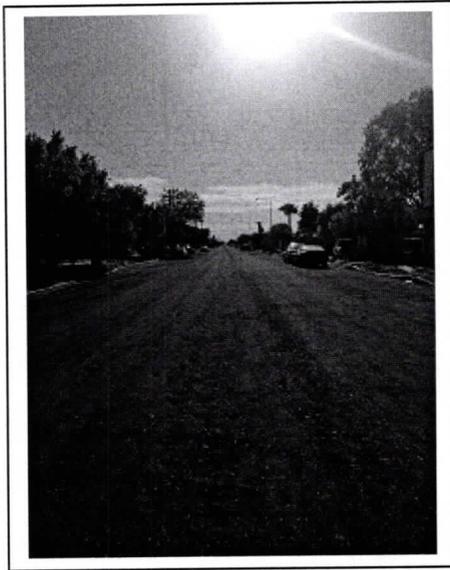

  
**SONORA**  
TIERRA DE OPORTUNIDADES

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737  
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: [sedesson@sonora.gob.mx](mailto:sedesson@sonora.gob.mx)



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

**PUERTO PEÑASCO**

En la Ciudad de Puerto Peñasco, me recibió la Ing. Guadalupe Barrera Acuña, Supervisor de Obra y encargada de capturar la información en la plataforma MIDS. Enseguida me pasó con el Ing. José Luis Montijo Torres, Director de Obras Públicas del Municipio. Comenté con él sobre la capacitación sobre Planeación de Proyectos, que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) impartirá de manera presencial en la Ciudad de Hermosillo, en fechas próximas. El Ing. Montijo quedó en confirmar la asistencia a dicha capacitación. Así mismo le recordé, que el próximo periodo para la captura de la planeación de proyectos en la MIDS inicia el día 01 de octubre y termina el día 4 de diciembre. Por lo que para ésta fecha se debe tener planeado el 100% de su recurso del FAIS. Posteriormente le dió indicaciones a los Ingenieros Daniel Salazar y Guadalupe Barrera, Supervisores de Obra, para que me acompañaran a hacer un recorrido para verificar las obras pendientes, que están ingresadas en la MIDS.



Las obras que se visitaron son las siguientes:

**ID 112448** AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE LOS DELFINES ENTRE DERECHO DE VIA Y AVE ULISES IRIGOYEN COLONIA BRISAS DE MAR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA, monto planeado a invertir \$ 1,031,653.37, fecha de inicio de ejecución: 03/05/2022, fecha de fin de ejecución: 16/06/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**ID 121079** AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE ZENZONTLE ENTRE AVE ULISES IRIGOYEN Y AVE CONSTITUCION COLONIA BRISAS DEL MAR EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA, monto planeado a invertir \$ 859,100.58, fecha de inicio de ejecución: 16/06/2022, fecha de fin de ejecución: 25/07/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**ID 152127** REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE BLVD SAMUEL OCAÑA DE BLVD BENITO JUAREZ A DERECHO DE VIA COLONIAS LOPEZ PORTILLO Y NUEVA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA, monto planeado a invertir \$ 243,600.00, fecha de inicio de ejecución: 30/06/2022, fecha de fin de ejecución: 29/07/2022, porcentaje de avance de la obra: 100%.

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**

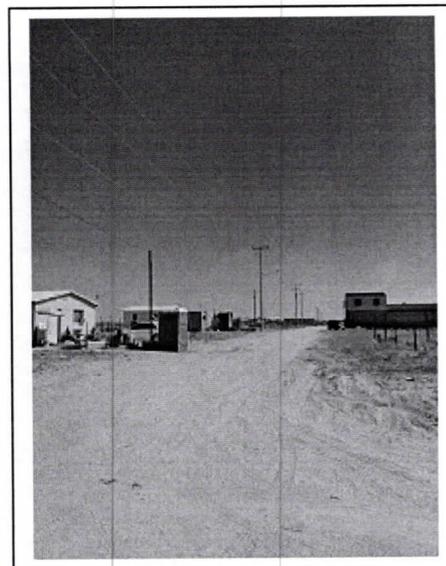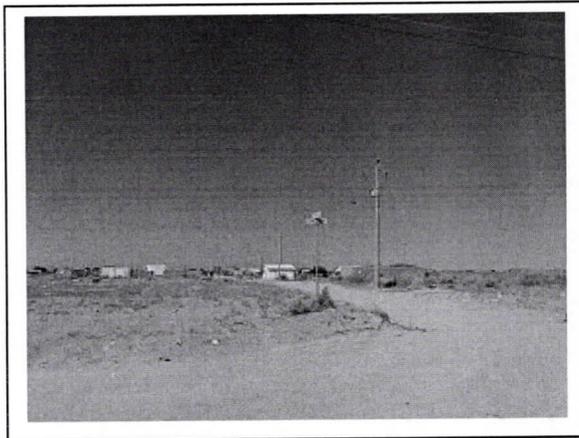



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE **SONORA**



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737  
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: [sedesson@sonora.gob.mx](mailto:sedesson@sonora.gob.mx)



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

**PITIQUITO**

En éste Municipio comentamos con la C. Lester María Ruiz, Directora de Obras Públicas del Municipio, sobre las capacitaciones de Planeación de Proyectos, que la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) impartirá de manera presencial en la Ciudad de Hermosillo, en fechas próximas. La C. Lester Ruiz quedó en confirmar la asistencia a dicha capacitación. Le recordé que el próximo periodo para la captura de la planeación de proyectos en la MIDS inicia el día 01 de octubre y termina el día 4 de diciembre. Por lo que para ésta fecha se debe tener planeado el 100% de su recurso del FAIS. Cabe mencionar, que a la fecha, el Municipio de Pitiquito aún no captura ningún proyecto en la MIDS, pero tiene 2 obras concluidas al 100%, que todavía no capturan en la MIDS. Dichas obras son las siguientes:

**(Proyecto sin ID)** Contrato: Fais No. 01/2022. Construcción de Alumbrado Público, Primera Etapa, consistente en 13 postes y 26 lámparas tipo LED, ubicada en la Carretera Internacional, en la localidad de Pitiquito, Municipio de Pitiquito, monto aproximado \$599,988.46, fecha de inicio programada: 02 de mayo de 2022, fecha de terminación programada: 31 de mayo de 2022, avance de la obra 100%.

**(Proyecto sin ID)** Contrato: Fais No. 01/2022. Construcción de Alumbrado Público, Segunda Etapa, consistente en 14 postes y 28 lámparas tipo LED, ubicada en la Carretera Internacional, en la localidad de Pitiquito, Municipio de Pitiquito, monto aproximado \$659,682.63, fecha de inicio programada: 30 de mayo de 2022, fecha de terminación programada: 28 de junio de 2022, avance de la obra 100%.

Seguidamente, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.

ATENTAMENTE.-

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio  
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL





H AYUNTAMIENTO  
PITIKUITO, SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES  
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL  
Sonoyta, Sonora

Hermosillo, Sonora, 19 de septiembre de 2022

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO  
PRESENTE.-

XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
2021 - 2024

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

Con el propósito de :

SUPERVISION DE OBRAS EN PROCESO Y VERIFICAR PROYECTOS YA TERMINADOS, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2022

Se le comisiona a:

TRINCHERAS, ALTAR, PITIKUITO, CABORCA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, PUERTO PEÑASCO Y SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 103

Marca NISSAN

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| CONTROL NET: | <u>250 Litros</u> |
| CASSETAS:    | <u>\$0.00</u>     |
| GASOLINA:    |                   |

ATENTAMENTE

*Lourdes Lorena Rojo Cruz*  
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

H. CABORCA, SON.

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



ADMINISTRACION  
MUNICIPAL 2021-2024



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL



DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS  
TRINCHERAS, SONORA.
