

Hermosillo, Sonora; a 10 de octubre de 2022

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE. –



En referencia al **aviso de comisión con fecha del 30 de septiembre de 2022**, mediante el cual se me comisionó el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes **del 03 al 07 de octubre de 2022 al municipio de Navojoa, Álamos y Bácum** con la finalidad de realizar el seguimiento al programa de vivienda FISE 2022 de las obras C-00075/0762 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa. C-00075/0749 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos del contrato SEDESSON-FISE-2022-026. C-00075/0758 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Bácum del contrato SEDESSON-FISE-2022-030.

El lunes 03 me trasladé al municipio de Bácum y me reuní con el superintendente de la obra C-00075/0758 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Bácum el ing. Francisco Javier Toledo Ruiz juntos realizamos el recorrido de las viviendas que ya comenzaron las cuales son en el Ejido el Juvani las cuales son 2 beneficiarios en esta localidad, viendo un avance de colado de techo y cimbrado de ahí realizamos el recorrido en Bácum los cuales son 5 beneficiarios, en donde se observó están trabajando en cimentaciones y levantamiento de muro de block, de aquí nos trasladamos a Desarrollo Social con la licenciada Frida Amparano directora de Desarrollo Social de este municipio a ver un detalle que había quedado pendiente sobre un apoyo tierra del municipio a una beneficiaria para poder comenzar a construir en la localidad Ejido Francisco Javier Mina (campo 60), quedando pendiente realizar el recorrido en esa localidad más adelante. El día martes 04 me trasladé al municipio de Navojoa y me reuní con el superintendente de esta obra C-00075/0762 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa, el ing. Benjamín Alfonso Agüero Madero y con el encargado de obra el ing. Elías Alfonso Ibarra, realizamos el recorrido por las viviendas que tienen comenzadas en la localidad de Fundición las cuales son 6, todas en proceso de excavación y cimentación, y comenzando con muro de block, y de ahí nos trasladamos a la localidad de Etchohuaquila, las cuales son 8 presentando en todas excavaciones, vi con el ingeniero temas relacionados con detalles de la construcción así como los tiempos e implementar más gente para cumplir con tiempos, el día miércoles 05 seguimos el recorrido en Navojoa en la localidad de Nachuquis presentando un avance en las 4 viviendas con cimentación, excavación y 1 comenzando block. De ahí fui a la localidad de

Choacalle, presentando un avance en 2 viviendas con levantamiento de muro de block. En la localidad de San Pedrito 1 vivienda en levantamiento de muro de block, de ahí fuimos a la localidad de Cucajaqui presentando avance de 2 viviendas con muro de block y Teachive la cual es solo 1 beneficiario en esta localidad con muro de block teniendo un avance de 36% El jueves 06 me trasladé al municipio de Álamos en compañía del ing. Benjamín Alfonso Agüero Madero, en este municipio son 25 beneficiarios en 3 localidades Los Estrados Guajaray y Álamos, mediante el recorrido realizamos una inspección y se observa que el terreno es tipo C, por lo cual no se puede trabajar con zapata corrida, procediendo a realizar el cambio a Losa de Cimentación siendo así no tiene porcentaje de avance quedando pendientes la siguiente visita. el día viernes 07 de octubre, por último, seguimos con el recorrido en el municipio de Bácum en el Ejido Francisco Javier Mina (campo 60), presentando trabajo en 5 viviendas, con el piso colado, presentando un avance total de 35%. En las visitas con cada encargado de obra se trataron asuntos relacionados con la obra de construcción de cuartos dormitorios sobre cumplir con el catalogo, medidas tiempos, calidad de los mismos, así como implementar más gente para poder cumplir con los tiempos.

ATENTAMENTE. -

Alexia Rendón
Ing. Alexia Nickole Rendón Grijalva
Jefe de departamento



662 108 37 37
662 108 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Rio Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Rio Sonora



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA



HERMOSILLO, SONORA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ALEXIA NICKOLE RENDÓN GRIJALVA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO DE OBRA, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DEL PROGRAMA VIVIENDA FISE-2022 POR LOS MUNICIPIOS DE NAVOJOA(FUNDICION, ETCHOHUAQUILA, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA, EL SANEAL CHOACALLE, CUCAJAQUI, SAN PEDRITO, TEACHIVE, NACHUQUIS), ALAMOS (GUJARAY, LOS ESTRADOS, ALAMOS), BACUM (EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60), BACUM, EJIDO VILLA GUADALUPE, EJIDO ATOTONILCO, EJIDO PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), EJIDO INDEPENDENCIA (CAMPO 104), SONORA.

Se le comisiona a:

NAVOJOA, ALAMOS Y BACUM, SONORA.

Durante el (los) día (s) 3 OCTUBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2022

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	
CASITAS:	
GASOLINA:	



ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DESARROLLO SOCIAL

H. Ayuntamiento

BACUM



Para Todos


ADMINISTRACION 2021 - 2024

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA



REPORTE FOTOGRÁFICO

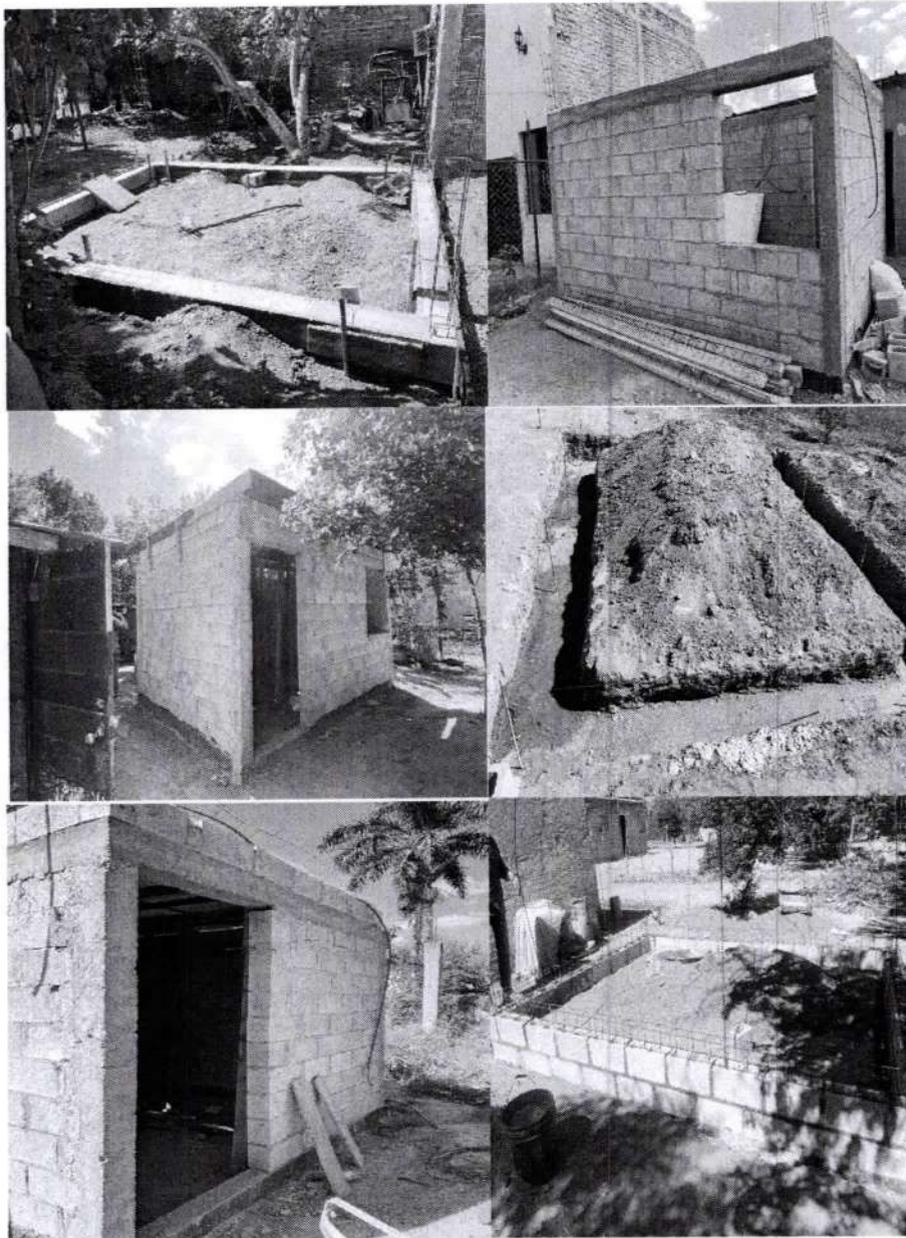

662 108 37 37
662 108 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Río Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Río Sonora
