

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
Hermosillo, Sonora a 10 de Noviembre de 2022



ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO  
COORDINADOR ESTATAL FAIS  
P R E S E N T E. –

En atención al aviso de comisión con fecha del 25 de octubre de 2022, con ruta de traslado del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO:** Supervisión de las Obras Números: "C-00075/0797 Construcción de baños con descarga domiciliaria en varias localidades del Municipio de Cajeme; C-00075/0799 Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del Municipio de Cajeme." Las cuales consisten en 19 cuartos-dormitorios y 38 baños con descarga domiciliaria. Correspondientes al contrato No. SEDESSON-FISE-2022-047.

**LUGAR DE COMISIÓN:** Diversas localidades del Municipio de Cajeme, Sonora.

#### CAJEME

El día **lunes 31 de octubre de 2022** en la localidad Ciudad Obregón, me reuní con el Ing. Francisco Javier Toledo Ruiz, Persona Física encargada de ejecutar los trabajos correspondientes al contrato mencionado anteriormente. Platiqué con él sobre la importancia de respetar el proyecto existente y ejecutar los trabajos con calidad aceptable, cuidando los detalles y acabados de construcción. También comenté sobre la importancia de cumplir con su programa de ejecución de los trabajos.

El Ing. Toledo y yo hicimos un recorrido por la obra "C-00075/0797 Construcción de baños con descarga domiciliaria en varias localidades del Municipio de Cajeme", específicamente los domicilios donde ya se iniciaron los trabajos. La localidad donde ya se tiene avance en la construcción de Baños con descarga es Pueblo Yaqui.

Las obras visitadas se relacionan en la siguiente tabla:

#### PUEBLO YAQUI

BENEFICIARIO	DOMICILIO	OBSERVACIONES
KAREN CHAVEZ VEGA	OCTAVA 910 CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS Y NO HAN ENTREGADO MATERIALES.
REINA ISABEL CHAVEZ ESCOBEDO	OCTAVA 904 CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, YA SE ENTREGÓ EL BLOCK.
ROSA AMELIA SILERIO CALDERON	C. JORGE FLORES 800 CP 85200 VIDA DIGNA	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU HIJO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, YA SE ENTREGÓ EL BLOCK.
CONCEPCION VEGA COTA	OCTAVA 904 CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS Y NO HAN ENTREGADO MATERIALES.





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
de SONORA

MARINA ISABEL YOCUPICIO GALAVIZ	SEXTA 1117 CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, YA SE INICIARON LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 10 HILADAS A LA ALTURA DE LA PUERTA, NO SE APRECIAN VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS, NI EL TUBO VENTILA DE 2", EL CONTRATISTA SE COMPROMETIÓ A COLOCARLAS. SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN.
ROSA ALEJANDRA VEGA GONZALEZ	SEPTIMA S/N CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, YA HAY BLOCK, GRAVA Y ARENA EN EL DOMICILIO.
ROSA AURORA VALDEZ VACA	SEPTIMA S/N CP 85200 VIDA DIGNA	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, POR COMENTARIO DEL CONTRATISTA EL BLOCK PARA ÉSTE CUARTO LO ENTREGARON EN EL DOMICILIO DE LA SRA. ROSA ALEJANDRA VEGA GONZALEZ.
MARGARITA GALAVIZ HINOJOSA	OCTAVA 922 CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, YA SE INICIARON LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 10 HILADAS A LA ALTURA DE LA PUERTA, SE APRECIAN VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN.
SUHEY BIRIDIANA GALAVIZ HINOJOSA	OCTAVA 926 CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, YA SE INICIARON LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 3 HILADAS, SE APRECIAN SOLO 4 VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS EN LAS ESQUINAS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN.
MILAGROS YURIDIANA HERNANANDEZ TAPIA	CUARTA 735 CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, YA SE INICIARON LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DEL BAÑO VÁ EN MUROS DE BLOCK A 10 HILADAS A LA ALTURA DE LA PUERTA, SE APRECIAN VARILLAS DE REFUERZO PARA CASTILLOS AHOGADOS, EL TUBO VENTILA DE 2", SE APRECIAN LA TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" Y LA TUBERÍA DE CPVC HIDRÁULICA DE 13 MM. NO SE HA IMPERMEABILIZADO EL DENTELLÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN.





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
de SONORA

Durante el recorrido por las obras, le hice hincapié al Ing. Toledo, en detalles como el ancho y la profundidad de la excavación, la impermeabilización del dentellón de concreto en la losa de cimentación, las varillas de refuerzo para los castillos ahogados, medí las dimensiones de los baños, así como las de los huecos de puertas y ventanas, le mencioné al Ing. Toledo que dichos huecos deben quedar con las dimensiones que indica el proyecto y perfectamente escuadrados y plomeados.

El día **martes 01 de noviembre** me reuní en las oficinas del Ayuntamiento Cajeme en la localidad de Cd. Obregón, con la C. Blanca Estela Ayala Robles, Coordinadora Operativa Municipal. El Ing. Francisco Toledo no pudo acompañarnos por compromiso de trabajo. La C. Blanca Ayala y yo nos dirigimos a la localidad de Ej. Cuauhtémoc (Campo 5) y Pueblo Yaqui, a continuar el recorrido por los domicilios de los beneficiarios de los Baños correspondientes a la obra "C-00075/0797 Construcción de baños con descarga domiciliaria en varias localidades del Municipio de Cajeme". Los domicilios de beneficiarios visitados éste día se enlistan en la siguiente tabla:

PUEBLO YAQUI

BENEFICIARIO	DOMICILIO	OBSERVACIONES
VIRGINIA ESPINOZA BARRAZA	SALVADOR ALVARO 415 CP 85200 ZONA EJIDAL	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, YA HAY BLOCK, Y CEMENTO EN EL DOMICILIO.
ESPERAZA LOPEZ ESPINOZA	SALVADOR ALVARO 407 CP 85200 ZONA EJIDAL	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, YA HAY BLOCK, Y CEMENTO EN EL DOMICILIO.
MARIA VEGA FRIAS	P. AYON 405 CP 85200 VIDA DIGNA	AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HA ENTREGAD OMATERIAL EN EL DOMICILIO.
LUIS ALFONSO VERDUZCO GOMEZ	FCO. VILLA 117 CP 85200 ZONA EJIDAL	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, YA HAY BLOCK, Y CEMENTO EN EL DOMICILIO.
YOLANDA LOPEZ ROJAS	AV.MARTIRES S/N CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, YA HAY BLOCK, Y CEMENTO EN EL DOMICILIO.
MARIA MONSERRAT HEREDIA COTA	ENRIQUE S/N CP 85200 SAN IGNACIO	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HA ENTREGADO MATERIAL EN EL DOMICILIO.
BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ ARAGON	S/N S/N CP 85200 VIDA DIGNA	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN EL DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU HIJA, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
de SONORA

		YA ENTREGARON EL BLOCK EN EL DOMICILIO.
ANA GUADALUPE MONTES LONGINES	S/N S/N CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, YA HAY BLOCK, Y CEMENTO EN EL DOMICILIO.
SILVIA BIVIANA MIRANDA FLORES	JORGE VALDEZ S/N CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, YA HAY BLOCK, Y CEMENTO EN EL DOMICILIO.
AZUCENA DAYANA TOBALDO NOJAR	ONCEAVA S/N CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, YA HAY BLOCK, Y CEMENTO EN EL DOMICILIO.
KARLA ISABEL TOVAR RUVALCABA	DECIMA S/N CP 85200 VIDA DIGNA	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU MAMÁ, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO HAY MATERIAL EN EL DOMICILIO.
MARIA DEL PILAR NAJAR ACEVEDO	ONCEAVA L5 M21 S/N CP 85200 VIDA DIGNA	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, YA HAY BLOCK, Y CEMENTO EN EL DOMICILIO.

EJIDO CUAUHTÉMOC (CAMPO 5)

BENEFICIARIO	DOMICILIO	OBSERVACIONES
RAMON ALBERTO ANAYA LOPEZ	MAXIMILIANO S/N CP 85203 EJ. CUAUHTÉMOC (CAMPO 5)	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU MAMÁ, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.
FRANCISCA LILIAN MENDOZA GAXIOLA	VENUSTIANO CARRANZA S/N CP 85203 EJ. CUAUHTÉMOC (CAMPO 5)	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE VEN MATERIALES EN EL LUGAR.
MARIA OLIVIA ANAYA LOPEZ	IGNACIO PESQUEIRA S/N CP 85203 EJ. CUAUHTÉMOC (CAMPO 5)	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU ESPOSO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.
AURELIANO LOPEZ IBARRA	VICENTE GUERRERO S/N CP 85203 EJ. CUAUHTÉMOC (CAMPO 5)	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, AÚN NO SE INICIAN





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
de SONORA

		LOS TRABAJOS, NO SE VEN MATERIALES EN EL LUGAR.
MICAELA ALCALA MARTINEZ	FRANCISCO VILLA S/N CP 85203 EJ. CUAUHTÉMOC (CAMPO 5)	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE VEN MATERIALES EN EL LUGAR.
JOSE MANUEL GARCIA QUIROZ	MAXIMILIANO S/N CP 85203 EJ. CUAUHTÉMOC (CAMPO 5)	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU ESPOSO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.

El día **02 de noviembre**, no me pudieron acompañar a continuar el recorrido, ni la C. Blanca Ayala por ser día festivo y el Ing. Francisco Toledo (el Contratista) por compromiso de trabajo. Me dirigí a las localidades de Providencia y Esperanza. Los domicilios que visité éste día fueron los siguientes:

ESPERANZA

BENEFICIARIO	DOMICILIO	OBSERVACIONES
ERNESTINA CUAMEA LOPEZ	OCTAVIO PAZ 1421 CP 85210 LEANDRO VALLE	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE VEN MATERIALES EN EL LUGAR.
FRANCISCA GONZALEZ GOMEZ	CARLOS FUENTES 130 CP 85210 LEANDRO VALLE	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HA ENTREGADO MATERIAL EN EL DOMICILIO.
GABRIELA LEYVA VALENZUELA	FAUSTO TOPETE 421 CP 85210 LEANDRO VALLE	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU NIETO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.

PROVIDENCIA

BENEFICIARIO	DOMICILIO	OBSERVACIONES
ELIZABETH OTERO ALDAMA	MATORRO 806 CP 85203 LOS JARDINES	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HA ENTREGADO MATERIAL EN EL DOMICILIO.
ROSA ESTHELA LUZANILLA SALAZAR	MATORRO S/N CP 85203 LOS JARDINES	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, AÚN NO SE INICIAN





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
de SONORA

		LOS TRABAJOS, NO SE VEN MATERIALES EN EL LUGAR.
YAREMI ARAUJO JUSACAMEA	MANZANILLA 820 CP 85203 LOS JARDINES	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON CREDENCIAL DEL OXO (EXTRAVIÓ SU INE) AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HA ENTREGADO MATERIAL EN EL DOMICILIO.
ROSARIO GARCIA CORONADO	MANZANILLA 804 CP 85203 LOS JARDINES	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HA ENTREGADO MATERIAL EN EL DOMICILIO.
JOSEFINA RODRIGEZ VELAZQUEZ	NEEM 808 CP 85203 LOS JARDINES	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE VEN MATERIALES EN EL LUGAR.
BEATRIZ ADRIANA CARRIZOZA CANTUA	MORINGA 804 CP 85203 LOS JARDINES	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HA ENTREGADO MATERIAL EN EL DOMICILIO.

De ésta obra de Baños con descarga domiciliaria, quedó pendiente verificar el domicilio del beneficiario Miriam Haide Rodriguez Guevara, con dirección Jesús Félix Holguín 1046 col. Presidentes en la localidad de Cd. Obregón. Ella fue beneficiada también con el apoyo de Cuarto-Dormitorio, por lo que se visitó al día siguiente, el 03 de noviembre, cuando se hizo el recorrido por los Cuartos-Dormitorios de la localidad de Cd. Obregón.

El día 03 de noviembre de 2022, me reuní de nuevo, en la localidad de Cd. Obregón, con la C. Blanca Estela Ayala Robles, Coordinadora Operativa Municipal, para realizar un recorrido por los trabajos correspondientes a la obra "C-00075/0799 Construcción de Cuartos-Dormitorio en varias localidades del Municipio de Cajeme". El Ing. Francisco Toledo (el Contratista) no pudo acompañarnos por compromiso de trabajo. La C. Blanca Ayala y yo nos dirigimos a las localidades de Francisco Villa y Cd. Obregón. Los domicilios de los beneficiarios visitados se muestran en la siguiente tabla:

CIUDAD OBREGÓN

BENEFICIARIO	DOMICILIO	OBSERVACIONES
CRUZ LOPEZ ALONSO	MARMOL 1769 CP 85097 VALLE VERDE	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE VEN MATERIALES EN EL LUGAR.
FRANCISCA ALONSO GUTIERREZ	MARMOL 1868 CP 85097 VALLE VERDE	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU HIJO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
de SONORA

BERNARDINA CARO LOPEZ	LAPIZLAZULI 1819 CP 85097 VALLE VERDE	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HA ENTREGADO MATERIAL EN EL DOMICILIO.
ROXANA CORTÉZ SOTO	PASEO DE LAS PALMAS 133 CP 85195 MAXIMILIANO R LOPEZ	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU MAMÁ, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.
GUADALUPE MORENO AGUILAR	BUGAMBILIAS 1015 CP 85195 CUAUHEMOC CARDENAS	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HA ENTREGADO MATERIAL EN EL DOMICILIO.
CLAUDIA GUADALUPE LEYVA MORENO	BUGAMBILIAS 624 CP 85195 CUAUHEMOC CARDENAS	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU HIJA, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.
GLORIA YUBITZA AMADO RAMOS	DEMOCRACIA 1137 CP 85195 LOS PRESIDENTES	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, YA SE INICIARON LOS TRABAJOS, YA ESTÁ HECHA LA EXCAVACIÓN. YA HAY BLOCK, Y CEMENTO EN EL DOMICILIO. AQUÍ ESTABA EL SOBRESTANTE DEL CONTRATISTA, ME PRESENTÉ CON ÉL Y MEDIMOS LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACION.
MARIA DEL CARMEN MUÑOZ SEPULVEDA	RAUL AYALA 6720 CP 85193 PRESIDENTES	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, YA SE INICIARON LOS TRABAJOS, YA SE HIZO EL TRAZO DEL CUARTO. YA HAY BLOCK, Y CEMENTO EN EL DOMICILIO.
MIRIAM HAIDE RODRIGUEZ GUEVARA	JESUS FELIX HOLGUIN 1046 CP 85195 PRESIDENTES	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU MAMÁ, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS DEL BAÑO Y DEL CUARTO, NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.
MERCEDES ROMANA VEGA X	DR. ALFONSO HERNANADO 1002 CP 85195 LOS PRESIDENTES	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, YA SE INICIARON LOS TRABAJOS, YA SE HIZO EL TRAZO DEL CUARTO. NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.
BLANCA RUBY MARQUEZ CALDERON	DR. ALFONSO HERNANADO 1003 CP 85195 LOS PRESIDENTES	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, AÚN NO SE INICIAN





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

		LOS TRABAJOS, NO SE VEN MATERIALES EN EL LUGAR.
RAYMUNDO ANTONIO VALENZUELA ALVAREZ	ANGEL GUTIERREZ 1225 CP 85195 LOS PRESIDENTES	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU MAMÁ, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.
LILIANA PATRICIA VIZCARRA RUIZ	ARMANDO JESUS 1219 CP 85195 LOS PRESIDENTES	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, YA SE INICIARON LOS TRABAJOS, ESTABAN 2 PERSONAS HACIENDO LA EXCAVACIÓN. YA HAY BLOCK, CEMENTO Y VARILLAS EN EL DOMICILIO. COMENTÉ CON LOS TRABAJADORES LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN, LES INDIQUÉ QUE AMPLIARAN LA EXCAVACIÓN A LA DIMENSIÓN QUE INDICA EL PROYECTO Y QUE TAMBIÉN RESPETARAN LA PROFUNDIDAD QUE MARCA EL PLANO.

FRANCISCO VILLA

BENEFICIARIO	DOMICILIO	OBSERVACIONES
YOLANDA RUIZ MARTINEZ	MATAMOROS S/N CP 85205 GUSTAVO DIAZ ORDAZ	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HA ENTREGADO MATERIAL EN EL DOMICILIO.
MARIA DE JESUS BELTRAN TALLA	JUAN MACHADO S/N CP 85205 GUSTAVO DIAZ ORDAZ	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU HERMANA, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.
EDUARDO EFREN RODRIGEZ GUTIERREZ	20 DE NOVIEMBRE S/N CP 85205 GUSTAVO DIAZ ORDAZ	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, NOS ATENDIÓ SU ESPOSA, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HAN ENTREGADO MATERIALES.





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**  
GOBIERNO  
DE SONORA



El día **viernes 04 de noviembre**, continué yo solo el recorrido por los Cuartos-Dormitorio en la localidad de Cd. Obregón, que quedaron pendientes el día de ayer. Los domicilios visitados fueron los siguientes:

CIUDAD OBREGÓN

BENEFICIARIO	DOMICILIO	OBSERVACIONES
GONZALO MENDOZA CERVANTES	FELIPE ANGELES 2058 CP 85050 CAJEME	BENEFICIARIO SE IDENTIFICÓ CON SU INE, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE HA ENTREGADO MATERIAL EN EL DOMICILIO. EL BENEFICIARIO SOLICITÓ CAMBIO EN LA UBICACIÓN DEL CUARTO.
EDGAR ARTURO GASTELUM YEPIZ	PAULONIA 2709 CP 85020 BELTRONES	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, NO SE VEN MATERIALES EN EL LUGAR.
MARIA ESTHER ROJAS QUEZADA	CARDENAL 6714 CP 85195 ESPERANZA TIZNADO	NO ESTABA EL BENEFICIARIO EN SU DOMICILIO, AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS, HAY GRAVA Y ARENA AFUERA DEL DOMICILIO.

Seguidamente, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

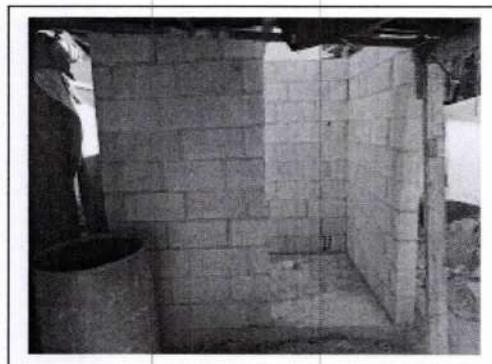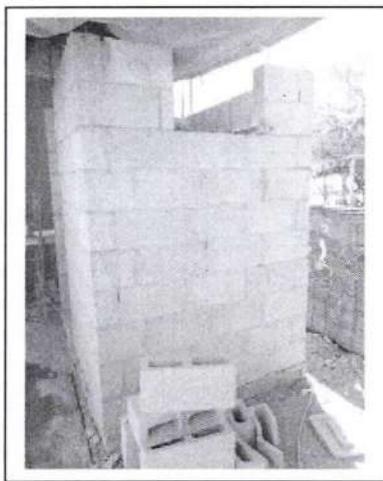



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

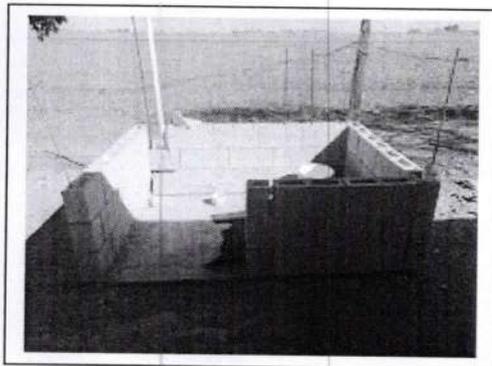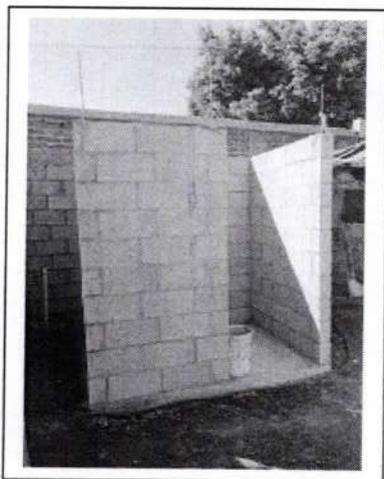

ATENTAMENTE,

---

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio  
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS**

Hermosillo, Sonora, 25 de octubre de 2022

**SERGIO ARTURO MEZA RUBIO  
PRESENTE.-**

Con el propósito de :

**SUPERVISION DE OBRA 2022**

Se le comisiona a:

**CAJEME ( LOCALIDADES), SONORA**

Durante el ( los ) día ( s ) 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2022

**Vehículo No. 54**

Marca FORD

Placas VC-31 204

Modelo 2005

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	<b>220 LTS.</b>
CASSETAS:	<b>\$264.00</b>
GASOLINA:	<b>\$0.00</b>

**ATENTAMENTE**

*Lourdes Lorena Rojo Cruz*  
**LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION**

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



*01/11/22*  
*[Firma]*
