

Hermosillo, Sonora; a 29 de noviembre de 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIDO
01 DIC 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE. –

En referencia al **aviso de comisión con fecha del 18 de noviembre de 2022**, mediante el cual se me comisionó el día **24 y 25 de noviembre de 2022 al municipio de Álamos** con la finalidad de realizar el seguimiento al programa de vivienda FISE 2022 de la obra C-00075/0810 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos del contrato SEDESSON-FISE-2022-048. Y C-00075/0749 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos del contrato SEDESSON-FISE-2022-026.

El día jueves 24 salimos al municipio de Álamos, llegamos al ayuntamiento con el director de Obras Públicas el ing. Gustavo Coss Figueroa, por atención hacia el municipio y a comentarle cómo va el avance de las obras, también a invitarlo al recorrido de supervisión con nosotros, siendo así comenzamos el recorrido con el encargado de las obras. El ing. Alfonso Ibarra, comenzamos a ver las viviendas de Álamos cabecera, de la obra C-00075/0810 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos. Las cuales son 4 presentando dos con pegado de block y dos planchas. De ahí vimos la de El Tezal, la cual está en pegado de block. Ahí mismo en cabecera vimos las de la obra C-00075/0749 las cuales son 5 viviendas, presentando pegado de muro de block se tomaron medidas y fotos, se habló con el contratista sobre tiempos de contrato y calidad de los trabajos, así como implementar más mano de obra, para cumplir con los tiempos. Presentando un avance del 15%. El día viernes 25 salimos a la localidad de Basiroa del municipio de Álamos de la obra C-00075/0810 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos. Aquí se observó en el trabajo de planchas en 8 viviendas de las 11 de esta localidad tomamos fotos y hablamos con los beneficiarios. Presentando la obra completa 25%. En el camino de regreso, visitamos 4 viviendas que estaba cerca, del municipio de Navojoa de la localidad de Choacalle de la obra C-00075/0762 construcción de cuarto dormitorios en varias localidades del municipio de Navojoa. Del contrato SEDESSON-FISE-2022-026, se observó 4 viviendas que presentaban, levantamiento de muros, losa, cadena y pintura se tomaron fotos y medidas y también se habló con el encargado y con los contratistas de ambas obras sobre los detalles de las viviendas y los tiempos nuevamente.



662 108 37 37
662 108 37 49



sedesson@sonora.gob.mx




Paseo Río Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Río Sonora

ATENTAMENTE. -

Alexia Rendón
Ing. Alexia Nickole Rendón Grijalva
Jefe de departamento

REPORTE FOTOGRÁFICO

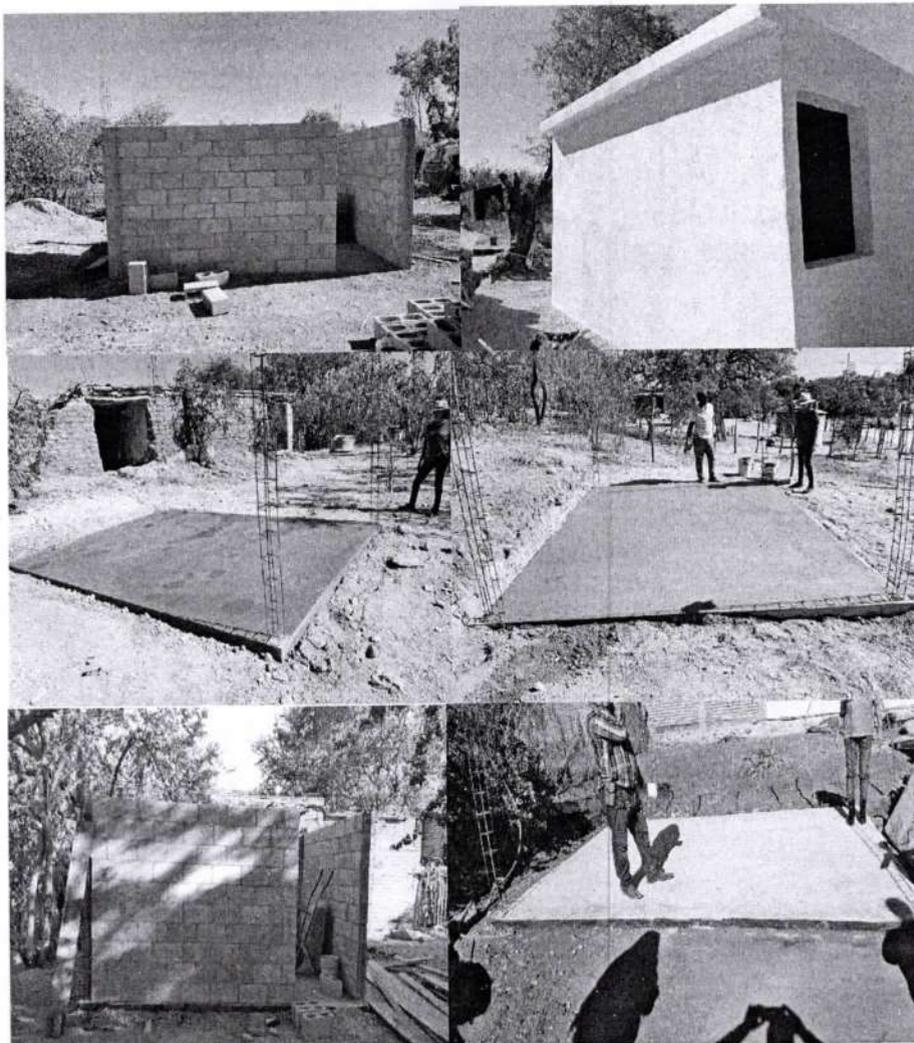

662 108 37 37
662 108 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Río Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Río Sonora



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

HERMOSILLO, SONORA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

ALEXIA NICKOLE RENDÓN GRIJALVA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022 DE LA OBRA C-00075/0810 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-048 Y C-00075/0749 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-026.

Se le comisiona a:

ALAMOS, SONORA.

Durante el (los) día (s) 24 **NOVIEMBRE** AL 25 DE **NOVIEMBRE** DE 2022

Vehículo No. 107

Marca NISSAN


Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE


LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO Y RURAL
ALAMOS SONORA

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado
