

2843-I



Hermosillo, Sonora a 05 de diciembre de 2022

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. -

En atención al aviso de comisión con fecha del 24 de noviembre de 2022, con ruta de traslado del 29 al 30 de noviembre de 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión de obras en proceso y verificar proyectos ya terminados, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022, asesorar a los municipios en la planeación de sus proyectos antes del cierre 2022 de la MIDS y recabar evidencia fotográfica.

LUGAR DE COMISIÓN: Municipios de Caborca y Pitiquito, Sonora.

CABORCA

En ésta localidad me recibió la C. Martha Elba Alonso Valdivia, encargada de capturar la información en la MIDS. Comenté con ella sobre la muy próxima fecha de cierre de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), que era el 4 de diciembre, así como la importancia de cumplir al 100% con la planeación del recurso FISMDF 2022, ya que el recurso no planeado en la MIDS antes de la fecha mencionada, tendrá que ser devuelto a la Tesorería de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Así mismo, comenté con la C. Martha Alonso, que el objetivo principal de mi visita era apoyarlos en la planeación de sus proyectos, me dijo que ella y la C. Verence Romero Murrieta, estaban trabajando en la captura de proyectos simultáneamente en sus computadoras. Por lo que la C. Martha Alonso y yo decidimos que mientras la C. Verence Romero continuaba con la captura de proyectos en la MIDS, ella y yo iríamos a recabar las firmas en las actas de entrega recepción de proyectos ya terminados, que yo llevaba elaboradas previamente. Enseguida la C. Martha Elba Alonso Valdivia, el C. Luis Alberto Barajas Molina y yo, nos dirigimos a hacer un recorrido por las obras terminadas, para recabar las firmas de los beneficiarios. Las actas de entrega recepción recabadas con firma del beneficiario son:

ID 174594 Equipamiento de 25 depósitos de agua entubada de 600 lts. en diferentes ubicaciones en H. Caborca en la Ciudad de Caborca Sonora. Monto planeado \$ 178,214.85, plazo de ejecución: del 15/08/2022 al 05/09/2022. El proyecto consta de 25 tinacos en diferentes viviendas, de los cuales se visitaron solo 14 por cuestión de tiempo, presentando éstos un avance del 100%.

ID 214813 Construcción de 5 techos firme de concreto en diferentes ubicaciones de H. Caborca en la Ciudad de Caborca Sonora. Monto planeado \$ 346,62.56, plazo de ejecución: del 20/09/2022 al 31/10/2022, porcentaje de avance de obra: 100%.

ID 260684 Construcción de guarniciones en calle 18 en la Colonia Deportiva de H. Caborca de ésta Ciudad de Caborca Sonora. Monto planeado: \$115,839.06, plazo de ejecución: del 10/10/2022 al 23/11/2022, porcentaje de avance de obra: 100%.

ID 261287 Construcción de red de agua potable en calle 18 en la Colonia Deportiva de H. Caborca de ésta Ciudad de Caborca Sonora. Monto planeado: \$110,762.69, plazo de ejecución: del 10/10/2022 al 23/11/2022, porcentaje de avance de obra: 100%.








SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ID 261549 Construcción de red de alcantarillado en calle 18 en la Colonia Deportiva de H. Caborca de ésta Ciudad de Caborca Sonora. Monto planeado: \$139,959.96, plazo de ejecución: del 10/10/2022 al 23/11/2022, porcentaje de avance de obra: 100%.

ID 290916 Construcción de 3 pisos firme de concreto en diferentes colonias en H. Caborca en la Ciudad de Caborca Sonora. Monto planeado \$ 60,462.96, plazo de ejecución: del 24/10/2022 al 13/11/2022, porcentaje de avance de obra: 100%.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

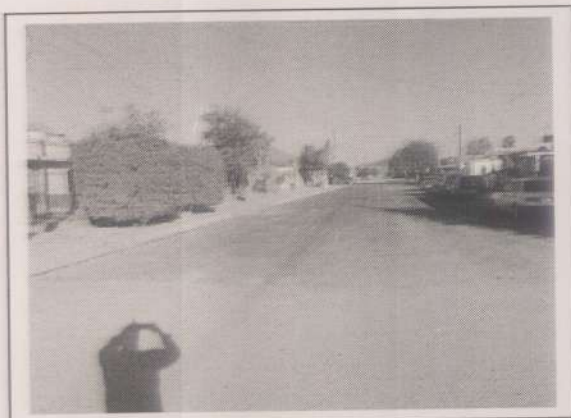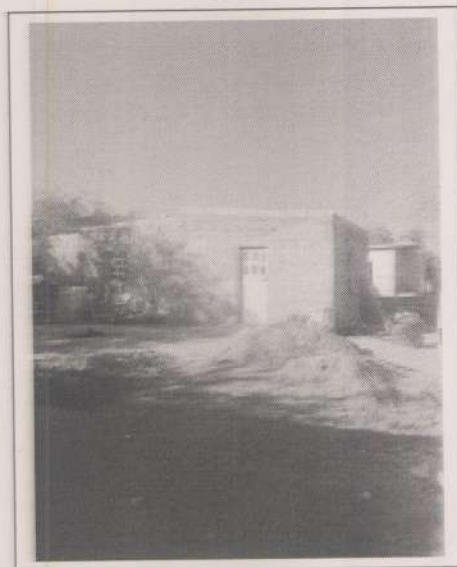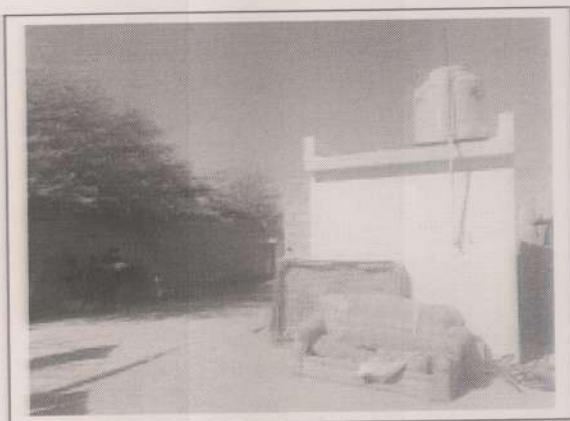

PITQUITO

En la localidad de Pitiquito me recibió y atendió la Ing. Lester María Ruiz, Directora de Obras Públicas del Municipio. Comenté con ella también, sobre la muy próxima fecha de cierre de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), que era el 4 de diciembre, así como la importancia de cumplir al 100% con la planeación del recurso FISMDF 2022, ya que el recurso no planeado en la MIDS antes de la fecha mencionada, tendrá que ser devuelto a la Tesorería de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Le pregunté sobre el desfaldo que sufrieron en sus cuentas municipales, si ya habían informado a la DGDR, ella me dijo que si habían informado a la DGDR. Para que nos informara sobre el tema le habló al C. Adrián Gerardo Rodríguez Ortega, Tesorero Municipal. Él comentó que ya habían dado parte a las diferentes instancias correspondientes. Comentó también que en una reunión que tuvieron en Hermosillo, con autoridades de Hacienda, aprovechó para exponerles el asunto del desfaldo sufrido en el Municipio de Pitiquito. Comentó que le dieron 2 opciones para resolver la situación, una declararse incompetentes para pagar y la otra utilizar los recursos extraordinarios que están esperando ingresen a la cuenta del Municipio, para reponer el recurso faltante por el desfaldo. Yo les recomendé que planearan en la MIDS solo el recurso que tuvieran disponible.

Posteriormente, ya que terminamos la reunión, comenté con la Ing. Lester Ruiz, que el objetivo principal de mi visita era apoyarlos en la planeación de sus proyectos, por lo que nos dispusimos a trabajar en la planeación de proyectos en la MIDS. Los proyectos que planeamos en la MIDS fueron los siguientes:

ID 353226 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PITQUITO. Monto planeado \$ 659,682.63, plazo de ejecución: del 30/05/2022 al 28/06/2022, porcentaje de avance de obra: 100%.

SIN ID PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE PLAZA PUBLICA EN COMISARIA DE PUERTO LIBERTAD MUNICIPIO DE PITQUITO SONORA. Monto planeado \$ 755,201.51, plazo de ejecución: del 01/08/2022 al 01/10/2022, porcentaje de avance de obra: 100%. Éste proyecto no se logró capturar, después de ingresar toda la información, al final el sistema no permitía guardar la información.

Por comentarios de la Ing. Lester Ruiz, en las oficinas del Municipio cuentan con un servicio de internet mucho muy lento y esto aunado a que en éstas fechas la MIDS está saturada, por la cercanía de la fecha de cierre. Todo ésto hizo imposible continuar con la planeación. La Ing. Lester se comprometió a continuar la captura de proyectos en su casa y terminar al 100% la planeación antes del 4 de diciembre, fecha de cierre de la MIDS para captura.

Posteriormente me dispuse a regresar a Hermosillo, Sonora.

ATENTAMENTE:


Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 24 de Noviembre del 2022

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

APOYO A LOS MUNICIPIOS EN LA PLANEACION DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSO DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2022

Se le comisiona a:

CABORCA, PITIQUITO, SONORA

Durante el (los) día (s) 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 100

Marca NISSAN


Modelo 2017

Placas WEP-489-A

Tipo TSURU

CONTROL NET:	150 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE


LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

