

HERMOSILLO, SONORA A 19 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **SUAQUI GRANDE, SAN JAVIER, BACANORA Y ARIVECHI, SONORA**, CON UNA PROGRAMACION: **DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022**, ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE

PROPOSITO DE COMISIÓN: REALIZAR ARRANQUE DE LA OBRA No. C-00075/0781-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, SONORA.

DESTINO DE LA COMISION: LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA

PERIODO DE COMISION: 05 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: SE VISITARON 12 VIVIENDAS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA LA SUPERVISION DE AVANCES FISICO DE LA MISMA, ENCONTRANDO 7 VIVIENDA HASTA ENRASE CON APLANADOS GRUESO EN MUROS CON PISO FIRME, 2 VIVIENDAS CON EXCAVACION SOLAMENTE, 1 VIVIENDA HASTA CADENA DE DESPLANTE CON PISO FIRME, 2 VIVIENDAS CON MUROS EN 5 HILADAS, PARA UN AVANCE FISICO DEL 65%

NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE ATENDIO AL COMISIONADO: NO FUIMOS ACOMPAÑADOS POR NADIE DEL MUNICIPIO

ATENTAMENTE

JESUS CONCEPCION VALENCIA MORENO
COORDINADOR TECNICO

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIDO
10 ENE 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

HERMOSILLO, SONORA A 19 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **SUAQUI GRANDE, SAN JAVIER, BACANORA Y ARIVECHI, SONORA**, CON UNA PROGRAMACION: **DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022**, ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

MUNICIPIO DE SAN JAVIER

PROPOSITO DE COMISIÓN: REALIZAR ARRANQUE DE LA OBRA No. C-00075/079-CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA.

DESTINO DE LA COMISION: LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA

PERIODO DE COMISION: 06 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: NO SE PUDO VISITAR MUNICIPIO DE SAN JAVIER YA QUE EL CARRO ASIGNADO PARA DICHA COMISION SE DESCOMPUSO EN TRAYECTO HERMOSILLO LA COLORADA, POR LO QUE FUE SUSPENDIDA DICHA COMISION POR NO CONTAR CON VEHICULO ADECUADO PARA REALIZAR EL TRABAJO.

NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE ATENDIO AL COMISIONADO: NADIE NOS ACOMPAÑO

ATENTAMENTE



JESUS CONCEPCION VALENCIA MORENO
COORDINADOR TECNICO

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



HERMOSILLO, SONORA A 19 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **SUAQUI GRANDE, SAN JAVIER, BACANORA Y ARIVECHI, SONORA**, CON UNA PROGRAMACION: **DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022**, ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

MUNICIPIO DE BACANORA

PROPOSITO DE COMISIÓN: REALIZAR ARRANQUE DE LA OBRA No. C-00075/0789-CONSTRUCCION DE CUARTOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA.

DESTINO DE LA COMISION: SE VISITARON LAS LOCALIDADES DEL BACANORA Y EL DESTACAMENTO, MUNICIPIO DE BACANORA, SONORA

PERIODO DE COMISION: 07 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: SE VISITARON 10 VIVIENDAS, 5 EN LA LOCALIDAD DE BACANORA Y 5 EN LA LOCALIDAD DE EL DESTACAMENTO, PARA DARLE SEGUIMIENTO FISICO, ENCONTRANDO 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL DESTACAMETO CON CADENA DE DESPANTE Y PISO FIRME, ASI COMO EN LA LOCALIDAD DE BACANORA SE ENCONTRO 5 VIVIENDAS HASTA CADENA DE DESPANTE CON PISO FIRME, PARA UN AVANCE FISICO DEL 25%

NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE ATENDIO AL COMISIONADO: NOS ACOMPAÑO EL ING. HECTOR PARRA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

ATENTAMENTE

JESUS CONCEPCION VALENCIA MORENO
COORDINADOR TECNICO

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL

HERMOSILLO, SONORA A 19 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
P R E S E N T E. -

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **SUAQUI GRANDE, SAN JAVIER, BACANORA Y ARIVECHI, SONORA**, CON UNA PROGRAMACION: **DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022**, ME PERMITO INFORMARLE LO SIGUIENTE: SE VISITÓ LOS MUNICIPIOS COMISIONADOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO.

MUNICIPIO DE ARIVECHI

PROPOSITO DE COMISIÓN: REALIZAR ARRANQUE DE LA OBRA No. C-00075/0793-CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE TARACHI DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA.

DESTINO DE LA COMISION: SE VISITO LA LOCALIDAD DE TARACHI, MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA

PERIODO DE COMISION: 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: SE VISITARON 10 VIVIENDAS PARA REALIZAR SUPERVISION FISICA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE TARACHI, ENCONTRANDO 5 MODULOS SANITARIOS HASTA ALTURA DE BLOCK DALA, 3 MODULOS SANITARIOS CON LOSA DE CONCRETO E INSTALACIONES DE TUBERIAS PVC SANITARIO PARA WC, LAVABO Y REGADERA, 2 MODULOS CON EXCAVACION PARA DESPLANTE SOLAMENTE, PARA UN AVANCE FISICO DEL 55%

NOMBRE Y CARGO DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO QUE ATENDIO AL COMISIONADO: NOS ACOMPAÑO EL ING. HECTOR PARRA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.


ATENTAMENTE


JESUS CONCEPCION VALENCIA MORENO
COORDINADOR TECNICO

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL

REPORTE FOTOGRAFICO

EN REFERENCIA AL **AVISO DE COMISION** CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE ME COMISIONÓ A LOS MUNICIPIOS DE: **SUAQUI GRANDE, SAN JAVIER, BACANORA Y ARIVECHI, SONORA,**

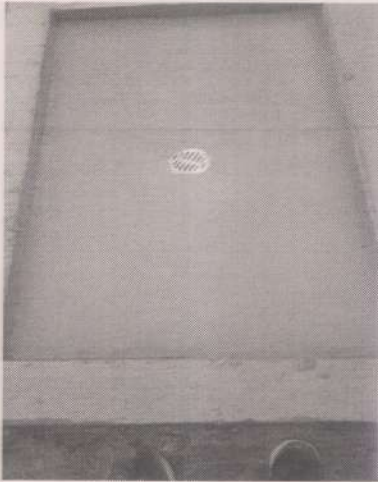

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE BACANORA
ESTADO DE SONORA
2021-2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

HERMOSILLO, SONORA. 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

C. JESUS CONCEPCION VALENCIA MORENO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REALIZAR SUPERVISION FISICA DE LAS OBRAS: C-00075/0779 CONSTRUCCION DE CUARTOS EN LOCALIDAD DE SAN JAVIER, C-00075/0781 CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, C-00075/0789 CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE BACANORA, C-00075/0793 CONSTRUCCION BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDADE DE TARACHI, MUNICIPIO DE ARIVECHI, SONORA.

Se le comisiona a:

SUAQUI GRANDE, SAN JAVIER, BACANORA Y ARIVECHI, SONORA.

Durante el (los) día (s) 5 DE DICIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 109

Marca NISSAN


Placas VD-64-441

Modelo 2017

Tipo NP 300

CONTROL NET:	250 LITROS
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE


LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

