



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

2897-I

Hermosillo, Sonora; a 18 de enero de 2023

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA BASICA
P R E S E N T E. -

En referencia a la solicitud de viáticos para la comisión del día **06 de enero** del presente año a los municipios de Empalme, La Colorada y Hermosillo, Sonora. En el periodo del **13 al 16 de diciembre del 2022**, Para las obras de Vivienda del programa **FISE 2022**.

OBJETIVOS: Se Realizará visita de supervisión a las obras de vivienda del programa **FISE 2022**.

LOCALIDADES: Santa María de Guaymas, José María Morelos, Maytorena, La Palma y San Fernando Empalme. Tecoripa, San José de Pima y La Colorada. Poblado Miguel Alemán y Ejido Plan de Ayala. San Bartolo, Poblado Miguel Alemán, Plan de Ayala y Hermosillo.

RESULTADOS:

13 y 14 de diciembre de 2023

Se realizó recorrido de supervisión a la obra **C-00075/0808 construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades de Hermosillo, municipio de Hermosillo**, se inició el recorrido por San Bartolo la cual se encontró a nivel de muros con un 85%, se continua con la obra **C-00075/0808 construcción de baño con descarga domiciliaria en la localidad de Hermosillo**, con apenas 10% en el Poblado Miguel Alemán a las 8 acciones de vivienda las cuales se encuentran al momento de la visita avances hasta nivel de muros, con un avance del 70%. Nos dirigimos al Ejido Plan de Ayala ahí son 9 acciones de vivienda las cuales se encuentran a nivel de losa de vigueta y casetón con un avance del 65%,

Nota: de manera general la obra se encuentra a un 75% de avance.

15 de diciembre de 2023

se realizó recorrido de supervisión a la obra **C-00075/0803 construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades de La Colorada, municipio de La Colorada**, se inició el recorrido por la cabecera municipal de La Colorada a las 5 acciones de vivienda las cuales se encuentran al momento de la visita avances hasta nivel de muros, con un avance del 55%. Nos dirigimos a la localidad de San José de Pima son 2 acciones de vivienda las cuales se encuentran a nivel de muros con un avance del 60%, las 4 acciones de vivienda de la comunidad de Tecoripa tienen avance en trazo, excavación, plantilla, zapata corrida, muro de enrase y cadena de desplante, con un avance del 35%.

Nota: de manera general la obra se encuentra a un 50% de avance.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIDO
R 20 ENE 2023 **O**

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

16 de diciembre de 2023

se realizó recorrido de supervisión a la obra **C-00075/0807 construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades de Empalme, municipio de Empalme**, se inició el recorrido por Santa María de Guaymas donde se encontraron las viviendas a nivel de cadena de desplante, me dirigí a la localidad de José María Morelos (la Atravesada), donde había avance hasta nivel de muro con un 55% de avance, en las localidades de Maytorena, La Palma y San Fernando en la cual también se encontró que las viviendas estaban a nivel de cadena.

Nota: de manera general la obra se encuentra a un 50% de avance

- **Se anexan fotos**

ATENTAMENTE.-

ING. CARLOS DAVID HERNANDEZ MEDINA
SUPERVISOR DE AREA







SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**



POBLADO MIGUEL ALEMAN Y PLAN DE AYALA

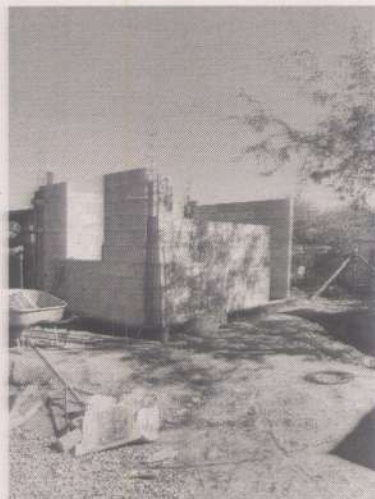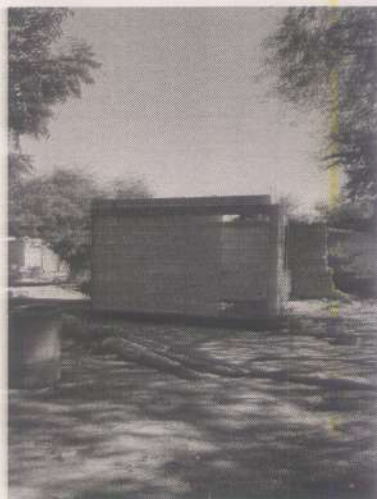

EMPALME


J





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

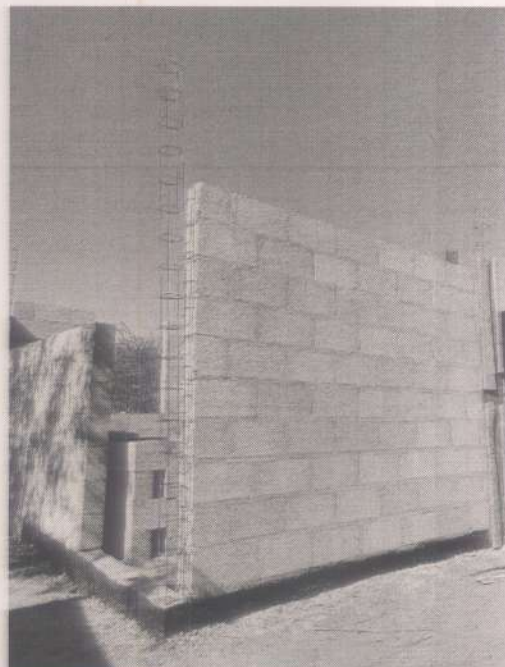

LA COLORADA



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**



SAN BARTOLO



BAÑOS HERMOSILLO


SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

HERMOSILLO, SONORA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

CARLOS DAVID HERNÁNDEZ MEDINA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARA VISITA DE SUPERVISION PARA LOS AVANCES DE LAS OBRAS: C-00075/0807 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME, C-00075/0808 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO, C-00075/0808 CONSTRUCCION DE BAÑO CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, C-00075/0803 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA COLORADA PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA FISE 2022.

Se le comisiona a:

EMPALME, LA COLORADA Y HERMOSILLO (POBLADO MIGUEL ALEMAN, PLAN DE AYALA Y SAN BARTOLO), SONORA.

Durante el (los) día (s) 13 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 104

Marca NISSAN

Placas VD-64-442

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	140 Litros
CASSETAS:	
GASOLINÁ:	

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Intercedido

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA

