

Hermosillo, Sonora, a 03 de enero de 2023



ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE. –

En referencia al **aviso de comisión con fecha del 30 de noviembre de 2022**, mediante el cual se me comisionó el día **martes 13 al viernes 16 de diciembre de 2022** a los municipios de **Navojoa y Álamos**, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: realizar el recorrido de seguimiento de supervisión al programa de vivienda FISE 2022 de la obra C-00075/0749 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos, C-00075/0762 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa del contrato SEDESSON-FISE-2022-026.C-00075/0810 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos y C-00075/0774 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa y C-00075/0796 Construcción de baños con biodigestor en la localidad de Fundición, municipio de Navojoa del contrato SEDESSON-FISE-222-048.

Lugar de comisión: Álamos (varias localidades), Navojoa (varias localidades), Sonora.

El día **martes 13 de diciembre** nos trasladamos el Ing. José Emmanuel Orozco Aispuro Director de Infraestructura Básica y yo a pernoctar al municipio de Navojoa, ya que por instrucciones del Ing. Emmanuel Orozco y la Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó encargada de despacho de la dirección general de infraestructura básica salimos después de mediodía por cuestiones de pendientes de firmas de estimaciones.

El día **miércoles 14 de diciembre** en la mañana antes de comenzar a supervisar y como pernoctamos en este municipio fuimos al ayuntamiento de Navojoa a sellar el aviso de comisión ya que nos quedaba muy cerca del ayuntamiento, sellamos y avisamos que estaríamos en recorrido de los 2 contratos en este municipio. Al salir del ayuntamiento y por cuestión de agilizar el día optamos por comenzar el recorrido en el municipio de Álamos, ya que las localidades en ambos contratos a visitar están muy alejadas unas de otras y al terminar se recorrería Navojoa. En compañía del encargado de la obra el ing. Elías Alfonso Ibarra Amarillanes nos trasladamos al municipio de Álamos, para comenzar la supervisión de la obra C-00075/0749 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos. Del contrato SEDESSON-FISE-2022-026. De esta obra en la localidad de Álamos cabecera son 5 viviendas. Las cuales visitamos la casa de Edith Guadalupe Muñoz presentando avance en levantamiento de muro y enjarre. Petra Aguilar con avance de levantamiento

de muros y enjarres. Marisela López con levantamiento de muros, Rosa Irene Reyes con plancha de cimentación y material listo para comenzar el pegado de block y Gerardo Arias con levantamiento en muros. De la obra C-00075/0810 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos, del contrato SEDESSON-FISE-2022-048. De esta obra en la localidad de Álamos cabecera son 4 viviendas visitamos a Cristina Escalante presentando avance en levantamiento de muros. Jazmín Guadalupe Duarte con levantamiento de muros. Claudia Judith Gutiérrez levantamiento de muros. Justina Carrizoza levantamiento en muros. Y una vivienda en la localidad El Tezal Yoshiris del Carmen, con muros y en proceso de enjarres.

Terminando de visitar las de cabecera de ambos contratos, nos trasladamos a las restantes de la obra C-00075/0810 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos. Contrato SEDESSON-FISE-2022-048. A la localidad de Basiroa, visitamos a Alejandra Burrola presentando avance en plancha de cimentación. Rodolfo Valenzuela con plancha de cimentación. Beatriz Adriana con plancha de cimentación. Sara Evelia Valenzuela en proceso de levantamiento de muros. Santos Valenzuela levantamiento en muros, Rosalía Yocupicio con muros ya levantados. Candelario Yocupicio levantamiento en muro. Manuel de Jesús Valenzuela, María Antonia Santos Valenzuela y María Nilda Mendivil, con planchas de cimentación.

En la localidad de Los Muertos visitamos a José Martín Borbón, María del Rosario Valenzuela, Damacio Ávila, Dinora Argelia Estrella y Gerardo Morales. Todas las 6 viviendas presentan la plancha de cimentación.

Visitamos la localidad de Capitahuasa María Anselma Muñoz, también presentando plancha de cimentación. Siendo así fue recorrido todas las viviendas del contrato SEDESSON-FISE-2022-048. En todas las viviendas hablamos con los beneficiarios, así como nos comentaban las inquietudes sobre el avance y surtido de material. También en cada vivienda se realizó la medición y se comentó observaciones en el proceso de enjarre y adecuado pegado de block que estaban por comenzar. Así como los tiempos de contrato y la urgencia de contar con más mano de obra. Presentando un avance de 50%. Al terminar por cuestión de la hora nos regresamos a Álamos, al ayuntamiento, a sellar el aviso de comisión, no nos atendió personal del municipio ya que se encontraban en periodo vacacional.

El día jueves 15 en compañía del encargado de la obra el Ing. Elías Alfonso Ibarra Amarillanes íbamos camino a realizar el recorrido de la obra C-00075/0749 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos las 10 viviendas de la localidad de Guajaray y las 10 viviendas de la localidad de Los Estrados. Pero por instrucciones de la Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica la Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó procedimos regresarnos a la ciudad de Hermosillo, ya que era necesario estar el día viernes en la oficina para tramites y firmas necesarias nuestras de estimaciones, por lo cual no pudimos seguir con el recorrido quedando pendientes reprogramar la visita de la obra C-00075/0762 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa del

contrato SEDESSON-FISE-2022-026.C-00075/0810. Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa y C-00075/0796 Construcción de baños con biodigestor en la localidad de Fundición, municipio de Navojoa del contrato SEDESSON-FISE-222-048.

ATENTAMENTE.-


Alexia Rendón
Ing. Alexia Nickole Rendón Grijalva
Jefe de departamento

REPORTE FOTOGRÁFICO

C-00075/0749 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos.
Localidad Álamos y El Tezal




C-00075/0810 Construcción de Cuarto Dormitorio en varias localidades el municipio de Álamos.
Localidad Álamos

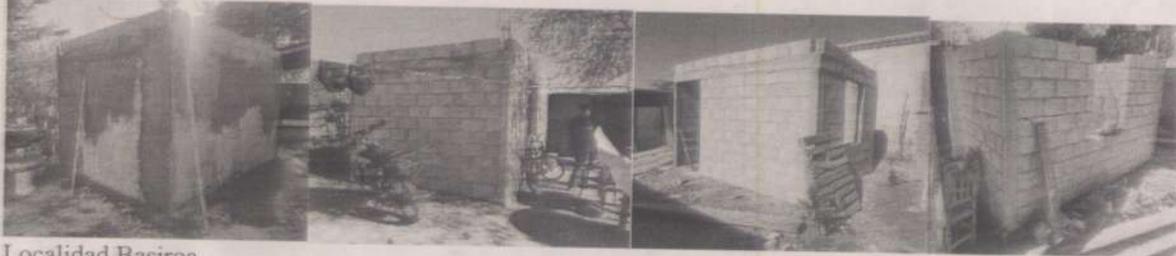

Localidad Basiroa



Localidad Los Muertos

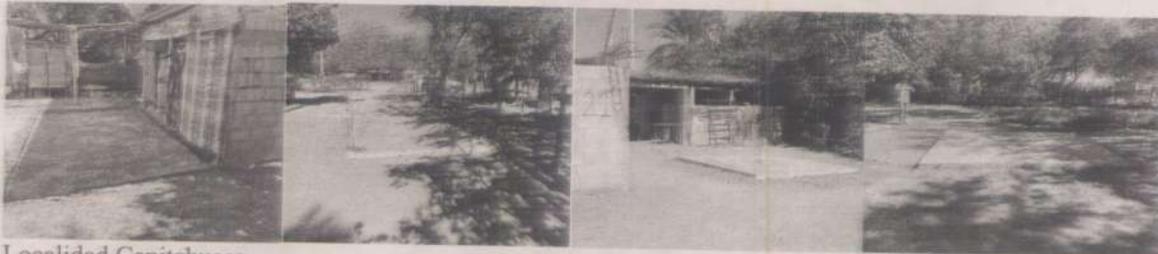

Localidad Capitahuasa



662 108 37 37
662 108 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Río Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Río Sonora



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

HERMOSILLO, SONORA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ALEXIA NICKOLE RENDÓN GRIJALVA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE-2022 DE LA OBRA C-00075/079 CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE ALAMOS Y C-00075/0762 CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA DL CONTRATO FISE-2022-026 Y C-00075/810 CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALAMOS Y C-00075/0774 CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA Y C-00075/0796 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE FUNDICION, MUNICIPIO DE NAVOJOA DEL CONTRATO FISE-2022-048.

Se le comisiona a:

ALAMOS Y NAVOJOA, SONORA

Durante el (los) día (s) 13 DE DICIEMBRE AL 16 DICIEMBRE DE 2022

Vehículo No. 103

Marca NISSAN

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo NP 300

CONTROL NET:	
CASSETAS:	
GASOLINA:	



ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

Diana Compey

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y ECOLOGIA
NAVOJOA, SONORA
