



Hermosillo, Sonora a 03 de mayo de 2022

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
PRESENTE. –

En atención al aviso de comisión con fecha del 21 de abril de 2022, con ruta de traslado del 27 al 29 de abril de 2022, me permito comunicarle lo siguiente:



OBJETIVO: Presentación como nuevo Supervisor y Asesor, Supervisión de obras en proceso y obras terminadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022, recabar evidencia fotográfica y actas de entrega recepción.


LUGAR DE COMISIÓN: Municipios de Trincheras, Átil, Altar y Puerto Peñasco.

ALTAR

Me recibió el C. Jorge Arsenio Espinoza Limón, Director de Obras Públicas. Me presenté como su nuevo Supervisor y Asesor en temas relativos al FAIS. Se le asesoró en cuanto a la captura de proyectos en la MIDS, también en el ingreso de la información en la MIDS, sobre los comités de Participación Social y sus anexos. Así mismo, se les hizo mención de la importancia de acreditar la pobreza extrema, descargando los Anexos III de sus proyectos, para que puedan migrar a la UED. Posteriormente, el C. Jorge Arsenio Espinoza Limón y el Ing. Rafael Luis Coronado, me acompañaron a dar un recorrido por las obras que están ingresadas en la MIDS. Se verificaron las siguientes obras:

ID 37728 Rehabilitación de pozo profundo de agua entubada en el Municipio de Altar, localidad del ejido Llano Blanco, monto planeado \$142,341.49, plazo de ejecución planeado del 04/04/2022 al 09/04/2022.

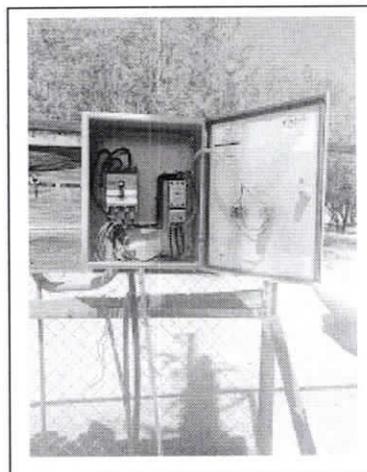
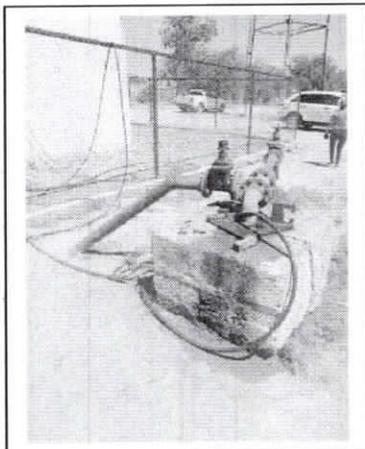




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ID 42279 Rehabilitación de Alumbrado Público en el Municipio de Altar, localidad del ejido Llano Blanco en varias calles, monto planeado \$96,234.91, plazo de ejecución planeado 01/04/2022 al 23/04/2022.

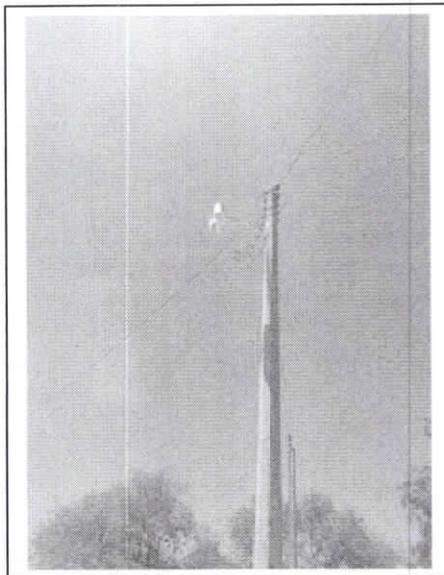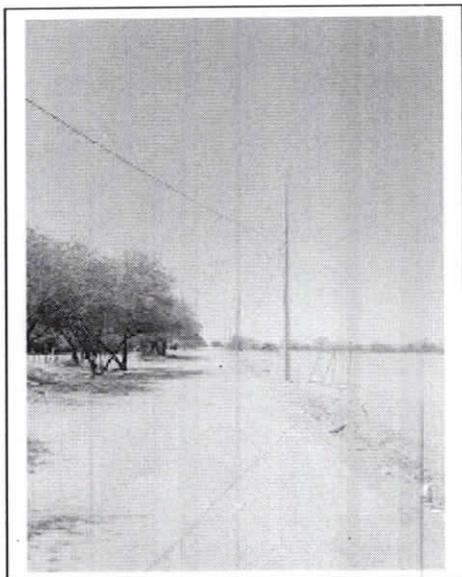

PUERTO PEÑASCO

En ésta localidad me recibió el Ingeniero José Luis Montijo Torres, Director de Obras del Municipio de Puerto Peñasco y la Ing. Guadalupe Barrera Acuña, Supervisor de Obra y encargada de ingresar la información en la MIDS. Me presenté como su nuevo Supervisor y Asesor en temas relativos al FAIS. Se tocaron temas como la importancia de promover que la población se involucre en los proyectos, conformando los comités de Participación Social. Así mismo, se habló de la importancia de acreditar la pobreza extrema, descargando los Anexos III de sus proyectos, para que puedan migrar a la UED. Se les asesoró en cuanto a la captura de proyectos en la MIDS. Posteriormente, el Ing. José Luis Montijo Torres, nos asignó a los Ingenieros Daniel Salazar y Alberto Casillas, Supervisores de Obra, para que me acompañaran a dar un recorrido por las obras en proceso y terminadas, que tienen ingresadas en la MIDS. Las obras verificadas fueron:



ID 59 Ampliación de Red de Energía eléctrica por calle Pavoreal entre derecho de vía y Avenida Ulises Irigoyen Colonia Brisas del mar en la localidad de Puerto Peñasco Municipio de Puerto Peñasco, monto planeado \$999,876.87, plazo de ejecución planeado 09/02/2022 al 25/03/2022.







SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

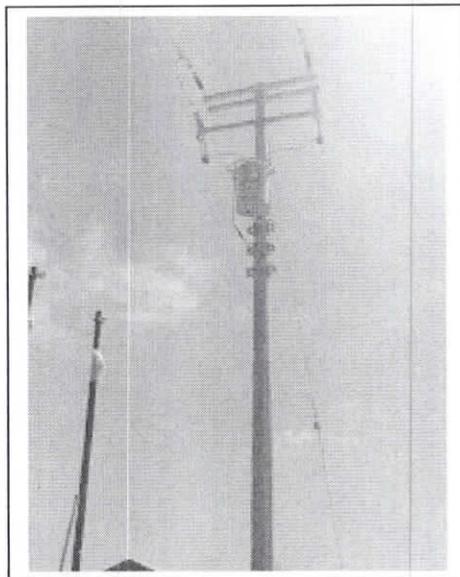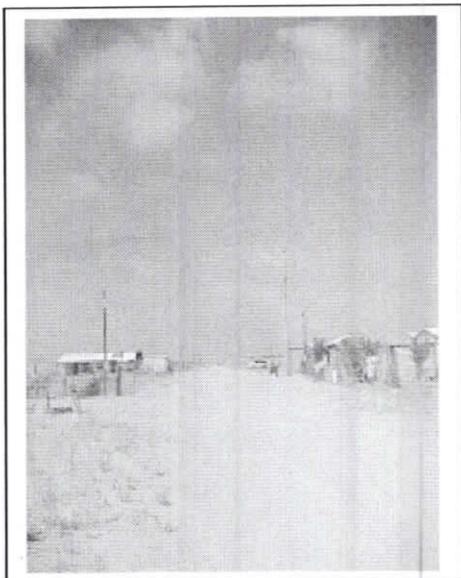

ID 587 Ampliación de Red de Energía eléctrica por calle Cacatúa entre Ave. Brisas del Mar y Ave. Constitución Colonia Brisas del Mar en la localidad de Puerto Peñasco Municipio de Puerto Peñasco Sonora, monto planeado \$334,403.70, plazo de ejecución planeado 11/02/2022 al 22/03/2022.

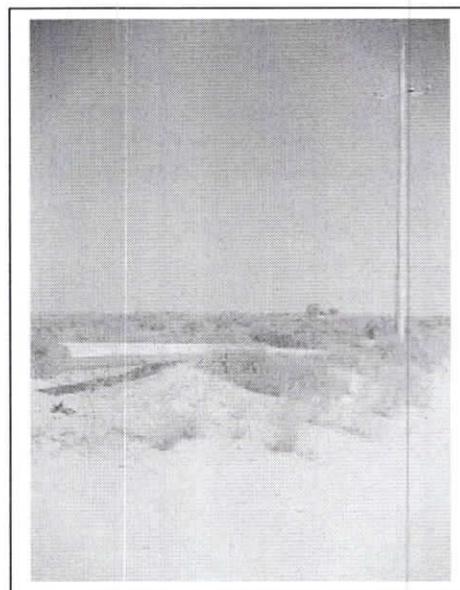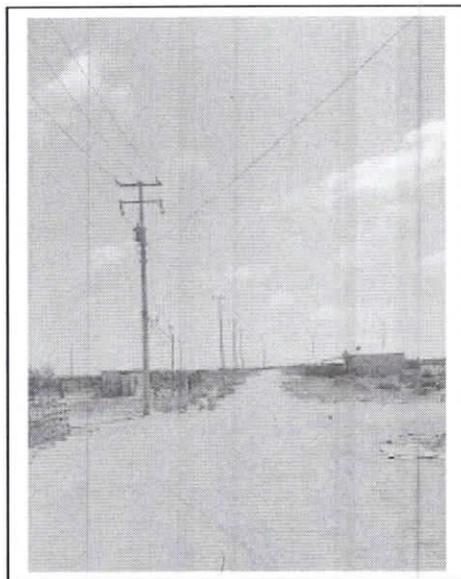




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

ID 1013 Cancha cívica en Escuela Secundaria Veintiuno ubicada en Ave. Sesenta y cuatro entre calle Río Santiago y calle Río Asunción Colonia San Rafael en la localidad de Puerto Peñasco Municipio de Puerto Peñasco Sonora, monto planeado \$965,063.52, plazo de ejecución planeado 15/02/2022 al 31/03/2022. Se obtuvo evidencia fotográfica de cada una de las obras.

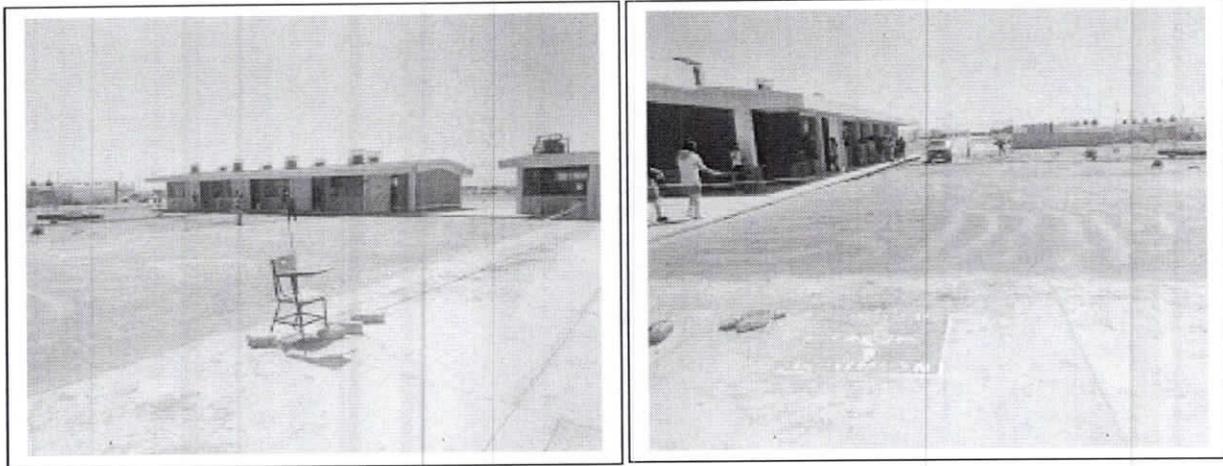

TRINCHERAS

En ésta localidad nos atendió el Ingeniero Jesús Ángel Murrieta Ochoa, Director de obras del Municipio de Trincheras. Me presenté como su nuevo Supervisor y Asesor del FAIS. Se vieron temas como la importancia de promover que la población se involucre en los proyectos, conformando los comités de Participación Social. Así mismo, se habló de la importancia de acreditar la pobreza extrema, descargando los Anexos III de sus proyectos, para que puedan migrar a la UED. También se le asesoró en cuanto a la captura de proyectos en la MIDS, de la misma manera se le asesoró sobre la solventación de las observaciones que tiene su proyecto en la MIDS. Posteriormente, el Ingeniero Jesús Ángel Murrieta Ochoa me acompañó a recorrer la obra que tienen ingresada en la MIDS. La obra verificada fue:



ID 48822 Rehabilitación de camino vecinal de dieciséis km en tramo de la localidad de Trincheras a El Ocuca y Treinta y cinco Km en tramo de Trincheras a Los Fresnos, monto planeado \$252,868.15, plazo de ejecución planeado 01/03/2022 al 15/03/2022. Se obtuvo evidencia fotográfica de la obra.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

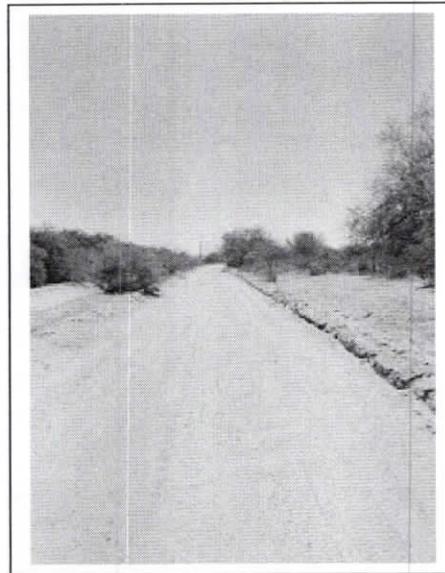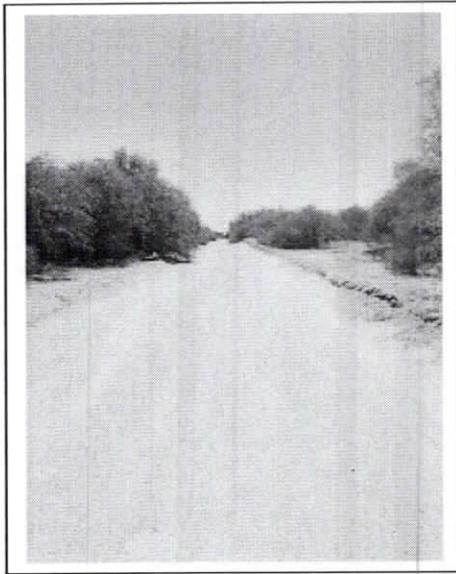

ÁTIL

En la localidad de Átil, fui recibido por el Ing. Ramón Edmundo Urías Celaya, Director de Obras Públicas. Me presenté como su nuevo Supervisor y Asesor en temas relativos al FAIS. Se le asesoró en cuanto a la captura de proyectos en la MIDS, también en el ingreso de la información en la MIDS, sobre los comités de Participación Social y sus anexos. Así mismo, se le asesoró sobre la solventación de las observaciones que tiene su proyecto en la MIDS y se le hizo mención de la importancia de acreditar la pobreza extrema, realizando y asociando las CUIS a sus proyectos, para que puedan migrar a la UED.

ATENTAMENTE.-

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL





XXIV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2021 - 2024

DIRECCION DE OBRA PUBLICA
Y DESARROLLO URBANO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS



DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
TRINCHERAS, SONORA

Hermosillo, Sonora, 21 de abril de 2022

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
PRESENTE .-

Con el propósito de :

PRESENTACION COMO NUEVO ENLACE, SUPERVISAR OBRAS EN PROCESO DEL FISMDF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL) 2022, RECABAR ACTAS ENTREGA-RECEPCION.

Se le comisiona a:

TRINCHERAS, ALTAR, ATIL Y PUERTO PEÑASCO, SONORA

Durante el (los) día (s) 27 AL 29 DE ABRIL DE 2022

Vehículo No. 103

Marca NISSAN

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	200 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 2021-2024

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS
ATIL, SONORA.

RECIBO
