

Hermosillo, Sonora, a 15 de marzo del 2023

**LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ**  
**ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION.**

En atención al aviso de comisión con fecha del 17 de enero del 2023, me permito comunicarle, que se me asigno esta ruta los días 18 al 19 de enero del 2023, donde se me comisiono a los municipios de Álamos y Navojoa.

**Objetivo:** fue realizar el recorrido de seguimiento de obra del programa de vivienda FISE 2022 de las siguientes obras:

Del Contrato SEESSON- FISE-2022-06

C-00075/0749 Es Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Álamos.

C-00075/0762 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Navojoa.

Del Contrato de SEDESSON-FISE-2022-048

C-00075/0810 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades de Álamos.

C-00075/0774 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades de Navojoa.

C-00075/0796 Construcción de Baño con Biodigestor en la localidad de Fundición, municipio de Navojoa.

El día 18 de enero del presente año me traslade en compañía de la Ing. Alexia Nickole Rendón Grijalva del área de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura básica, también nos acompañó las Ing. Lizeth Victoria Arroyo Duarte supervisora de obra, nos dirigimos primero a Navojoa a dar seguimiento a la C-00075/0762 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades de Navojoa. (Contrato-sedesson-fise-2022-026) se empezó el recorrido con la localidad de Fundición en donde se están construyendo 6 cuartos dormitorios, se visitaron a 3 beneficiarios donde observamos ya el inicio del proceso de enjarre y en proceso de colado de losas terminando ese recorrido nos dirigimos con otro beneficiario que presenta levantamientos de muros. Esto ya con un avance del 80 % en el recorrido que se dio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
16 MAR 2023  
9:55

En esta misma localidad con los mismos beneficiarios del contrato anterior mencionado se revisó la obra C-00075/0796 son construcción de baños con biodigestor en la localidad de Fundición, esto en Navojoa.

Contrato Sedesson-fise-2022-048 presenta 4 baños en obra negra, este avance se calcula en un 80 % de la construcción.

La siguiente localidad visitada fue Etchohuaquila, presentando levantamiento de muros y losas, de ahí nos dirigimos al Ayuntamiento de Navojoa, donde nos esperaba el Arq. Rafael Ángel Miranda Izaguirre, él es Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología y también estuvo presente la Mtra. María Bertha Estrella Valenzuela Directora de Desarrollo Social, aquí en esta reunión hablamos de los temas de las obras y sus avances y también se tocó el tema sobre todo de las próximas obras que ya se comenzaran este año.

Localidad de San Pedrito donde aquí son 2 beneficiarios que se visitaron donde uno ya contaba con su cuarto con pintura y también impermeabilizado y puerta, también con otro beneficiario se observa muros, losas y enjarres.

Localidad de Cucajaqui aquí son 2 beneficiarios también uno de ellos ya casi en su totalidad donde nomás hace falta pintura en su puerta y las ventanas y el otro beneficiario ya están los trabajos de enjarres, losa, yeso y el piso.

Localidad Choacalle a un Beneficiario que solo le hacía falta enjarre y losa.

En la Localidad de Teache a una de las beneficiarias solo le falta la pintura, puerta y el impermeabilizante.

Seguimos con nuestro recorrido de supervisión con la obra C-00075/0810 Construcción de cuarto dormitorio en algunas de las localidades de Álamos.

Contrato Sedesson-fise-2022-048, presenta avance del 80 %. Después nos dirigimos a la localidad de Basiroa, teniendo 11 viviendas, y empezamos el recorrido visitando cada una de ellas donde los procesos faltantes eran enjarres y piso etc.

Localidad de Los muertos siendo solo 6 beneficiarios todos con el mismo proceso de avance hasta la cadena de cerramiento.

El día jueves 9 de enero del 2023 nos trasladamos a las demás localidades que nos hicieron falta en el recorrido del contrato a revisar Sedesson-fise-2022-026 en la localidad de Nachuquis, aquí comenzamos con el beneficiario el señor Benjamín López ya con el cuarto con pintura, impermeabilizado, puerta y ventana, solo lo eléctrico le hacía falta.

Se visitaron a dos beneficiarios más donde nos dimos cuenta que era el mismo avance, el faltante era únicamente lo eléctrico.

Obra C-00075/0774 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades de Navojoa contrato Sedesson-fise-2022-048, presenta un avance del 80 %.

En Navojoa visitamos a una beneficiaria donde su vivienda ya estaba terminada.

Del contrato de Sedesson-fise-2022-026 localidad de San Ignacio Cohuirimpo se visitaron a dos beneficiarios presentando ya avances significativos de piso, yeso y enjarres.

En Navojoa contrato Sedesson-fise-2022-048 se visitaron a 3 beneficiarios donde ya tenían piso, enjarres y muros de block, de aquí nos dirigimos a la localidad de pueblo mayo donde visitamos 5 viviendas donde el avance se observa pintura exterior, aquí falta puerta, piso y ventanas.

En otras viviendas se observa ya listo enjarres y pinturas.

Con esto dimos por terminada esta ruta donde nos comprometimos a volver por pendientes y seguir dando seguimiento.

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**







**ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO**  
**COORDINADOR GENERAL FAIS**

C.c.p Archivo  
ALM/DMS



Se anexa evidencia Fotográfica

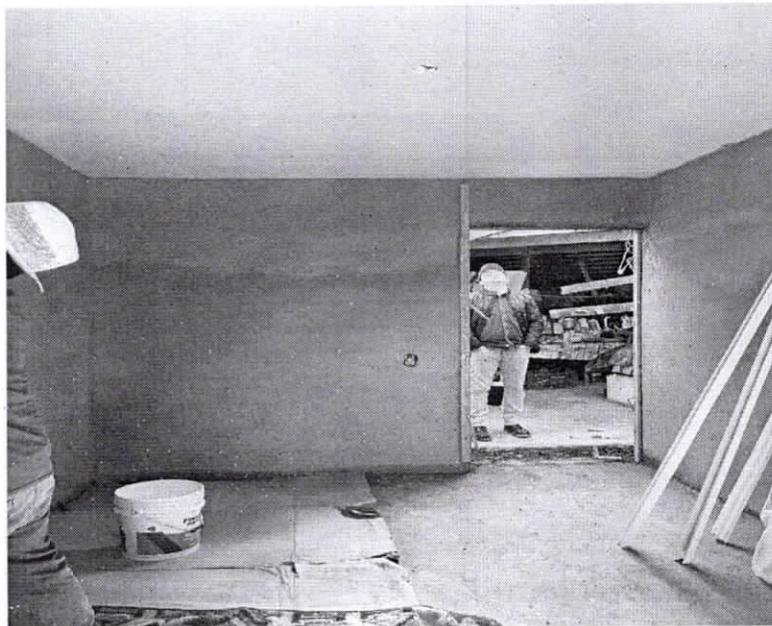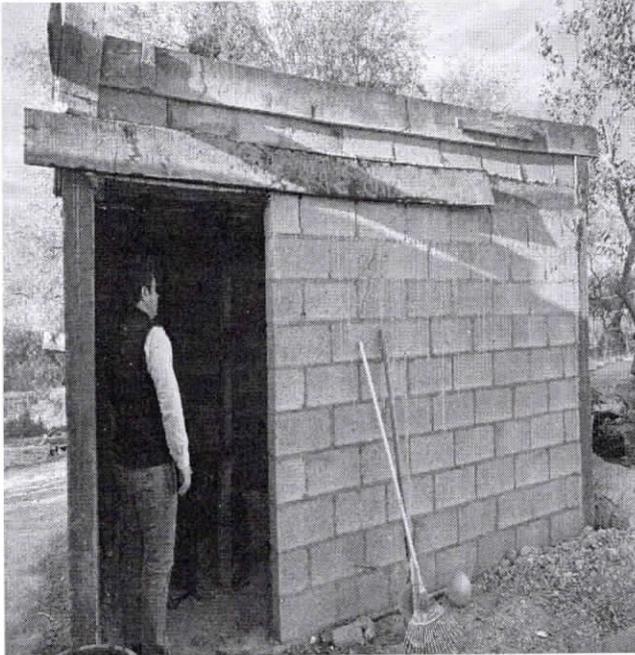

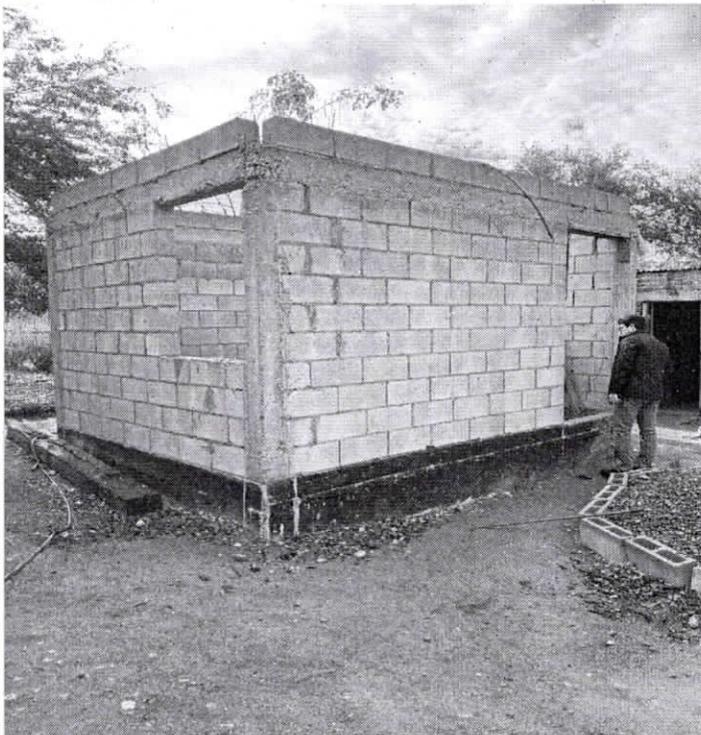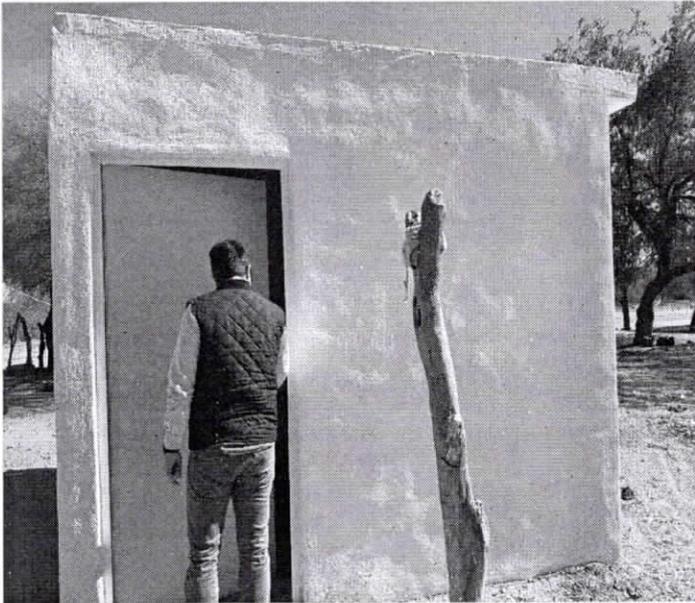



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 17 de enero de 2023

DIEGO MEZQUITA SALGADO  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

APOYO AL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE SEDESSON, EN SUPERVISAR OBRA FISE (VIVIENDA Y AGUA POTABLE)

Se le comisiona a:

ALAMOS (LOCALIDADES) Y NAVOJOA (LOCALIDADES), SONORA

Durante el ( los ) día ( s ) 18 AL 19 DE ENERO DE 2023

Vehiculo No. 107

Marca NISSAN  
Modelo 2017

Placas VD-64-444  
Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	250 Litros
CASSETAS:	\$830.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION



C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar de la Cruz, Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  
ALAMOS, SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE  
INFRAESTRUCTURA URBANA  
Y ECOLOGIA  
NAVOJOA, SONORA
