



Hermosillo, Sonora; a 24 de Enero del 2023

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 17 de Enero del 2023, con ruta de traslado durante los días 18 al 21 de Enero del 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Revisión de obras en proceso y finalizadas con el fondo FISE, para su valoración (apoyo al área de infraestructura en SEDESSON).


LUGAR DE COMISION: Ónavas, Yécora, Rosario, Quiriego, Etchojoa y (sus localidades), Sonora.

RESULTADOS

Ónavas

Nos trasladamos hasta la cabecera municipal, en donde realizamos el recorrido de supervisión, acompañados por la Contralora Alma Acosta y la responsable de Comunicación Social, Celina Granillo; en este municipio, verificamos y tomamos nota del avance de la ejecución de 11 acciones de construcción de cuarto dormitorio, con recurso del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), establecidas en el contrato SEDESSON- FISE-2022-051, con el número de obra C-00075/0804, con un avance físico en promedio del 50%, detectando que aún se encuentran algunas acciones con el estatus por iniciar; en otras se encuentran realizados los trabajos de cimentación, albañilería y la techumbre.

Se anexa evidencia fotográfica:

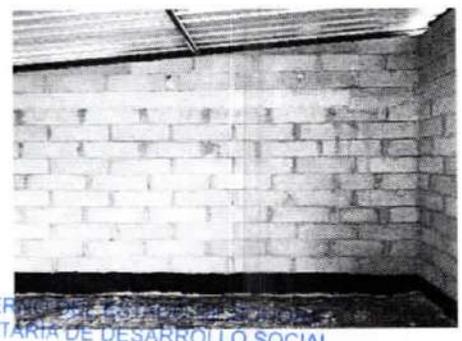





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

Yécora

Atendidos por la Presidenta Municipal Yadira Espinoza Méndez y el Director de Obras Públicas Fausto Avilés, procedimos a realizar el recorrido de supervisión de 11 acciones de sanitarios con biodigestores, ejecutados con el recurso del FISE, establecidas en el contrato SEDESSON- FISE-2022-055, con el número de obra C-00075/0786, con un avance físico en promedio del 80%; dichas acciones se ubican diferentes sectores de la colonia San Juan Diego, los trabajos realizados al momento son: la cimentación, albañilería, techumbre, puertas y ventanas, instalación eléctrica, mobiliario y acabados, quedando pendiente la colocación del tinaco y el sistema de tratamiento.


Se anexa evidencia fotográfica:

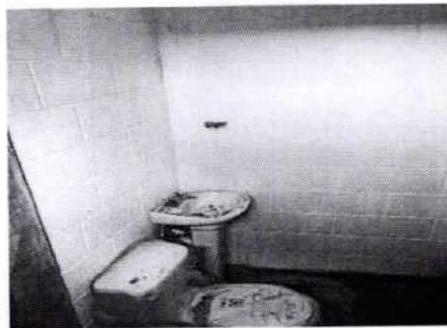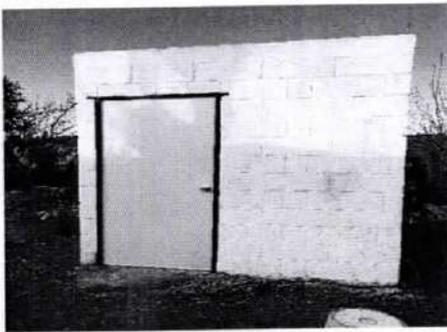

Rosario

Realizamos el recorrido de supervisión, con la Directora de Desarrollo Social Municipal María de Jesús Monge; primeramente nos trasladamos hasta la localidad Paredones (El Saucito), en donde verificamos el avance físico de 7 acciones de sanitarios con biodigestores, ejecutados con el recurso del FISE, establecidas en el contrato SEDESSON- FISE-2022-050, con el número de obra C-00075/0792, con un avance físico en promedio del 45%; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, albañilería, techumbre, quedando pendiente la instalación de puertas y ventanas, instalación eléctrica, mobiliario y acabados, la colocación del tinaco y el sistema de tratamiento.

Se anexa evidencia fotográfica:

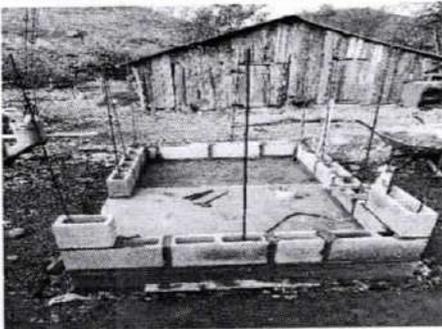

Continuando con el recorrido, nos trasladamos a la localidad La Estrella, en donde se están ejecutando 6 acciones de cuartos dormitorio; por último, terminamos el recorrido en la cabecera municipal, para verificar otras 6 acciones de cuartos dormitorio; dichas acciones son parte del contrato SEDESSON- FISE-2022-050, con el número de obra C-00075/0806; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, albañilería, cimbra para la techumbre, quedando







SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

pendiente los trabajos de asentado y junteado con mortero en los muros exteriores e interiores y la losa, la instalación de puertas y ventanas, instalación eléctrica, acabados y trabajos de pintura.


Se anexa evidencia fotográfica:

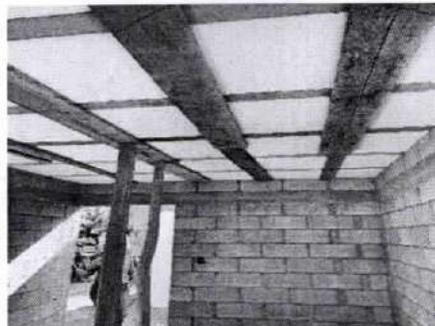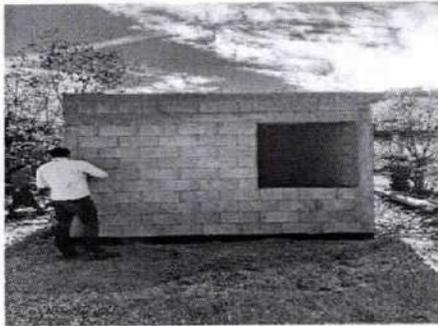

Quiriego

En este municipio, para realizar el recorrido por la cabecera municipal, nos coordinamos con la Secretaria de Servicios Públicos del Ayuntamiento C. Manuela Amaya, en donde verificamos el avance físico de 10 acciones de cuartos dormitorio; dichas acciones ejecutadas con el recurso del FISE, establecidas en el contrato SEDESSON- FISE-2022-050, con el número de obra C-00075/0805, con un avance físico en promedio del 75%; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, albañilería, la techumbre y las instalaciones eléctricas; quedando pendiente los trabajos de: la fabricación de plafón de tabla roca de yeso, la instalación de puertas y ventanas y los trabajos de pintura.

Se anexa evidencia fotográfica:

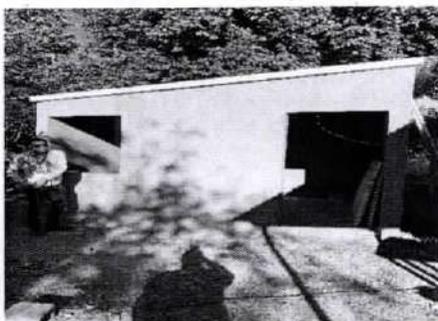




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

Gobierno
de SONORA

Continuando con la supervisión, nos trasladamos a la localidad Batacosa, en donde están ejecutando 4 acciones de cuartos dormitorio, tomando evidencia de un avance en promedio del 40%; y en la localidad Cabora, se están ejecutando 2 acciones de cuartos dormitorio, con avance físico del 50%; dichas obras, también están establecidas en el contrato SEDESSON- FISE-2022-050, con el número de obra C-00075/0805; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, y el levantamiento de muros a base de block; quedando pendiente los trabajos de techumbre, instalaciones eléctricas, el asentado y junteado con mortero en los muros exteriores e interiores, el piso firme, la instalación de puertas y ventanas y los trabajos de pintura.




Se anexa evidencia fotográfica:

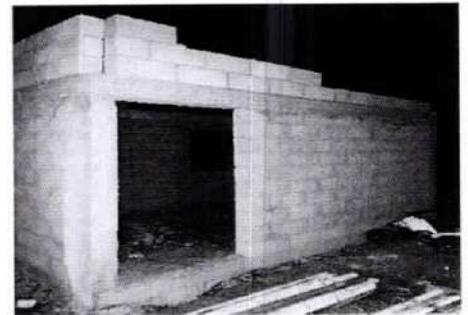

Etchojoa

Por último, nos trasladamos a la localidad de La Línea de Basconcobe, para verificar el avance físico de 3 acciones de cuartos dormitorio, establecidas en el contrato SEDESSON- FISE-2022-025, con el número de obra C-00075/0761, con un avance físico en promedio del 95%; los trabajos realizados son: cimentación, albañilería, techumbre, instalaciones eléctricas, acabados e instalación de puertas; solamente está pendiente la instalación de la ventana.

Se anexa evidencia fotográfica

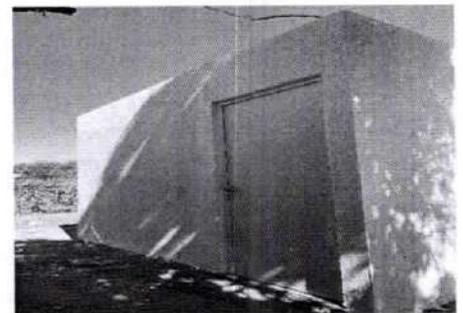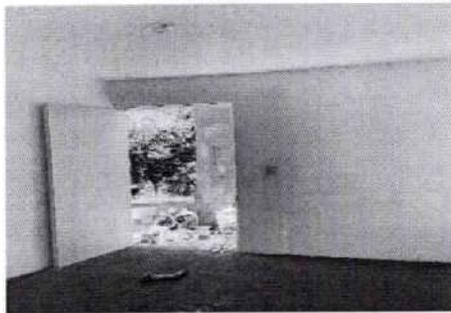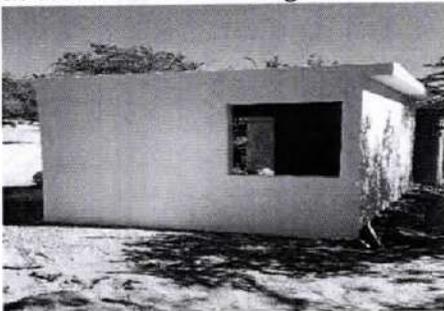

ATENTAMENTE.-


ING. HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
COORDINADOR REGIONAL FAIS





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS



Dirección de Desarrollo Social
Municipio de Rosario, Sonora

[Handwritten signature]

Hermosillo, Sonora, 17 de enero de 2023



PRESIDENCIA

HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISION DE OBRAS EN PROCESO Y FINALIZADAS CON EL FONDO FISE PARA SU VALORACION (APOYO AL AREA DE INFRAESTRUCTURA EN SEDESSON)

Se le comisiona a:

ÓNAVAS, YÉCORA, ROSARIO, QUIRIEGO, ETCHOJOA Y(SUS LOCALIDADES), SONORA

Durante el (los) día (s) 18 AL 21 DE ENERO DE 2023

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz del Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
YECORA, SONORA

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO ONAVAS, SONORA

[Handwritten signature]
