GOBIERNO
DE SONORADESARROLLO
SOCIAL

Hermosillo, Sonora; a 23 de Enero de 2023

C.P. ALMA DELIA LIMON MORENO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Presente. –

En referencia al **aviso de comisión** con fecha del 17 de Enero de 2023, mediante el cual se me comisiono a los municipios de Mazatán y Soyopa el día 18 de Enero de 2023 me permito informar lo siguiente:

N° de Contrato: SEDESSON-FISE-2022-059

N° de Obra: C-00075/0811

Descripción de la Obra: "Construcción de cuarto dormitorio en la localidad de Mazatan, municipio de Mazatan".

Periodo de la Comisión: 18 de Enero de 2023.

N° de Contrato: SEDESSON-FISE-2022-054

N° de Obra: C-00075/0780

Descripción de la Obra: "Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades de Soyopa, municipio de Soyopa".

Periodo de la Comisión: 18 de Enero de 2023.

En el municipio de Soyopa se encuentra en proceso de terminación la construcción de 9 acciones de cuarto dormitorio de los cuales 7 de estos se encuentran ubicados en la localidad de La Estrella y 2 de ellos en El Novillo, se procedió a iniciar el recorrido en los cuartos-dormitorios ubicados en la localidad La Estrella los cuales presentan un avance del 80% ya que se encuentran en la etapa de enjarres y techumbre para posteriormente pasar a la etapa de detalles finales los cuales comprenden pintura, puerta, ventana, nos informaron los trabajadores que por cuestiones climáticas inician los trabajos tarde alrededor de las 10:00-11:00 ya que las bajas temperaturas, así como la neblina en las mañanas dificultan los trabajos.

En las 7 acciones de cuarto-dormitorio de procedió a verificar las medidas de las dimensiones para corroborar que coincidan con lo que señala el catálogo de conceptos, también se verifico las juntas de block, espesor de enjarres, el impermeabilizante ene la cadena de desplante al concluir la revisión se prosiguió con el traslado a la localidad de El Novillo las cuales se ubican cruzando el puente del campamento de CFE, la verificación fue la anteriormente mencionada.

Al concluir el recorrido se procedió al traslado al municipio de Municipio de Mazatán donde se encuentra en cierre de obra 12 acciones de cuarto dormitorio donde me permito informar lo siguiente:

De los 11 cuartos, 7 acciones se encuentran con un avance del 90% ya que solo faltan los trabajos de cierre como lo son puerta, ventana, enjarres de fino y pintura, 3 acciones se encontraron con un avance del 85% ya que se encontraban en proceso de techumbre por último, la última acción se encontraba con una avance del 0% ya que hubo cambio de beneficiario por que el beneficiario anterior rechazo el apoyo del programa por tener diferencias con el municipio, en dicho sitio de trabajo habían transcurrido dos días desde que se le noto al contrista el cambio de beneficiario por ende solo se contaba con el trazo en el sitio de trabajo, pero el contratista se encuentra comprometido a terminar los trabajos lo más pronto posible.

662 108 37 37
662 103 37 49

sedesson@sonora.gob.mx

Proyecto Río 76,
Col. Proyecto Río-Sonora

01 MAR 2023

1130

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 SECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Al presente informe se anexa evidencia fotográfica.

ATENTAMENTE


Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó

REPORTE FOTOGRAFICO



Neblina en el municipio de Soyopa.




Trabajos de acabados en interior






Trabajos en la localidad El Novillo.





GOBIERNO DE SONORA
DESARROLLO SOCIAL

REPORTE FOTOGRAFICO DEL MUNICIPIO DE MAZATAN

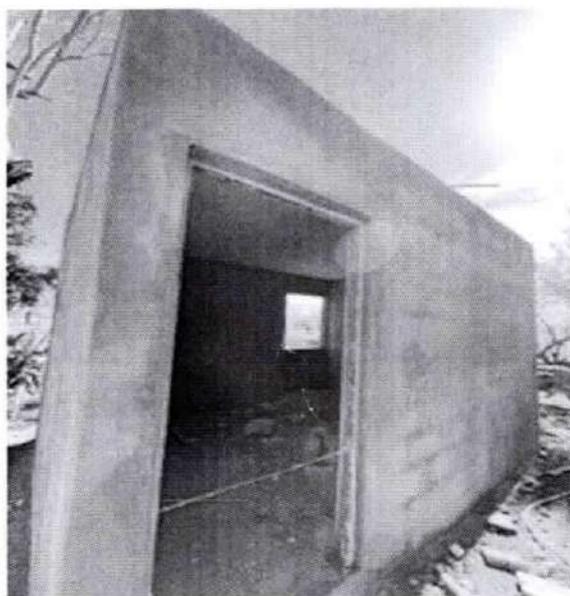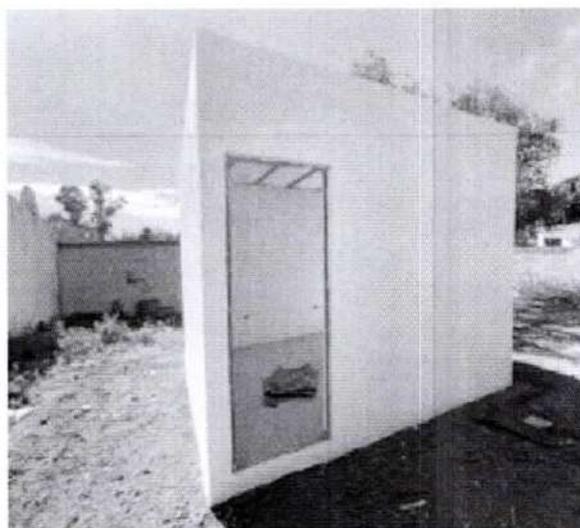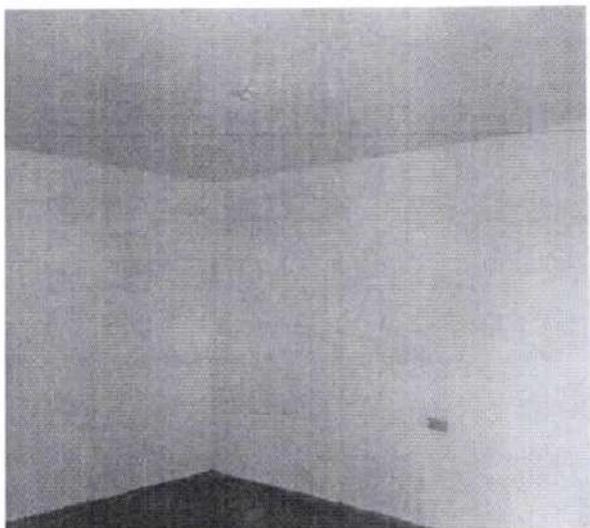


662 108 37 37
662 103 37 49

 sedesson@sonora.gob.mx

 Proyecto Rio 76,
Col. Proyecto Rio Sonora
