

Hermosillo, Sonora; a 23 de Enero de 2023

C.P. ALMA DELIA LIMON MORENO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Presente. –

En referencia al **aviso de comisión** con fecha del 17 de Enero de 2023, mediante el cual se me comisiono a varias localidades del municipio de Ures el día 20 de Enero de 2023 me permito informar lo siguiente:

N° de Contrato: SEDESSON-FISE-2022-052

N° de Obra: C-0075/0768

Descripción de la Obra: “Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Ures”.


Periodo de la Comisión: 20 de Enero de 2023.

La construcción de la obra en mención abarca las localidades de El Seguro (2 acciones), Rancho Viejo (3 acciones), San Pedro de Ures (2 acciones), Puerta del Sol (1 acción) y en la cabecera de Ures (3 acciones), siendo un total de 11 acciones de cuarto-dormitorio.

Se procedió a llevar a cabo el inicio del recorrido en la localidad de Puerta de Sol, donde se verifico las medidas de las dimensiones del cuarto dormitorio, la calidad de los trabajos realizados así como la inspección de los materiales.

Al concluir nos trasladamos a la localidad San Pedro de Ures donde ambos cuartos se encontraban con un avance del 85%, solo hacía falta concluir con los trabajos de fino, pintura puerta y ventana, así como la impermeabilización de la losa. Posteriormente se continuó con la verificación física de los trabajos de cuarto-dormitorio en la cabecera de Ures, del mismo modo en las tres acciones se verifico las dimensiones de los cuartos dormitorios, la calidad tanto de los materiales como de la mano de obra, en alguno de los sitios si se contaba con presencia de trabajadores se observó de se estaba solventando trabajos de calidad.

Para finalizar el recorrido por el municipio de Ures nos trasladamos a las localidades más lejanas del municipio las cuales son Rancho Viejo y el Seguro para la verificación de los trabajos de cinco acciones de cuarto dormitorio, donde se verifico las dimensiones del cuarto, acabados de calidad así como de los materiales, del mismo modo se procedio a informar que la obra presentaba atraso el contratista comento que se debía a la lejanía de la localidad así como a la carencia de mano de obra de la región, al presente reporte me permito anexar reporte fotográfico. En los cuartos de el Seguro no se pudo acceder ya que no se encontraba nadie en el domicilio.

GOBIERNO
DE SONORADESARROLLO
SOCIAL

Como la obra del Tanque Elevado era la más alejada procedimos a visitar el ejido Graciano Sánchez en el municipio de Guaymas, para la verificación física del Tanque Elevado y sus instalaciones; en el cual los auditores tomaron las medidas y fotografías respectivas.

Después nos trasladamos a la localidad de Santa María de Guaymas para hacer visita las personas beneficiarias de cuarto dormitorio verificando los cuartos de los beneficiarios Rosa Guadalupe Cota Sandoval, Rafaela García Orduño, Cecilio Pacheco Bañuelos, Rosa Adriana Álvarez, teniendo como sugerencias por parte de los auditores una segunda mano de pintura en todos los cuartos dormitorios de las personas mencionadas anteriormente, así como detalles de sellado en puertas y ventanas y corrección de una instalación de malla e impermeabilización. A la fecha del presente informe se está brindando la atención correspondiente para solventar los detalles.

- Al concluir los domicilios de Santa María nos trasladamos a las siguientes obras: Ampliación de red de agua potable en varias calles de la localidad de la Atravezada, municipio de Empalme, Ampliación de red de agua potable en la localidad de Ursulo Galván, Municipio de Empalme y Ampliación de red de agua potable en varias calles de la colonia El Palmar, municipio de Empalme; en las cuales los auditores y su servidora procedimos a llevar la medición correspondiente así mismo a identificar que el número de tomas de agua potable coincidiera con las contratadas en el proyecto.

Donde también se procedió a llevar a cabo la visita a los cuartos dormitorios de María Fernando Solano Noriega, Reyna Solano Noriega y Filiberto Ramos Juárez ubicados en el Ejido la Atravezada. Al cerciorarnos que el día estaba por concluir se decidió de manera conjunta omitir las visitas de los beneficiarios de cuarto dormitorio en las localidades de Maytorena y de San Fernando de Guaymas ambas localidades del Municipio De Empalme, esto por cuestiones de seguridad, así que nos trasladamos a la colonia El Palmar ubicada en la cabecera del Municipio de Empalme para llevar acabo la verificación de la ampliación de la red de agua potable en la colonia.

Concluidas las visitas anteriormente mencionadas nos trasladamos al H. Municipio de Empalme y con esto se dio por concluida la comisión de visita de Cuarto-Dormitorio de Empalme la cual tuvo algunas modificaciones ante la inasistencia del Ing. Orozco. Al presente se anexa reporte fotográfico.

ATENTAMENTE:




Ing. Maira Daniela Tapia Pedregó.
**Directora General de Proyectos de
Infraestructura Básica**

REPORTE FOTOGRAFICO



C-00085/0370: Ampliación de tanque elevado para almacenamiento de agua potable en la localidad Graciano Sánchez de municipio de Guaymas; Sonora.

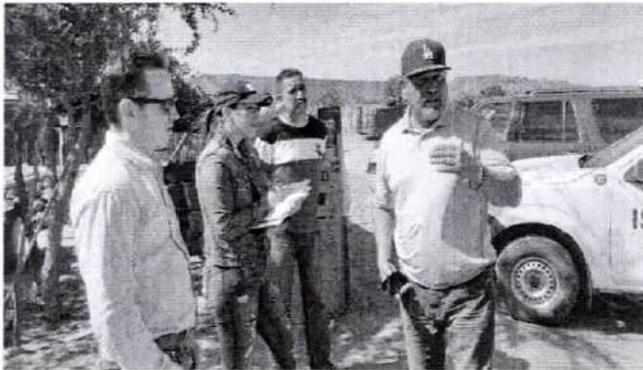

C-00085/0373: Ampliación de red de agua potable en varias calles de la localidad de la Atravezada, municipio de Empalme.

Y recorrido por los Cuartos-Dormitorios en la misma localidad en compañía de Director de Desarrollo Social de Empalme, Auditores de ISAF, así como el delegado de la localidad.

