



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DEL ESTADO DE
SONORA

F-0207

Hermosillo, Sonora a 22 de febrero del 2023.

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 14 de febrero 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Apoyo al área de infraestructura de SEDESSON, en supervisar obra FISE (Fondo de Infraestructura Social para las Entidades).

LUGAR DE COMISIÓN: Arizpe, Banámichi y Baviácora y sus respectivas localidades.

RESULTADOS

ARIZPE

Con las geolocalizaciones de los cuartos dormitorios realizados con el FISE en los municipios antes mencionados, se procedió a la revisión iniciando por la localidad de Chinapa en el municipio de Arizpe en donde se encuentra un cuarto dormitorio el cual no presenta avances desde el 02 de febrero, el cuarto se encuentra hasta cadena de cerramiento, en el cuarto de buena vista se encontraban trabajadores que estaban en avances de la misma cadena de cerramiento comentan el mismo día seguirían trabajando en el cuarto de Chinapa, los siguientes cuartos dormitorio visitados (4) se encuentran en la localidad de Tahuichopa, localidad que presenta dos cuartos dormitorio con avance del 0% y otros dos tantos con avances de 9 hiladas y 10 hiladas de bloque pegado con piso colado. En la cabecera municipal se encuentran 3 cuartos dormitorio éstos son los que representan mayores avances ya se encuentran techados los 3 en proceso de instalación plafón de tabla roca sin embargo no presentan acabados pero si pisos colados, en la localidad de Arizpe, Bámori se encuentran con avances del 0% solo han hecho excavación superficial marcando la posición del cuarto dormitorio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

RECIBIDO
15 MAR. 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
DE SONORA

BAVIÁCORA

En la localidad de Baviácora empezando por la cabecera municipal, el primer cuarto revisado se encontraba en acabado fino en proceso de techado, con detalle en dos castillos, el segundo cuarto dormitorio visitado presento avances en pintura y la instalación de plafón de tabla roca, un cuarto más de los más avanzados de la cabecera municipal, se encuentra en acabado fino con techo en proceso de instalación de plafón de tabla roca, los otros tres cuartos de la cabecera presentan avances mínimos en levantamiento de muros y uno de ellos el piso colado, el cuarto que más avance presenta es el de la localidad de las tortugas ya pintado pendiente instalaciones eléctricas en todos instalación de puerta y ventana.

BANÁMICHÍ

En la localidad de Banámichi se encuentra un cuarto con el acabado fino sin instalación de puerta y ventana ni pintura, el segundo visitado se encuentra en trabajos de acabado fino con una mano de pintura interior, el tercero se encuentra pintado y con acabado de yeso en el techo pero con corrección en marco de puerta, el cuarto siguiente se encuentra en acabado fino en proceso, el último cuarto de la cabecera se encuentra pintado y con acabado en techo, cabe mencionar que los cuartos de éste municipio son de casetón y vigueta con piso colado todos al momento, en la localidad de Las Delicias se encuentran al momento sin piso hasta cadena de desplante sin colar y en la localidad de La Mora se encuentra en proceso de excavación.

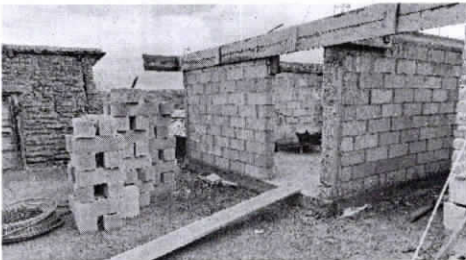

ATENTAMENTE.-

Ing. Aldo Iván Mundo Beltrán
Supervisor y asesor de Desarrollo Social (SaDES)

