



HERMOSILLO, SONORA, A 01 DE MARZO DEL 2023.

ARQ. DIÉGO MÉZQUITA SALGADO COORDINADOR ESTATAL FAIS PRESENTE.


INFORME ADMINISTRATIVO

EN ATENCIÓN AL AVISO DE COMISIÓN CON FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023, CON RUTA DE TRASLADO DE FECHA 27 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE, LE INFORMO LO SIGUIENTE:

LUGAR DE COMISION, SAN JAVIER Y SUAQUI GRANDE.

EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA, SE SUPERVISÓ EL AVANCE FISICO DE LAS 8 ACCIONES DE VIVENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDADES (FISE), LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

1.- MARTHA VIVIANA GARCIA CANO, ESTA VIVIENDA SE ENCONTRÓ CON AVANCE PERO ALGUNOS DETALLES DE CONCTRUCCIÓN. COMO LO SON: LA PUERTA NO CIERRA CORRECTAMENTE, LA FALTA LA CHAPA, Y LAS LAMINAS DEL TECHO ESTAN LEVANTADAS.







ION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN












GOBIERNO
DESONORA


SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL

2.- YADIRA ALEJANDRA DUARTE PORTELA, ESTA VIVIENDA YA SE ENCUENTRA TECHADA, FALTAN PUERTAS, VENTANAS Y ALGUNOS DETALLES.







3.- JESUS CORNELIO QUIJADA MORENO, SE ENCONTRÓ EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA ULTIMA VISITA, EL BENEFICIARIO SIGUE INCONFORME CON LA INSTALACIÓN DEL TECHO.





4.- ISABEL GONZALEZ RUELAS, VIVIENDA EN LAS MISMAS CONDICIONES DEL 10 FEBRERO, FUE LA ULTIMA VISITA, ESTÁ DESCUADRADA, AGRIETADA, ENJARRES MUY DESANIVELADOS, PAREDES DEMASIADO CHUECAS, BENEFICIARIA MOLESTA.













5.- VERONICA POLANCO VALDEZ, AVANCE EN EL SOBRE TECHO, PUERTA, VENTANA Y ALGUNOS DETALLES DE INSTALACIÓN ELECTRICA.






6.-REYNA ELIZABETH LÓPEZ AGÜERO, VIVIENDA SIN AVANCE A LA ULTIMA VISITA, CON ALGUNOS FALTANTES.





7.- PAOLA ALEJANDRA FLORES DELGADO, VIVIENDA EN LA MISMAS CONDICIONES AL 10 DE FEBRERO.












8.- GILBERTO SALOMON CAMPOS GONZALEZ. ESTA VIVIENDA TIENE AVANCE DE TECHO, ENJARRES E INSTALACIOÓN ELECTRICA.






EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA, SE SUPERVISÓ EL AVANCE FISICO DE LAS 12 ACCIONES DE VIVENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA ENTIDADES (FISE), LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

1.- ARIEL FIMBRES MAYBOCA, ESTA VIVIENDA SE ENCONTRO CON AVANCE DE PUERTA, AUN LE FALTA EL TECHO DE PLAFON Y DETALLES EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

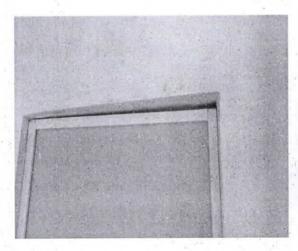












2.- CLAUDIA CAROLINA VAZQUEZ JIMENEZ, ESTA VIVIENDA SE ENCONTRO TOTALMENTE IGUAL QUE LA VISITA ANTERIOR, SIGUE CON FALTANTE DE PUERTA, VENTANA, SOBRE TECHO Y DETALLES.





3.- CONRADO DUARTE CASTILLO, ESTA VIVIENDAS SE ENCUENTRA TOTALMENTE IGUAL QUE LA VISITA ANTERIOR, SIN PUERTA, SIN VENTANTA Y PENDIENTE TERMINAR EL SOBRE TECHO.





4.- GUADALUPE RIOS CASTILLO, ESTA VIVIENDA SE ENCUENTRA MUY AVANZADA, SOLO QUE TIENE DETALLES EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA PUERTA, EL PISO AGRIETADO Y LA VENTANA DESCUADRADA POR LA PARTE DE AFUER.
























5.- JESUS OCTAVIO DUARTE VALENZUELA, VIVIENDA TOTALMENTE IGUAL DE LA VISITA PASADA, DETALLES DE DESCUADRE EN VENTANA Y PUERTA, TIENE ALGUNOS DETALLES CONSIDERABLES EN LAS PAREDES.














GOBIERNO
DESONORA
SECRETARIA-DE
DESARROLLO
SOCIAL

6.- LOURDES RODRIGUEZ QUINTANA, VIVIENDA TOTALMENTE IGUAL QUE LA VISITA ANTERIORESTA VIVENDAS ESTA PENDIENTE DE SOBRE TECHO, PUERTA, VENTANA E INSTALACION ELECTRICA.





7.- MARIA DEL ROSARIO CASTILLO FIMBRES, ESTA VIVENDA YA SE ENCUENTRA HABITADA POR EL BENEFICIARIO, LE QUEDARON DETALLE EN EL PISO PERO ASI LA HABITÓ.



8.- OSSMARA MARIA CASTILLO CARRILLO, PERSONAL TRABAJANDO EN ESTA VIVENDA, EL AVANCE SE OBSERVAN EN LAS FOTOGRAFIAS












GOBIERNO
DESONORA


GEORETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL


9.- ROSA ISELA NAVARRO CASTILLO, VIVIENDA PENDIENTE DE SOBRE TECHO, VENTANA, PUERTA E INSTALACIÓN ELECTRICA.






10.- SHIOMARA ROXANA LUNA PALAFOX, EN ESTA VIVIENDA COMENTA LA BENEFICIARIA QUE SOLAMENTE EN 3 OCACIONES HAN IDO LOS ALBAÑILES, EL ANCE SE OBSERVA EN LAS FOTOGRAFÍAS.





11.- REYNA MARIA RODRIGUEZ FIMBRES, VIVIENDA TUVO AVANCE EN EL COLADO DE CADENA.















12.- MANUEL ALFREDO CASTILLO SALAZAR, ESTA VIVIENDA TUVO AVANCE EN LOS ENJARRES.





SIN MAS QUE INFORMAR AL MOMENTO, QUEDO A LA ORDEN PARA CUALQUIER DUDA AL RESPECTO.

ATENTAMENTE

LIC. ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

DESARROLLO SOCIAL











GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 23 de febrero de 2023

ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA

PRESENTE .-

SUPERVISION LAS ENTIDADE	DEL AVANCE FISIC	O DE LAS OBI	RAS EJECUTADA	S CON EL FONDO DE	INFRAESTRUCTURA	A SOCIAL PARA
Se le comisiona						
	SUAQUI GRANDE,	SONORA		-	2	
Durante el (lo	s) día (s)2	27 AL	28 DE	FEBRERO	DE 2023	
Vehiculo No. 105						
Marca NISSAN			Placas	VD-64-444		
Modelo	2017		Tipo	PICK UP NP 300	-:	
CONTROL NET	70 Litros	R.				
CASETAS:	\$0.00			tis.		
GASOLINA:	\$500.00					

OBRAS PUBLICAS
H. INTAM. O DE
SUAQUI S. Archivo
SONORA

C.c.p. Archivo
C.c.p. Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

ATENTAMENTE

Obras Públicas
Administración
2021-2024
H. Ayuntamiento
San Javier, Son

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

> DE SONORA SEGRETARA DE
