

F-0356



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**  
GOBIERNO  
DE SONORA

Hermosillo, Sonora a 16 de Marzo de 2023

**ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO**  
**COORDINADOR ESTATAL FAIS**  
**PRESENTE. –**

En atención al aviso de comisión de fecha del 06 de marzo de 2023, con ruta de traslado del 07 al 08 de marzo del 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO:** Supervisión y verificación de avance físico de las Obras: “Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Rosario; Construcción de módulo sanitario con biodigestor en Rosario localidad de Paredones (El Saucito); Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Quiriego; Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Álamos.

**LUGAR DE COMISIÓN:** Varias localidades de los Municipios de Rosario, Quiriego y Álamos, Sonora.

**ROSARIO**

En el Municipio de Rosario se verificó el avance físico de la Obra No. C-00075/0806 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Rosario., correspondiente al contrato SEDESSON-FISE-2022-050, adjudicado al C. Francisco Javier Toledo Ruiz. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIO	ESTADO DE LA OBRA (PENDIENTES)
1	Rosario	Rosario (cabecera)	MARIA AGUILAR DELGADO	RETOQUES DE PINTURA (FALTA PINTURA EN CIERTAS AREAS), SELLAR PUERTA Y VENTANA.
2	Rosario	Rosario (cabecera)	XOCHITL GPE ROMERO BARCELÓ	TERMINADO, CON DETALLES EN UNIÓN DE MURO Y LOSA EN LAS ESQUINAS Y LIMPIEZA GENERAL.
3	Rosario	Rosario (cabecera)	YALVANI JUDITH ORTEGA ORTEGA	DETALLAR ÁREA DE ROSETA, FOCO Y LIMPIEZA GENERAL.
4	Rosario	Rosario (cabecera)	MARIBEL GUEREÑA VALENZUELA	SELLAR PUERTA Y VENTANA, GRIETAS EN VANO DE VENTANA, TELA DEL IMPERMEABILIZANTE SE ESTÁ DESPEGANDO, FALTA CONTRACHAPA Y FOCO.
5	Rosario	Rosario (cabecera)	ITZEL GPE VALENZUELA MARTÍNEZ	FALTA CONTRACHAPA, FOCO, SE APRECIAN EN GRIETAS EN EL YESO DE LA LOSA Y LIMPIEZA GENERAL.
6	Rosario	Rosario (cabecera)	OFELIA ÁLVAREZ PORTUGAL	FALTA UNA MANO DE PINTURA Y PULIDO EN EL YESO DE CIELO, FALTA CONTRACHAPA, SE APRECIAN GRIETAS EN 3 MUROS EN EL INTERIOR.
7	Rosario	La Estrella	DANIEL MENDOZA SIRIACO	TERMINADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
16 MAR 2023  
11:58 PM  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

8	Rosario	La Estrella	ROSA AMELIA ALDAMA GALLEGOS	RETOQUES DE PINTURA (FALTA PINTURA EN CIERTAS AREAS) Y FALTA EL FOCO.
9	Rosario	La Estrella	JUANA AUDELIA CAMPAS MENDOZA	RETOQUES DE PINTURA (FALTA PINTURA EN CIERTAS AREAS) FALTA EL FOCO Y EXISTEN GRIETAS EN LOS 4 MUROS DEL INTERIOR.
10	Rosario	La Estrella	MARIA DEL ROSARIO LEYVA MENDOZA	FIJAR ROSETA, FALTA FOCO, Y SE ESTÁ LEVANTANDO LA TELA DEL IMPERMEABILIZANTE.
11	Rosario	La Estrella	PAULINO SUJA LEYVA	RETOQUES DE PINTURA (FALTA PINTURA EN CIERTAS AREAS), FALTA FOCO Y SALIERON GRIETAS EN MUROS.
12	Rosario	La Estrella	ALMA ANGELINA AMADO VALENZUELA	APARENTEMENTE TERMINADO, NO SE PUDO ACCESARAL INTERIOR YA QUE NO ESTABA EL BENEFICIARIO. SE APRECIAN CORTINAS EN LA VENTANA POR LO CUAL PARECE QUE YA SE ENCUENTRA HABITADO.

En el Municipio de Rosario también se verificó el avance físico de la Obra No. C-00075/0792 Construcción de módulo sanitario con biodigestor en Rosario localidad de Paredones (El Saucito), correspondiente al contrato SEDESSON-FISE-2022-050, adjudicado al C. Francisco Javier Toledo Ruiz. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIO	ESTADO DE LA OBRA (PENDIENTES)
1	Rosario	Paredones	AMALIO QUINTERO BUITIMEA	TERMINAR INSTALACION DE TUBERIA DE DESCARGA Y FOCO.
2	Rosario	Paredones	MARIA DEL REFUGIO TORRES MARQUEZ	SELLAR PUERTA, TINACO GOTEA LA TUBERIA, INSTALACION DE TUBERIA DE DESCARGA, FALTA LA REGADERA, DETALLAR ÁREA DEL APAGADOR, FOCO E INSTALAR EL BIODIGESTOR.
3	Rosario	Paredones	DINORAH PATRICIA ROJAS TORRES	SELLAR PUERTA Y VENTANA, TINACO, INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR, UNA MONO DE PINTURA, DETALLAR ÁREA DE REGADERA PRESENTA GRIETAS, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, FOCO Y DETALLADO DE GOLPES EN EL YESO DE LA LOSA.
4	Rosario	Paredones	CONSUELO AMADO BUITIMEA	INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR, DETALLAR ÁREA DEL APAGADOR, FALTA LA REGADERA Y EL FOCO.





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

5	Rosario	Paredones	MARTHA ELIA ARENAS PARRA	MUEBLES DE BAÑO, PUERTA Y VENTANA, TINACO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO, INSTALACIÓN DEL BIODIGESTOR.
6	Rosario	Paredones	ALMA DELIA MARQUEZ AMADO	UNA MANO DE PINTURA, FOCO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO E INSTALACIÓN DEL BIODIGESTOR.
7	Rosario	Paredones	RUTH ANAHÍ ROJAS TORRES	UNA MANO DE PINTURA INTERIOR EN PROCESO Y EXTERIOR E INSTALACIÓN DEL BIODIGESTOR.

**QUIRIEGO**

En el Municipio de Quiriego se verificó el avance físico de la obra C-00075/0805 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Quiriego. correspondiente al contrato SEDESSON-FISE-2022-050, adjudicado al C. Francisco Javier Toledo Ruiz. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIO	ESTADO DE LA OBRA (PENDIENTES)
1	Quiriego	Quiriego	NYDIA JUDITH VALENZUELA BUITIMEA	SELLAR PUERTA Y VENTANA, FOCO, RESANES ENTRE MURO Y POLÍN, DETALLAR Y SELLAR VANO DE PUERTA Y VENTANA, FALTA EL FOCO Y UNA MANO DE PINTURA.
2	Quiriego	Quiriego	LETICIA GPE BRICEÑO VALENZUELA	ACCESORIOS ELÉCTRICOS, UNA MANO DE PINTURA, SELLAR PUERTA Y VENTANA, FOCO Y LIMPIEZA GENERAL.
3	Quiriego	Quiriego	ERNESTO GUADALUPE VALENZUELA ANAYA	PENDIENTE PINTURA EN POLINES, RESANAR ÁREA DEL VANO DE LA PUERTA Y LA VENTANA, DETALLAR SELLADOR, RESANAR HUECO ENTRE MURO Y POLIN Y UNA MANO DE PINTURA.
4	Quiriego	Quiriego	BERTHA ESTRADA CASTELO	PINTURA EN POLINES, SELLAR VENTANA Y PUERTA Y RETIRO DE MEZCLA EXCEDENTE EN EL PISO FIRME.
5	Quiriego	Batacosa	JOSEFA VALENZUELA SIARI	PENDIENTE LA TECHUMBRE, APLANADO GRUESO EN INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA Y VENTANA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PINTURA Y COLAR PARTE SUPERIOR DE LOS CASTILLOS.
6	Quiriego	Batacosa	ANDRES VALENZUELA VALENZUELA	ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PINTURA EN MUROS Y POLINES, PLAFÓN, RESANE DE





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
de SONORA

				HUECOS ENTRE MUROS Y POLIN Y SELLAR VENTANA.
7	Quiriego	Batacosa	BARTOLO ROCHIN ARMENTA	PENDIENTE LA TECHUMBRE, APLANADO FINO EN INTERIOR, PUERTA, DETALLAR VANO DE PUERTA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PLAFÓN Y PINTURA.
8	Quiriego	Batacosa	MATILDE AYALA ENRIQUEZ	PENDIENTE LA TECHUMBRE, PUERTA Y VENTANA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PINTURA, FALTA APLANADO GRUESO Y FINO EN ÁREA SUPERIOR DE MUROS E INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA.
9	Quiriego	Cabora	FRANCISCO AYALA ANGULO	VENTANA, PINTURA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
10	Quiriego	Cabora	BRAYAN FRANCISCO AYALA FLORES	ACCESORIOS ELÉCTRICOS, SELLAR PUERTA Y VENTANA, PINTURA, PLAFÓN E INSTALACIÓN DE LÁMINA DE TECHUMBRE.
11	Quiriego	Quiriego	MARIANA GUIQUISHI GRIJALBA	ACCESORIOS ELÉCTRICOS, SELLAR PUERTA Y VENTANA, UNA MANO DE PINTURA, FOCO, LIMPIEZA DE REBABAS EN MURO Y RESANE DE HUECO ENTRE MURO Y POLÍN.
12	Quiriego	Quiriego	FLORENTINA RODRÍGUES GUEREÑA	SELLAR PUERTA Y VENTANA, FALTA PINTURA EN POLINES, DETALLAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ÁREA DE CONTACTO Y ESQUINA PISO-MURO, LIMPIEZA GENERAL.
13	Quiriego	Quiriego	MICAELA CIRIACO RODRIGUEZ	UNA MANO DE PINTURA EN MUROS Y POLINES, DETALLAR FILOS DE MUROS EXTERIORES, DETALLAR UNIÓN MURO-PISO Y UNIÓN MURO-PLAFÓN Y LIMPIEZA GENERAL.
14	Quiriego	Quiriego	FRANCISCA ENRIQUEZ GRIJALBA	DETALLAR FIRME EN ÁREA DE PUERTA, DETALLAR CADENA DE CIMENTACIÓN, PINTAR POLINES, SELLAR VENTANA POR EL INTERIOR, DETALLAR UNIÓN PISO-MURO, FOCO Y DETALLAR UNIÓN DE MURO-PLAFÓN.
15	Quiriego	Quiriego	ERASMO ARMENTA CIRIACO	PENDIENTE PINTURA EN POLÍN, FOCO, SELLAR PUERTA Y DETALLAR PLAFÓN EN ESQUINAS.
16	Quiriego	Quiriego	FELIX CIRIACO CORPUS	PENDIENTE PINTURA EN POLÍN, DETALLAR HUECO ENTRE MURO Y





SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA

				POLÍN Y LA UNIÓN ENTRE MURO Y PISO.
--	--	--	--	-------------------------------------

**ÁLAMOS (CABECERA)**

En localidad de Álamos, Municipio de Álamos, se verificó el avance físico de la obra C-00075/0749 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Álamos, correspondiente al contrato SEDESSON-FISE-2022-026, adjudicado a la C. Patricia Czarina Agüero Madero. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIO	ESTADO DE LA OBRA (PENDIENTES)
21	Álamos	Álamos (El Tezal)	GERARDO ARIAS ROBLES	TERMINADA.
22	Álamos	Álamos	ROSA IRENE REYES DUARTE	IMPERMEABILIZAR LOSA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, Y VENTANA.
23	Álamos	Álamos	MARISELA LÓPEZ VALENZUELA	TERMINADA
24	Álamos	Álamos	PETRA AGUILAR BANDA	DETALLES DE PINTURA
25	Álamos	Álamos	EDITH GUADALUPE MUÑOZ TRASVIÑA	INSTALACIÓN DE PUERTA.

En la localidad de Álamos, Municipio de Álamos, también se verificó el avance físico de la obra C-00075/0810 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Álamos, correspondiente al contrato SEDESSON-FISE-2022-048, adjudicado a la Empresa Repelec Quality Energy Systems, S.A. de C.V.. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIO	ESTADO DE LA OBRA (PENDIENTES)
1	Álamos	Álamos (El Tezal)	YOSHIRIS DEL CARMEN AYALA GASTELUM	COLOCAR VENTANA Y FOCO.
2	Álamos	Álamos	ROSA IRENE REYES DUARTE	PUERTA Y VENTANA
3	Álamos	Álamos	MARISELA LÓPEZ VALENZUELA	PUERTA Y VENTANA
4	Álamos	Álamos	PETRA AGUILAR BANDA	PUERTA Y VENTANA (OBRA GRIS)
5	Álamos	Álamos	EDITH GUADALUPE MUÑOZ TRASVIÑA	INSTALACIÓN DE PUERTA.

Seguidamente, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.







SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

GOBIERNO  
DE SONORA


**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA**

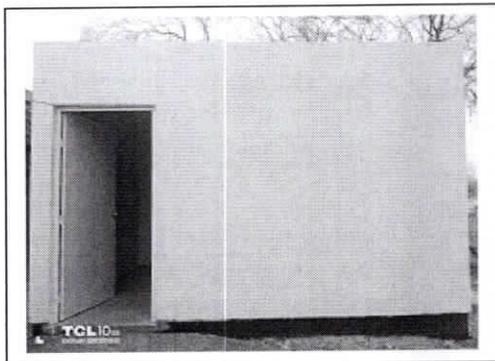


Rosario (Cabecera)

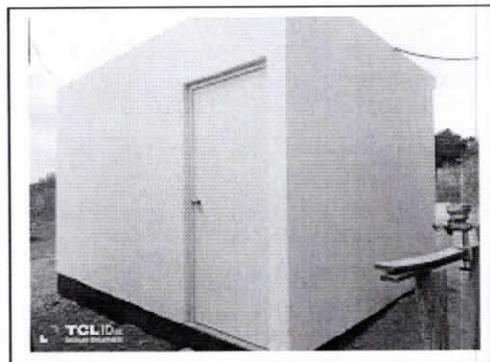

Rosario (La Estrella)

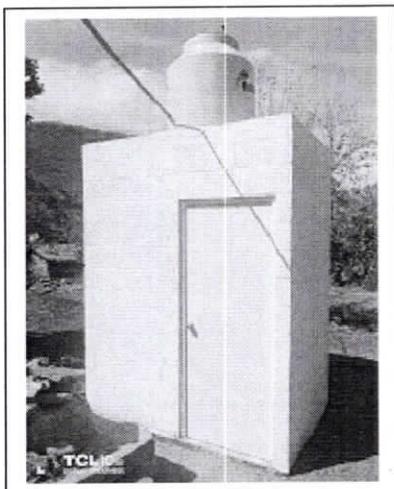

Rosario (Paredones)

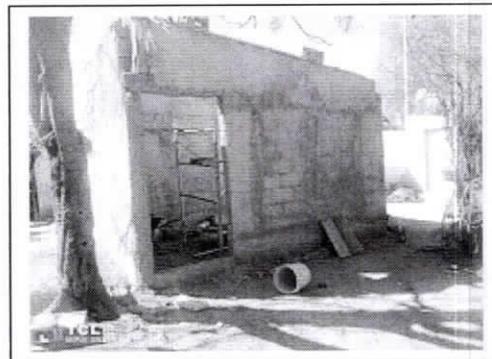


Quiriego (Batacosa)






SECRETARÍA DE  
**DESARROLLO  
SOCIAL**


GOBIERNO  
de SONORA

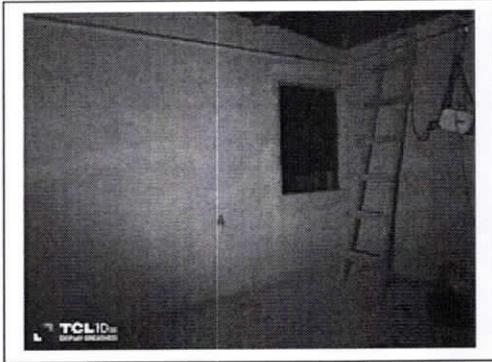

Quiriego (Cabora)

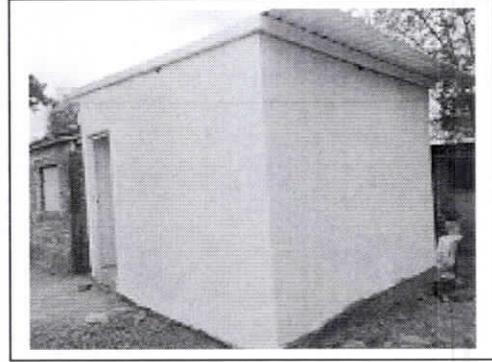

Quiriego (Cabecera)

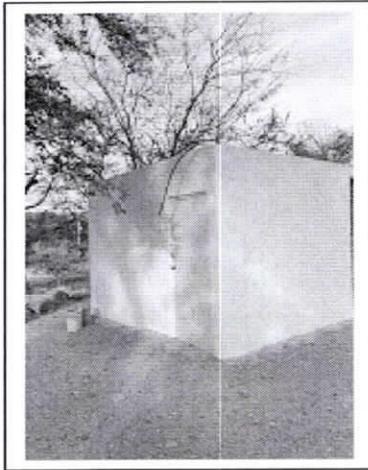

Álamos (Cabecera)

ATENTAMENTE.-

*Sergio Arturo Meza Rubio*  
&

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio  
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FISE



Dirección de Desarrollo Social  
Municipio de Ficsario, Sonora

Hermosillo, Sonora, 6 de marzo de 2023

*[Handwritten signature]*

**SERGIO ARTURO MEZA RUBIO**  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION Y AVANCE FISICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL RECURSO FISE (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES)

Se le comisiona a:

ROSARIO, QUIRIEGO Y ALAMOS (CABECERA), SONORA

Durante el ( los ) día ( s ) 7 AL 8 DE MARZO DE 2023

Vehículo No. 54

Marca FORD

Placas VC-31-204

Modelo 2005

Tipo PICK UP F 150

CONTROL NET:	300 Litros
CASSETAS:	\$500.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

*[Handwritten signature]*

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



C.c.p. Archivo  
C.c.p. Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



**INPI**  
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  
SAN BERNARDO, ALAMOS, SONORA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
