



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

Hermosillo, Sonora a 15 de Diciembre de 2023



ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
COORDINADORA GENERAL DEL FAIS
P R E S E N T E. –

En atención al aviso de comisión con fecha del 30 de noviembre de 2023, con ruta de traslado del 12 al 14 de diciembre de 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión de obras en proceso y verificar proyectos terminados, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2023; asesorar a los municipios en la planeación y captura de sus proyectos en la MIDS; recabar evidencia fotográfica de las obras; y recabar información para complementar los informes de cierre de año.

LUGAR DE COMISIÓN: Municipios de San Ignacio Río Muerto, Rosario y Benito Juárez, Sonora.

SAN IGNACIO RÍO MUERTO

En ésta localidad me recibió el Ing. Jorge Román Baca, Director de Obras Públicas y Enlace FAIS. Le comenté que el motivo de mi visita era recorrer las obras que tienen planeadas en la plataforma MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social). Me dijo que por motivos de salud, él no me iba a poder acompañar. Le dió instrucciones al Ing. José Ricardo Gutiérrez Enríquez, Supervisor de obras, para que me acompañara en el recorrido. Antes de salir al recorrido le sugerí al Ing. Baca que para el próximo año primero hicieran la planeación de un proyecto en la MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social) posteriormente la ejecución del mismo. Así mismo que iniciaran la Planeación de sus proyectos de ser posible desde el primer trimestre, para que sus proyectos pasen por un proceso de revisión técnico normativo por parte de la DGDR (Dirección General de Desarrollo Regional). También estuvimos comentando la situación de un proyecto que en la MIDS tenía la observación de que se contraponen con la Normatividad del FAIS, por lo que decidieron eliminarla de la MIDS y capturarla de nuevo, tomando en cuenta todas las observaciones que le hizo la DGDR a dicho proyecto. Pero al querer capturar el proyecto de nuevo el sistema no se los permitió, por lo que en la MIDS aparece con un monto no planeado, el cuál seguramente les será requerido que lo regresen, por no haberlo planeado. Yo les sugerí elaborar un escrito relatando todo lo sucedido, lo apoyaran documentalmente con los antecedentes y lo envíen a la DGDR. Les proporcioné la información de a quién dirigir el oficio y los correos electrónicos. Terminada la conversación, nos dispusimos el Ing. Gutiérrez y yo a iniciar el recorrido por sus obras. Las obras visitadas fueron las que se relacionan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIONES
117802	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ARTISTICO Y CULTURAL EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	\$ 3,006,000.00	AVANCE APROXIMADO DEL 40%
178297	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ESTADIO DE FUTBOL 2DA. ETAPA COL. MILITAR	\$ 2,997,498.00	AVANCE APROXIMADO DEL





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

			50%, YA ESTÁ SUMINISTRADO EL PASTO, FALTA INSTALARLO, EL ARENADO Y EL CAUCHO.
385504	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL LUIS BARRIOS	\$ 232,416.00	POR ESTIMACIÓN DEL ING. GUTIÉRREZ, YA ESTÁ TERMINADO AL 100%.
387822	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL CON BALASTRE EN EJ. AGRARISTAS	\$ 209,475.59	AVANCE DEL 100%
391113	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL DE LA LOCALIDAD EL TETABIATE	\$ 85,000.00	AVANCE DEL 90%, FALTAN DETALLES, PERFILADO DE LA PUERTA Y LA VENTANA.
392429	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL EN SINGAPUR	\$ 85,000.00	AVANCE DEL 90%, FALTAN DETALLES, PERFILADO DE LA PUERTA Y LA VENTANA.
393311	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 425,000.00	POR FALTA DE TIEMPO SE REVISARON 9 TECHOS DE UN TOTAL DE 17. SEGÚN EL ING. GUTIÉRREZ EL AVANCE GENERAL ES DEL 90%.
404488	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDA RURAL EN SINGAPUR	\$ 25,000.00	AVANCE ESTIMADO DEL 85%, FALTA YESO EN LA LOSA.
405264	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN VIVIENDA URBANA CABECERA MUNICIPAL	\$ 25,000.00	AVANCE DEL 100%
405631	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME EN LOCALIDAD SINGAPUR	\$ 12,500.00	AVANCE DEL 100%




Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

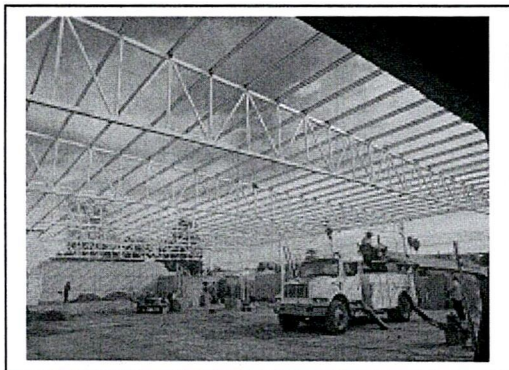


SAN IGNACIO RÍO MUERTO (CABECERA)

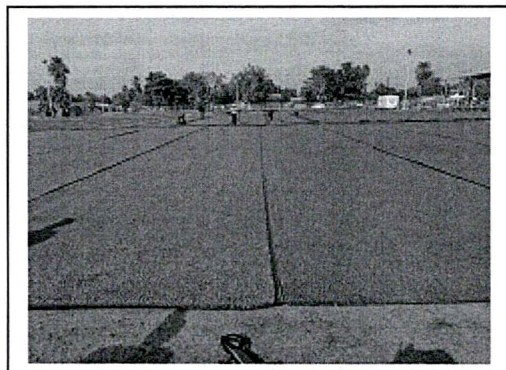

SAN IGNACIO RÍO MUERTO (CABECERA)

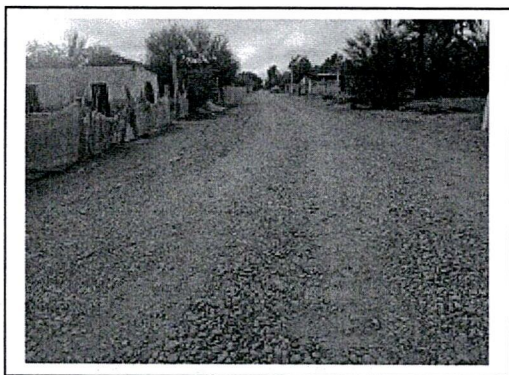

EJIDO AGRARISTAS (SAN IGNACIO RÍO MUERTO)

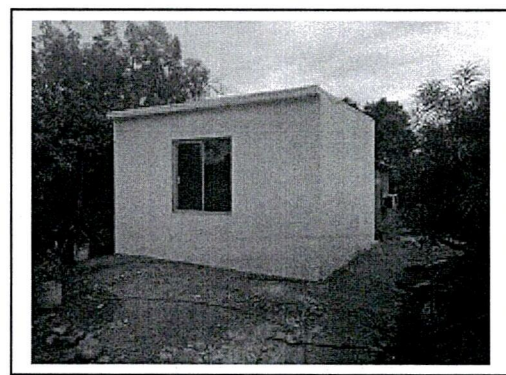

EL TETABIAE (SAN IGNACIO RÍO MUERTO)



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

BENITO JUÁREZ

En ésta localidad me recibió y atendió el Ing. José Francisco Moroyoqui Espinoza, Director de Obras Públicas y Enlace Municipal. Le comenté al Ing. Moroyoqui que el motivo de mi visita era solicitarle información de los proyectos que tienen planeados en la MIDS. Dicha información es necesaria para complementar los informes para el cierre del año. Los informes requeridos son: el informe mensual de Diciembre 2023, el concentrado de obras correspondiente al cuarto trimestre del 2023 y el informe POA correspondiente al cuarto trimestre del 2023. Lo asesoré en el proceso para extraer la información solicitada, de la plataforma MIDS. Después de que el Ing. Moroyoqui me entregó la información, platicamos sobre los cambios en la MIDS en éste año, hice énfasis sobre las fechas de programación de sus proyectos, le sugerí al Ing. Baca que para el próximo año primero hicieran la planeación de un proyecto en la MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social) y posteriormente llevaran a cabo la ejecución del mismo. Así mismo que iniciaran la Planeación de sus proyectos de ser posible desde el primer trimestre, para que sus proyectos pasen por un proceso de revisión técnico normativo por parte de la DGDR (Dirección General de Desarrollo Regional).

ROSARIO

En ésta localidad me recibió el Arquitecto Luis Ángel Clark Franco, Director de Obras Públicas y Enlace Municipal. Le comenté que el motivo de mi visita era recorrer las obras que tienen en proceso o ya terminadas. Se disculpó porque no me iba a poder acompañar, debido a que tenía mucha carga de trabajo. Le pidió al Ing. Jesús Alfonso Valenzuela Rochín, Residente de Obra, que me acompañara en el recorrido por las obras. Antes de salir al recorrido le sugerí al Ing. Baca que para el próximo año primero hicieran la planeación de un proyecto en la MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social) y posteriormente llevaran a cabo la ejecución del mismo. Así mismo que iniciaran la Planeación de sus proyectos de ser posible desde el primer trimestre, para que sus proyectos pasen por un proceso de revisión técnico normativo por parte de la DGDR (Dirección General de Desarrollo Regional). Terminada la conversación, el Ing. Valenzuela y yo nos dirigimos a realizar el recorrido por los proyectos que están en proceso en la Cabecera Municipal y en la localidad de Cedros. Las obras visitadas fueron las que se enlistan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIONES
229361	PAVIMENTACION DE CALLE SANTA ANA EN TESOPACO, ROARIO	\$ 905,615.42	AVANCE APROXIMADO DEL 15%
233394	PAVIMENTACION DE CALLE OVIACHIC EN TESOPACO ROSARIO	\$ 978,350.85	AVANCE APROXIMADO DEL 90%
233440	PAVIMENTACION DE CALLE COMURIPA EN TESOPACO ROSARIO	\$ 838,513.99	AVANCE APROXIMADO DEL 40%





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

233525	PAVIMENTACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO EN TESOPACO ROSARIO	\$ 482,461.76	AVANCE APROXIMADO DEL 5%, ACABAN DE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE TERRACERÍAS.
233597	PAVIMENTACION DE CALLE JESUS JOSE PORTELA ARGUELLES EN TESOPACO ROSARIO	\$ 739,423.57	AVANCE APROXIMADO DEL 80 %
239945	CONSTRUCCION CUARTOS DORMITORIOS EN CEDROS ROSARIO	\$ 356,401.46	AVANCE APROXIMADO DEL 65%, FALTAN ENJARRES, YESO EN LOSA, PINTURA, MPUERTA Y VENTANA.
261445	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS EN TESOPACO ROSARIO	\$ 339,517.39	AVANCE APROXIMADO DEL 50%
262123	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN TESOPACO ROSARIO	\$ 950,403.92	POR FALTA DE TIEMPO SOLO RECORRIMOS 4 DE UN TOTAL DE 8 CUARTOS. POR COMENTARIOS DEL ING. VALENZUELA EL AVANCE GENERAL ES DEL 50% APROXIMADAMENTE




Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

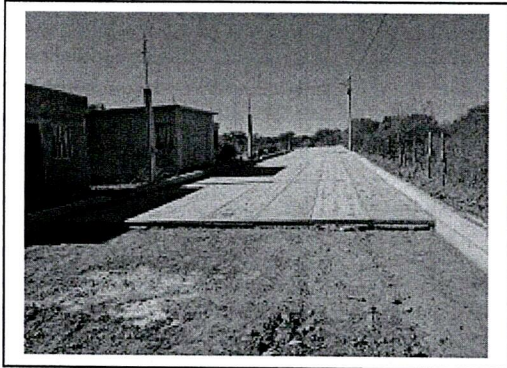


TESOPACO (ROSARIO)

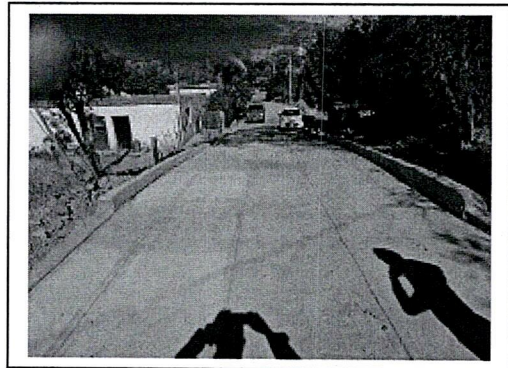

TESOPACO (ROSARIO)

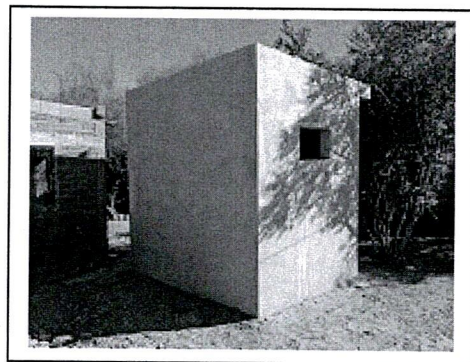

TESOPACO (ROSARIO)

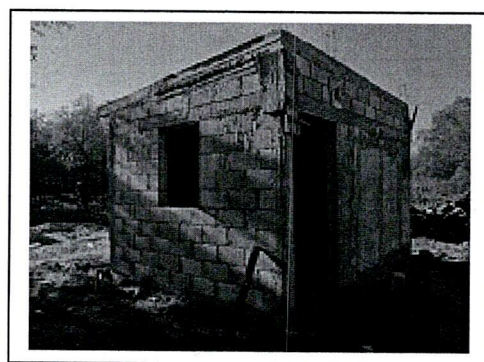

CEDROS (ROSARIO)

Posteriormente, me dispuse a regresar a la Cd. De Hermosillo.


ATENTAMENTE.-

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

Hermosillo, Sonora, 30 de noviembre de 2023

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISION DE OBRA EN PROCESO FINANCIADOS CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)2023

Se le comisiona a:

BENITO JUAREZ, ROSARIO Y SAN IGNACIO RIO MUERTO (LOCALIDADES), SONORA

Durante el (los) día (s) 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023

Vehículo No. VRP-3

Marca JAC

Placas UV-9787-A

Modelo 2023

Tipo PICK UP

CONTROL NET:	250 Litros
CASSETAS:	\$286.00
GASOLINA:	



ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y PLANEACION



Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora

C.c.p. Archivo
C.c.p. Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

