



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
DE SONORA

F-2396

Hermosillo, Sonora a 03 de octubre de 2023

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
COORDINADORA GENERAL DEL FAIS
P R E S E N T E. –

En atención al aviso de comisión con fecha del 19 de septiembre de 2023, con ruta de traslado del 27 al 29 de septiembre de 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión de obras en proceso y obras terminadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2023, asesorar a los municipios en la captura de sus proyectos en la MIDS y recabar evidencia fotográfica.

LUGAR DE COMISIÓN: Municipios de Quiriego y Benito Juárez, Sonora.

QUIRIEGO



En ésta localidad me recibió el Ing. Sergio Valdez, Director de Obras Públicas. Le comenté que el motivo de mi visita era recorrer las obras, del ejercicio 2023, que tienen en proceso o ya ejecutadas, pero que aún no están capturadas en la plataforma MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social). Me dijo que él mismo me acompañaría. Antes de salir al recorrido, le comenté que debido a que nosotros ya no podemos ingresar a la MIDS, estamos solicitando el apoyo de los Enlaces Municipales, para que nos envíen la información de los proyectos que tienen capturados en la plataforma, para poder nosotros elaborar los informes mensuales y trimestrales, además de elaborar las actas de entrega recepción de los proyectos. Dicha información nos permitirá monitorear la planeación en la MIDS de los Municipios y señalar oportunamente posibles observaciones a los proyectos. Finalmente, le reiteré que estamos a la disposición, para apoyarlos en cualquier tema de FAIS, ya sea sobre la planeación de proyectos, comités de participación social, cédulas de verificación, CUIS, etc. Posteriormente, nos dirigimos a hacer el recorrido por las obras. Los proyectos que revisamos se enlistan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIONES
SIN FOLIO MIDS AÚN	REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BATACOSA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.	\$148,787.99	SE SUMINISTRARON Y COLOCARON 8 POSTES DE 6 M., 8 LÁMPARAS, 8 BASES PIRAMIDALES DE CONCRETO, 4





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

			REGISTROS Y 1 TABLERO DE CONTROL. AVANCE 100%.
SIN FOLIO MIDS AÚN	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BATACOSA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.	\$176,993.96	SE SANDBLASTEÓ EL INTERIOR DEL TANQUE, SE PINTÓ EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL TANQUE, ASÍ COMO LA ESTRUCTURA METÁLICA. AVANCE 100%
SIN FOLIO MIDS AÚN	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.	\$353,987.92	SE SANDBLASTEÓ EL INTERIOR DEL TANQUE, SE PINTÓ EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL TANQUE, ASÍ COMO LA ESTRUCTURA METÁLICA. AVANCE 100%. AVANCE 100%
SIN FOLIO MIDS AÚN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO ROTOPLAS DE 10,000 LITROS EN LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.	\$39,461.02	SE SUSTITUYÓ EL TINACO ANTERIOR. AVANCE 100%
SIN FOLIO MIDS AÚN	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS DE LA LOCALIDAD DE QUIRIEGO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.	\$5,875.00	SÓLO SE SUSTITUYERON LOS FOCOS. AVANCE 100%
SIN FOLIO MIDS AÚN	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO CEREMONIAL INDÍGENA DE LA LOCALIDAD DE TEPAHUI, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.	\$89,668.06	TECHUMBRE A BASE LÁMINA GALVANIZADA, SOPORTADA Y FIJADA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE PERFILES PTR. AVANCE 100%
SIN FOLIO MIDS AÚN	APLANADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR DE MUROS DEL CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE TEPAHUI, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.	\$69,940.64	APLANADOS A BASE DE CAL Y ARENA. AVANCE 100%



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

SIN FOLIO MIDS AÚN	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEPAHUI, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.	\$176,993.96	SE SANDBLASTEÓ EL INTERIOR DEL TANQUE, SE PINTÓ EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL TANQUE, ASÍ COMO LA ESTRUCTURA METÁLICA. AVANCE 100%.
SIN FOLIO MIDS AÚN	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO O TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GOYJAQUÍA, MUNICIPIO DE QUIRIEGO.	\$176,993.96	SE SANDBLASTEÓ EL INTERIOR DEL TANQUE, SE PINTÓ EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL TANQUE, ASÍ COMO LA ESTRUCTURA METÁLICA. AVANCE 100%.

Después de terminado el recorrido, ya de regreso en el Ayuntamiento, El Ing. Valdez y yo tuvimos una reunión con el C. Juan Ignacio Zazueta Ruiz, Presidente Municipal de Quiriego. Comentamos sobre el recorrido que hicimos a las obras 2023. Así mismo le comenté de la importancia de hacer una planeación oportuna de sus proyectos en la plataforma MIDS, le mencioné que actualmente está cerrada para la captura de proyectos, pero que se abrirá de nuevo el 01 de octubre de 2023 y se cerrará el 03 de diciembre de 2023, por lo que prácticamente solo quedan 2 meses para capturar proyectos en la MIDS. El Ing. Valdez mencionó que en cuanto se abra la plataforma, empezará a capturar los 9 proyectos que verificamos. El Presidente me preguntó sobre el tema de los Despachos de Asesores externos, que recientemente se han estado comunicando con él para ofrecerle obtener recursos FAIS adicionales a lo asignado en éste año 2023. Yo le mencioné que la DGDR (Dirección General de Desarrollo Regional) hace mucho énfasis en no contratar a esos Despachos externos, que no es cierto los ofrecimientos que hacen dichos Despachos. Terminando la plática, nos tomamos una foto, me despedí y pasé a retirarme.




Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

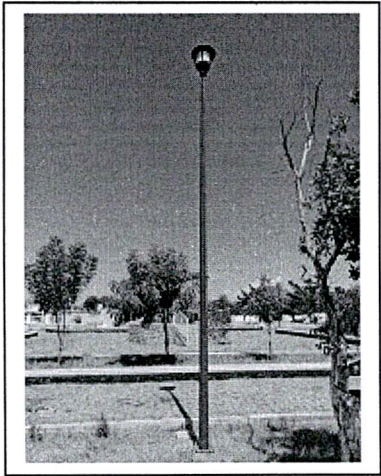


Batacosa (Quiriego)

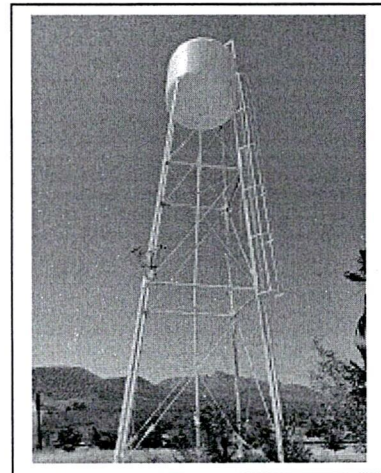

Batacosa (Quiriego)

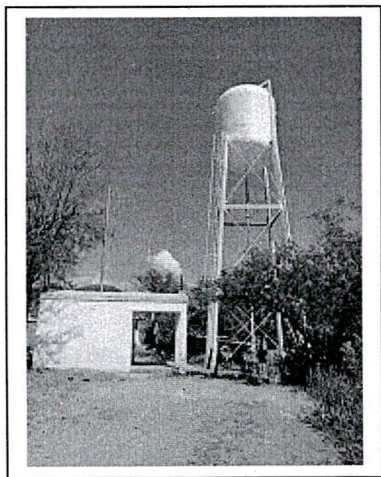

Quiriego (Cabecera)

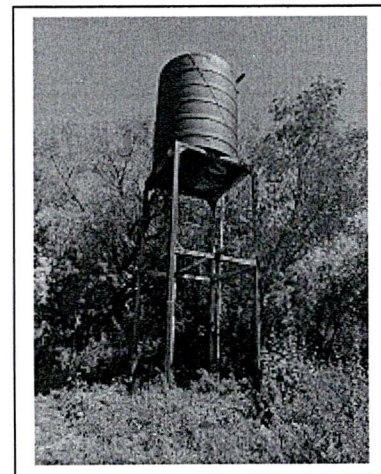

Quiriego (Cabecera)




Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
DE SONORA

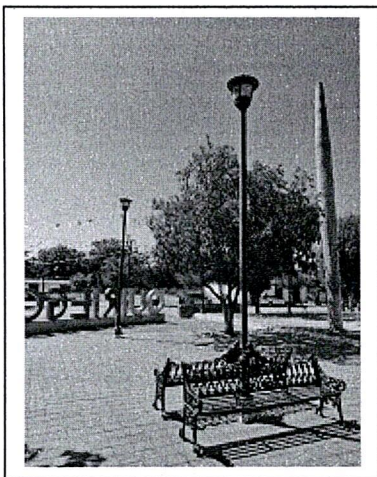


Quiriego (Cabecera)



Tepahui (Quiriego)

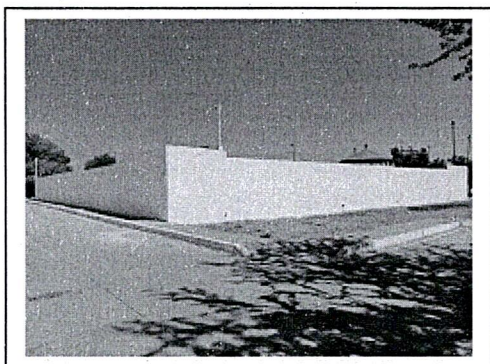

Tepahui (Quiriego)

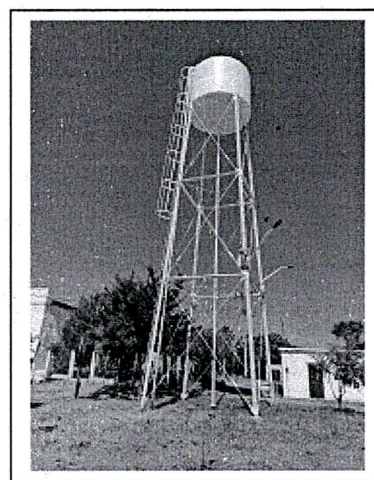

Tepahui (Quiriego)




Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

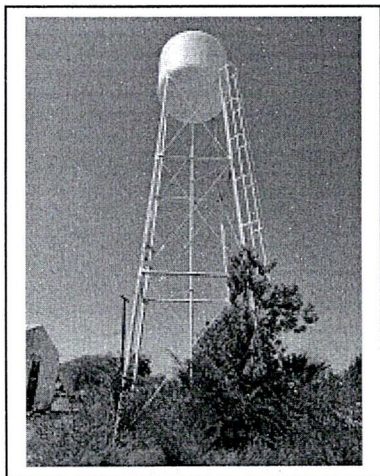

Goyjaquía (Quiriego)

BENITO JUAREZ

En ésta localidad me recibió el Ing. José Francisco Moroyoqui Espinoza. Le comenté que la razón de mi visita era verificar las obras, del ejercicio 2023, que tienen en proceso o ya ejecutadas, pero que aún no capturan en la plataforma MIDS. El Ing. Moroyoqui le dió instrucciones al Ing. Moisés García Arce, Auxiliar de Proyectos, para que me acompañara. Antes de salir al recorrido, también al Ing. Moroyoqui, le comenté que debido a que nosotros ya no podemos ingresar a la MIDS, estamos solicitando el apoyo de los Enlaces Municipales, para que nos envíen la información de los proyectos que tienen capturados en la plataforma, para poder nosotros elaborar los informes mensuales y trimestrales, además de elaborar las actas de entrega recepción de los proyectos. Dicha información nos permitirá monitorear la planeación en la MIDS de los Municipios y señalar oportunamente posibles observaciones a los proyectos. Finalmente, le reiteré que estamos a la disposición, para apoyarlos en cualquier tema de FAIS, ya sea sobre la planeación de proyectos, comités de participación social, cédulas de verificación, CUIS, etc. Posteriormente, nos dirigimos a hacer el recorrido por las obras. Los proyectos que revisamos se enlistan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIONES
SIN FOLIO MIDS AÚN	TECHO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ	\$126,315.60	192 M2 DE TECHOS. DE LOS 8 TECHOS DE LÁMINA SE VERIFICARON



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
del **SONORA**

			6, 1 DE ELLOS NO SE VISITÓ PORQUE EL ING. MOROYOQUI DIJO QUE AÚN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS Y EL OTRO, EL DE MARTHA LUNA GARCIA, NO ENCONTRAM OS EL DOMICILIO. EN TODOS LOS TECHOS QUEDARON HUECOS ENTRE EL TECHO DE LÁMINA Y LOS MUROS DONDE SE APOYAN Y FALTA COLAR LA PROLONGACI ÓN DEL CASTILLO EN TRE LA CADENA DE CERRAMIENT O Y EL TECHO DE LÁMINA.
SIN FOLIO MIDS AÚN	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD ZONA URBANA	\$380,000.00	AVANCE DEL 100%
	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ	\$260,544.60	LONGITUD DEL ANDADOR 180 ML. AVANCE DEL 100%.
SIN FOLIO MIDS AÚN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE AV.	\$80,000.00	NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS.



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

	ANGOSTURA Y AV. VALSEQUILLO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ.		
SIN FOLIO MIDS AÚN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ.	\$130,000.00	NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS.
SIN FOLIO MIDS AÚN	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. GALEANA ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD COL. JECOPACO.	\$75,000.00	NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS.
SIN FOLIO MIDS AÚN	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN PRINCIPAL BAJO Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE EN LA LOCALIDAD ZONA URBANA.	\$50,000.00	AVANCE DEL 100%
SIN FOLIO MIDS AÚN	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE CALLES DIVISIÓN DEL NORTE Y PLAN DE IGUALA EN LA LOCALIDAD ZONA URBANA.	\$664,616.19	NO SE APRECIAN LOS TRABAJOS, LAS EXCAVACIONES YA SE RELLENARON Y EN ÉSTA RED NO SE CONSTRUYERON CUADROS DE VÁVULAS, POR LO QUE NO PUDE TOMAR FOTOS DE EVIDENCIA.
SIN FOLIO MIDS AÚN	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. FRANCISCO MÁRQUEZ ENTRE CALLES DIVISIÓN DEL NORTE Y PLAN DE IGUALA EN LA LOCALIDAD ZONA URBANA.	\$887,796.06	LONGITUD DE LA RED 371 ML. EN UNO DE LOS TRAMOS DE LA RED ESTÁN VISIBLES 4 POZOS DE VISITA INCONCLUSO, LES FALTA EL BROCAL Y LA TAPA, ADEMÁS DEL RELLENO COMPACTAD



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
DE SONORA

			O. EN EL OTRO TRAMO SOLO HAY UN POZO DE VISITA VISIBLE, PERO ES ANTIGUO, SE VÉ OXIDADO. POR COMENTARIO DEL ING. MOROYOQUI, EL AVANCE DE LA OBRA ES DE 80%.
--	--	--	--


Ya de regreso en el Ayuntamiento, me reuní con el Ing. Moroyoqui. Comentamos los avances de los proyectos. También le comenté los detalles de los huecos entre los muros y los techos de lámina. El Ing. Moroyoqui respondió que el presupuesto solo incluía el techo de lámina, que el sellado de los huecos y el colado de la prolongación de los castillos, lo harían los beneficiarios. También le comenté que de los 6 techos de lámina vistos, 3 están apoyados sobre polines y barrotes de madera. Además que la forma en que está fijada la techumbre a los muros de madera no es la recomendable, es muy insegura. En caso de vientos muy fuertes se puede desprender la lámina. El Ing. Moroyoqui me dijo que revisaría esos techos.

Terminada la reunión, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

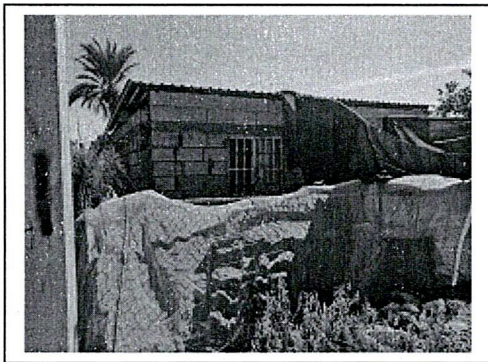

Batacosa (Quiriego)

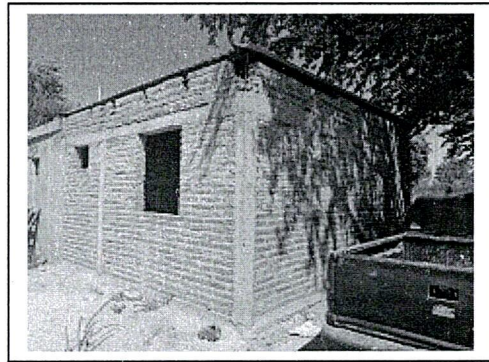

Batacosa (Quiriego)




Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
DE SONORA

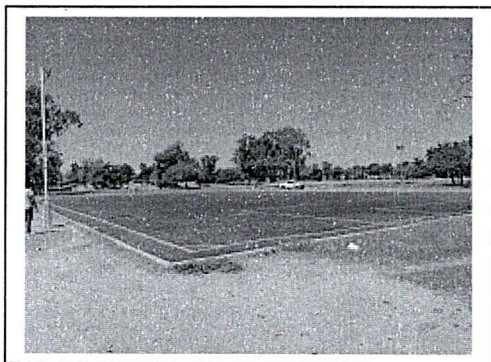


Zona Urbana (Benito Juárez)

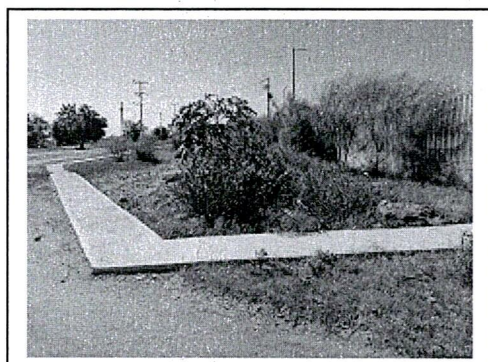

Villa Juárez (Benito Juárez)

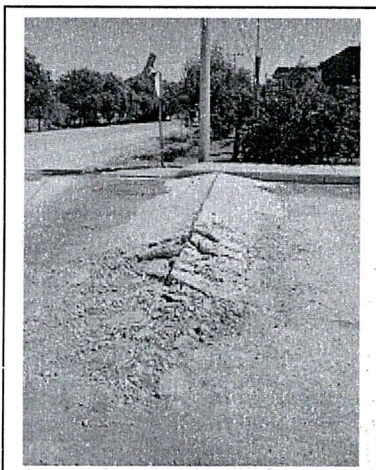

Colonia Jecopaco (Benito Juárez)

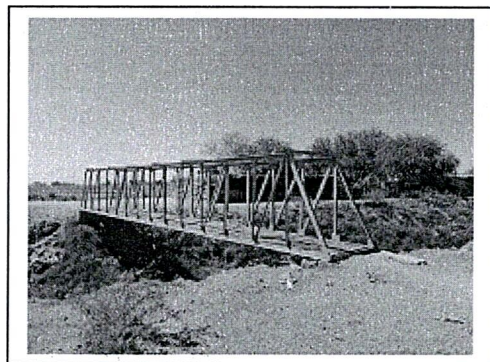

Zona Urbana (Benito Juárez)




Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

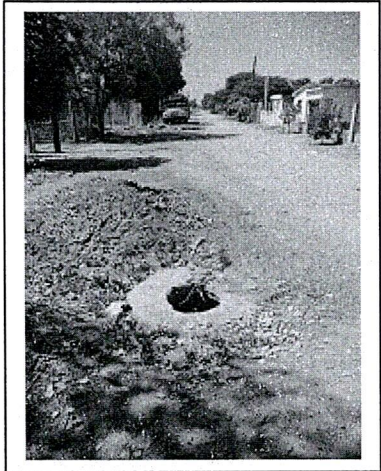

Zona Urbana (Benito Juárez)

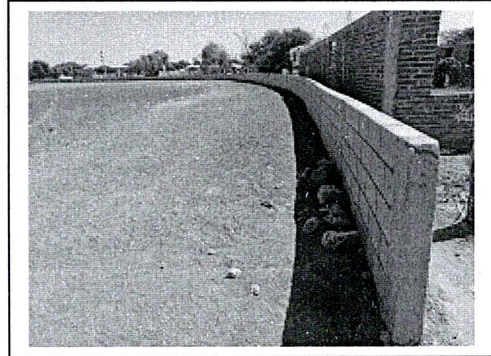

Agua Blanca (Benito Juárez)

ATENTAMENTE-


Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

COORDINACION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Hermosillo, Sonora, 19 de septiembre del 2023

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO

PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISION DE OBRAS EN PROCESO, VERIFICAR PROYECTOS YA TERMINADOS, FINANCIADOS CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISDMF) 2023, ASESORAR Y AYUDAR A LOS MUNICIPIOS EN LA PLANEACION Y CAPTURA DE PROYECTOS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN.

Se le comisiona a:

QUIRIEGO Y BENITO JUAREZ (LOCALIDADES), SONORA

Durante el (los) día (s) 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Placas VD-64-443

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	200 Litros
CASSETAS:	\$184.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BERTA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y PLANEACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
