

765-I



HERMOSILLO, SONORA A 16 DE NOVIEMBRE 2021.

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE.-

LA COLORADA

EN EL H. AYUNTAMIENTO DE LA COLORADA, SONORA, FUI ATENDIDA POR EL LIC. MARCO ANTONIO ESCALANTE PLATT, PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL ING. ANDRÉS LUCERO LÓPEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EL TEMA PRINCIPAL EN ESTA REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS FUE LA PLANEACIÓN DE OBRAS CON EL RECURSO RESTANTE QUE CORRESPONDE AL 26.55%, POR LA CANTIDAD DE \$209,950.00 DEL TOTAL ASIGNADO, EL ALCALDE SE COMPROMETE A REALIZAR LAS OBRAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE PIMAS; 2 TECHOS Y 1 ENJARRE, TAMBIEN EN LA COMUNIDAD DE TECORIPA, 2 TECHOS Y 1 BAÑO, CON ESTO CONCLUIMOS CON EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO 2021. EL COMPROMISO POR PARTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FUE QUE ANTES DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE SE TENDRÁ LA MIDS AL 100 CON LA PROYECCION.

COMO RESULTADO SE OBTUVIERON LAS 5 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) 2021, LA OBRAS VISITADAS FUERON EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LA COMUNIDAD DE TECORIPA, POR LA RAZON QUE ERAN LAS QUE FALTABAN Y FIRMAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR LOS BENEFICIARIOS.

HASTA EL DÍA DE HOY SE CUENTA CON TODAS LAS ACTAS DE LAS OBRAS CAPTURADAS Y EJECUTADAS.

TOTAL FISMOF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	73.45%	\$ 580,861.00	26.55%	\$ 209,950.00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
144288	AMPLIACION DE 110 ML DE TUBERIA DE PVC DE 3" PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA	\$112,328.85	LA COLORADA	TECORIPA	100

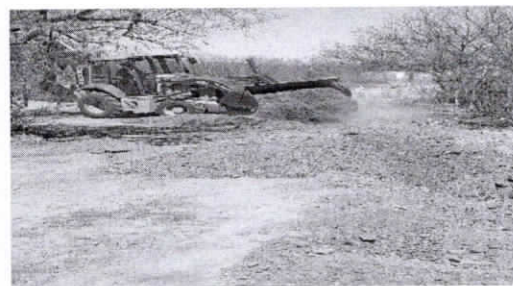


# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
271793	EQUIPAMIENTO DE BOMBA Y SERVICIO DE POZO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE LA COLORADA	\$95,120.00	LA COLORADA	LA COLORADA	100






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

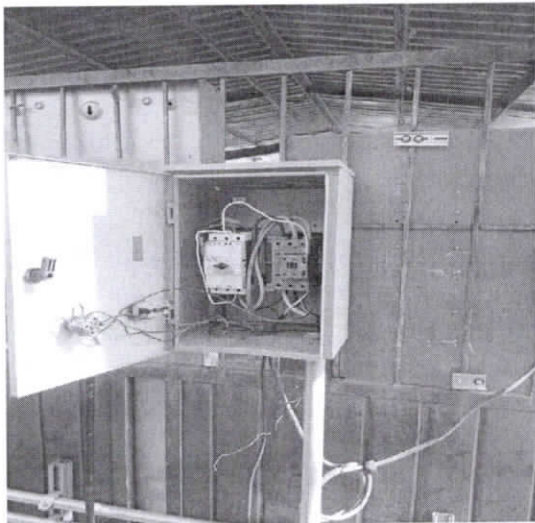

# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
271825	EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TECORIPA	\$106,720.00	LA COLORADA	TECORIPA	100

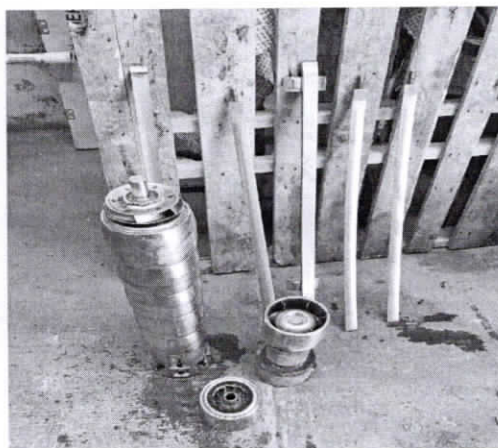

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

765-I

ONAVAS

EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS, FUI ATENDIDA POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES EL C. FRANCISCO VELASQUEZ MANZANARES Y EL C. RAFAEL VALENZUELA, ENLACE DE LA ALCALDESA, AQUÍ NOS DIMOS A LA TAREA DE VISITAR LOS OBRAS DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, SE HA DIALOGADO CON LA ALCALDESA PORQUE EXISTE LA PROBLEMÁTICA DE QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR SOLAMENTE SUBIÓ A LA PLATAFORMA EL 52% DEL RECURSO ASIGNADO CORRESPONDIENTE A \$2,399,283.00, CON 5 PROYECTOS EN LA MATRIZ DE INVERSION DE LOS CUALES SE ENCUNTRAN TERMINADOS SOLAMENTE 2 PROYECTOS DE LOS CUALES SE CUENTAN CON LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y EL RESTO SE ENCUENTRAN CON OBSERVACIONES, LAS CUALES SE DETALLAN A EN ESTE REPORTE:

EL DIA DE HOY MARTES 16 DE NOVIEMBRE SE ATENDERÁ A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE ONAVAS EN LAS OFICINAS DE FAIS POR PARA BUSCARLE UNA SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA QUE DEJÓ LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, YA QUE ASEGURA QUE NO SE ENCONTRÓN LA CANTIDAD DE DINERO EN LA CUENTA COMO LO DICE EL SISTEMA, LA IDEA ES CERRAR LA PLATAFORMA DE LA MIDS AL 100%.

NOTA: POR PARTE DE FAIS SE HA TRATADO DE PLATICAR CON LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR PARA DARLES LA OPORTUNIDAD DE SUBIR LAS OBRAS FALTANTES Y SE NO HA LOGRADO TENER UNA RESPUESTA FAVORABLE.

TOTAL FISMDF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	52.56%	\$ 2,399,283.1	47.44%	\$ 2,165,822.1

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

765 - I

# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
35680	REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN 2DA. ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS, SONORA.	\$91,665.30	ONAVAS	ONAVAS	100

- SE CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
37922	REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS MUNICIPIO DE ONAVAS SONORA.	\$505,992.00	ONAVAS	ONAVAS	100

- SE CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
181810	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ONAVAS, MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA.	\$521,616.70	ONAVAS	ONAVAS	100







SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE **SONORA**

765-I

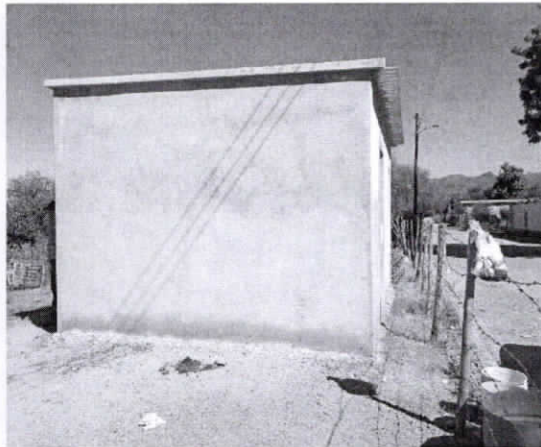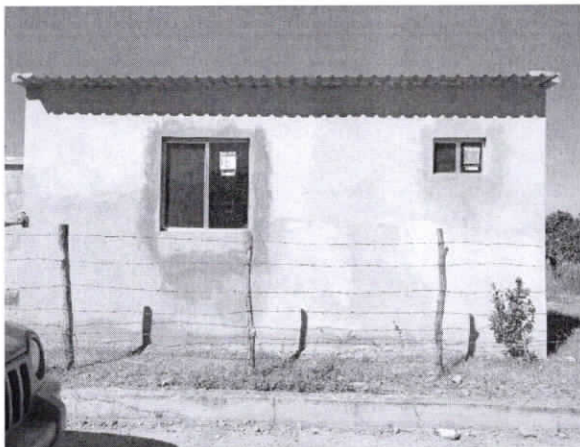

ESTE PROYECTO QUE CONSTA DE 5 CUARTOS SE ENCUENTRAN INCONCLUSOS ENTRE ELLOS LUZ ELECTRICA, DRENAJE, DETALLES DE ACABADO.

# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
181953	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE ONAVAS, MUNICIPIO DE ONAVAS, SONORA.	\$ 104,323.3 6	ONAVAS	ONAVAS	100



[Handwritten signature]



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

765-I

# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
186209	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE J. ALLENDE ENTRE CALLES CALVARIO Y PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	\$1,175,685.6 7	ONAVAS	ONAVAS	100



SAN JAVIER

EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER FUI ATENDIDA POR LA ALCALDESA LA LIC. ROSA MARIA ENCINAS CORNEJO, AQUÍ SOLAMENTE ESTA UNA OBRA CAPTURADA, AQUÍ SE ENCONTRÓ EN LA CUENTA LA CANTIDAD MARCADA EN EL SISTEMA, SOLO QUE LA ALCALDESA NO TIENE PLANES DE DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA, POR LA RAZON QUE SE ENCONTRÓ MUY POCA AGUA EN EL POZO DEL MUNICIPIO.

COMENTA LA CIUDADANA QUE SE MANDARON HACER ANALISIS DEL AGUA DE LAS MINAS MAS CERCANAS AL PUEBLO Y LE DAN RESPUESTA DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE Y A PARTIR DE LA RESPUESTA SE TOMARÁ LA DECISIÓN SI SE BAJA EL AGUA DE LAS MINAS Y SE INICIA CON EL EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES Y





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

765 - I

MANGUERAS. COMENTA QUE HACE APROXIMADAMENTE SE HIZO UN PROYECTO POR PARTE DE LA CEA DONDE SE TIENE UNA INVERSIÓN APROXIMADAMENTE DE 2 A 3 MILLONES Y UNA BOMBA DE APOXIMADAMENTE 1 MILLON DE PESOS LO CUAL ME PIDIÓ LE AYUDARA A CHECAR CON DICHA DEPENDENCIA SI EL PROYECTO ANTES MENCIONADO NO TIENE FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE AGUA SE PUEDEN MOVER LOS PANELE Y LA BOMBA, PORQUE SI ASI FUERA SE AHORRARIA EL DINERO QUE RESTA DE FAIS Y PUDIERA UTILIZARLO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

AQUÍ NO LEVANTÓ ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR MOTIVO QUE LA OBRA NO SE CONCLUYO.

SE PIDIÓ APOYO PARA TRÁMITE CON LA CFE PORQUE SE TIENE PROBLEMAS CON 2 RECIBOS DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE Y TIENE EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA SIN ENERGIA ELECTRICA.

TOTAL FISIMDF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	55.56%	\$ 318,000.0	44.44%	\$ 254,387.0

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
110809	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER, SONORA	\$318,000.00	SAN JAVIER	SAN JAVIER	80



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

765 - I



SUAQUI GRANDE

EN ESTE MUNICIPIO FUI ATENDIDA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. CARLOS ARMANDO CARRILLO DUARTE Y EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, EL ING. MANUEL HORACIO CAMPA VASQUEZ, A QUIEN SE LES CAPACITÓ Y SE SUBIO EL 100% DEL RECURSO QUE SE TENIA DISPONIBLE, SE CUENTA CON EL 100% DE LAS ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN. EN ESTE MUNICIPIO SOLO FALTA 1 OBRA DE DRENAJE PARA CERRAR EL AÑO 2021 CON ÉXITO.

TOTAL FISIMDF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	100.00%	\$ 1,308,572.1	0.00%	\$ 0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
45512	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NO REELECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, SONORA.	\$329,761.35	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	100



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

765-I

45897	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, SONORA.	\$85,618.76	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	100
46034	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA ANTONIO SALGADO DE LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, SONORA.	\$59,209.07	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	100
78823	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SECUNDARIO ZONA ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA.	\$324,473.55	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	100
209071	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE, SONORA.	\$208,646.67	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	100





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

765 - I



OBRA POR INICIAR

# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
290048	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE SONORA	\$300,862.60	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	0



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

765 - I



VILLA PESQUEIRA

EN ESTE MUNICIPIO SE TUVO REUNIÓN EN LA SALAS DE JUNTAS CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. MIGUEL OVIED ROBINSON BOURS DEL CASTILLO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SINDICA MUNICIPAL, LA MAYOR PREOCUPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS ES UN FALTANTE DE RECURSO QUE NO SE TIENE CLARO, SE HAN CITADO LOS EXFUNCIONARIOS Y HACEN CASO OMISO A LOS CITATORIOS, DIAS PASADOS TUVE UNA PLATICA CON EL ALCALDE ALCTUAL Y ME AUTORIZÓ QUE PODIA YO HABLAR CON EL EX PRESIDENTE PARA LLEAR A UN ACUERDO QUE SUBIERA A LA MIDS LOS PROYECTOS QUE FALTAN SI LOS HAY Y MUY FORMALMENTE QUEDÓ DE REGRESARME LA LLAMADA PARA PONERNOS DE ACUERDO Y NO SUCEDIÓ LO ACORDADO.

ACOMPAÑADA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL SEÑOR ADRIAN OTHON, FUIMOS A VISITAR LAS DOS OBRAS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN,





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

ACLARANDO QUE NINGUNA DE LAS 2 SE ENCUENTRA TERMINADA COMO LO REVELAN LAS FOTOGRAFÍAS.

TOTAL FISMDF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	50.47%	\$ 362,329.4	49.53%	\$ 355,563.5

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
200137	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO A JOSE ANTONIO BRACAMONTES MORENO DE LA LOCALIDAD DE MATAPE MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA.	\$174,120.07	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	70



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

765 -I



# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
200152	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A DIANA MARÍA DUARTE MORENO DE LA LOCALIDAD DE MATAPE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA.	\$67,452.92	VILLA PESQUEIRA	VILLA PESQUEIRA	70



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

765-I



# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
200188	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA Y POLIN MONTEN A GUADALUPE GARCÍA SANTACRUZ DE LA LOCALIDAD DE NACORI GRANDE, MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, SONORA.	\$120,756.49	VILLA PESQUEIRA	NACORI GRANDE	0

A ESTA VIVIENDA NO SE TUVO ACCESO POR LA RAZON QUE NO ESTABAN LOS BENEFICIARIOS.



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

765-I

SAN PEDRO DE LA CUEVA

EN ESTE MUNICIPIO FUI ATENDIDA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. RAMON ANGEL FIGUEROA NORIEGA Y EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES EL C. JESUS HUMBERTO RIVERA DORAME, QUIENES COMENTAN QUE EL POZO TIENE MUY BUEN NIVEL DE AGUA PERON PRESENTAN UNA PROBLEMÁTICA CON LA CUESTIÓN ELECTRICA, TIENEN DETALLES CON LAS CUCHILLAS Y PIDIERON APOYO PARA EL TRÁMITE CON LA CFE PARAN SABER SI LE CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO O A LA CFE ARREGLAR ESE DETALLE, EN EL MOMENTO SE LE DIO SOLUCIÓN IMEDIATA, MANDANDO EL OFICIO AL SUPER INTENDENTE DE ZONA HERMOSILLO, LA CFE SE COMPROMETIÓ A DAR RESPUESTA A LA BREVEDAD POSIBLE, SI LE COMPETE AL AYUNTAMIENTO SE INVERTIRÁ EL RESTO DEL RECURSO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA Y QUEDE EN FUNCIONAMIENTO EL PROYECTO ABAJO DESCRITO, SI ES PROBLEMA DE COMISIÓN FEDERAL Y EL RECURSO QUEDA LIBRE SE INVERTIRÁ EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (SE ANEXA OFICIO).

TOTAL FISMDF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	63.05%	\$ 1,004,353.00	36.95%	\$ 588,511.00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

# ID	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO DEL PROYECTO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AVANCE
201951	EQUIPAMIENTO POZO NUEVO EL PERU EN LOCALIDAD SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA.	\$1,004,353.00	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	70






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

765-I

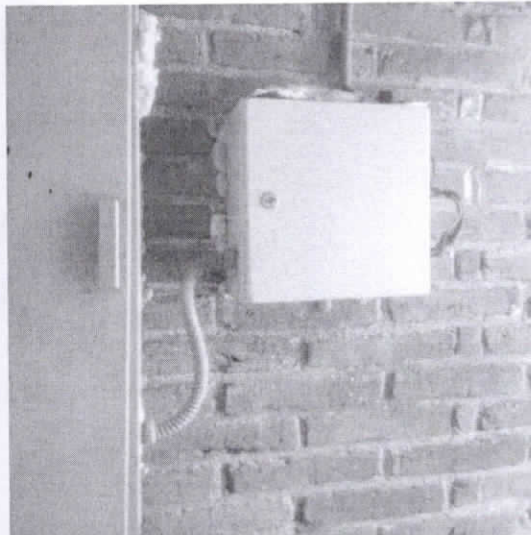

Secretaría Municipal
Asunto: Informativo
Oficio No. SPC- 066/2021
San Pedro de la Cueva, Son., a 12 de Noviembre de 2021.

ING. RAMIRO RUBI
SUPER INTENDENTE DE LA ZONA HERMOSILLO.
PRESENTE.-

Por medio de la presente solicitamos a la brevedad una revisión de las cuchillas y cableado que conecta las diversas bombas que abastecen de agua potable a nuestra comunidad San Pedro de la Cueva, Sonora. Ya que actualmente se tienen múltiples fallas en el servicio de energía eléctrica, solicitamos dicha revisión a la brevedad posible ya que es necesario saber si es problema es por parte de Comisión Federal de Electricidad o bien si dicho problema nos compete a el proyecto realizado por la Institución FAIS, de ser así repararlo de inmediato con un fondo que se cuenta en dicho proyecto antes de que la plataforma se cierre para poder subir este proyecto concluido. En caso que les compete a ustedes la reparación de igual manera solicitamos se repare lo más pronto posible para poder concretar en tiempo y forma dicha obra.

Sin otro asunto que tratar por el momento me despido de usted deseándole un excelente día. De antemano agradezco su atención. ¡Saludos cordiales!

ATENTAMENTE

C. RAMÓN ÁNGEL NÓRIEGA FIGUEROA
Presidente Municipal



COLEGIO INSIGNIA CON OMISION AL N.
TEL: 662.323.1140
SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA

www.futbol.com/sonora/SPC



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

765 - I

MAZATÁN

EN ESTE MUNICIPIO SE TUVO REUNIÓN CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. RAMON ROGELIO ESQUER GALVEZ, QUIEN COMENTA QUE NO SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA, ES POR LO QUE SE CITÓ EL EX TESORERO QUIEN ERA EL QUE LLEVABA TODO EL CONTROL DE FAIS EN LA ADMINITRACIÓN PASADA Y NO ACUDIÓ, ESTAS OBRAS NO FUERON SUPERVISADAS CON ANTERIORIDAD POR LA RAZON QUE SE SUBIERON A LA MATRIZ DE INVERSIÓN LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON NINGUNA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN HASTA ACLARAR BIEN EL PUNTO.

SE QUEDA PENDIENTE UNA CITA POR PARTE DEL ALCALDE PARA ACUDIR A VER LAS OBRAS EN COMPAÑÍA DEL EX TESORERO

TOTAL FISMDF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	80.00%	\$ 459,380.0	20.00%	\$ 114,845.0

196378	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE MAZATAN, SONORA	\$236,543.86	MAZATÁN	MAZATÁN	
196507	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A LA SEÑORA FRANCISCA RIVERA	\$29,945.20	MAZATÁN	MAZATÁN	
196518	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE MAZATÁN, SONORA.	\$86,465.94	MAZATÁN	MAZATÁN	





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
del **SONORA**

765 -I

220722	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN ALGUNOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE MAZATÁN	\$106,425.00	MAZATÁN	MAZATÁN	
--------	--	--------------	---------	---------	--

ATENTAMENTE

LIC. ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA
COORDINADOR REGIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



765 - I



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 3 de noviembre de 2021

ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

ASESORAR A LOS ENLACES MUNICIPALES EN EL MANEJO DEL SISTEMA MIDS (MATRIZ DE INVERSION) Y RECOGER
ACTAS DE ENTREGA RECEPCION.



SAN PEDRO DE LA CUEVA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2021 - 2024
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Se le comisiona a:

LA COLORADA, SUAQUI GRANDE, SAN JAVIER, ONAVAS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, VILLA PESQUEIRA Y MAZATÁN,
SONORA.

Durante el (los) día (s) 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Placas VD-64-443

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300



OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE
SUAQUI GRANDE, SONORA

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,500.00



H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA PESQUEIRA, SONORA

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA

H. AYUNTAMIENTO DE
ONAVAS, SONORA



H. Ayuntamiento de
San Javier, Sonora

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesante de la Secretaría de Desarrollo Vehicular
C.c.p. Interesado



Presidencia Municipal
Mazatán, Sonora.
