F-0178

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE SONORA

Hermosillo, Sonora; a 17 de Febrero del 2023

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 08 de Febrero del 2023, con ruta de traslado durante los días 09 de Febrero al 11 de Febrero del 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Apoyo para supervisión y avance físico de obras con recurso FISE (Fondo de Infraestructura Social para las Entidades), de la Dirección de Infraestructura Social de SEDESSON.

LUGAR DE COMISION: Rosario, Quiriego, Álamos y Etchojoa, Sonora.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
15 MAR 2023
9:43
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESULTADOS

Rosario

Nos trasladamos hasta la localidad **Paredones (El Saucito)**, para supervisar el avance físico de **7 sanitarios con biodigestores**, pertenecientes al contrato **SEDESSON- FISE-2022-050**, con el número de obra **C-00075/0792**, con un avance físico en promedio del **40%**; los trabajos realizados al momento siguen siendo la cimentación, albañilería, techumbre; quedando pendiente la instalación de puertas y ventanas, instalación eléctrica, mobiliario y acabados, la colocación del tinaco y el sistema de tratamiento y la colocación del yeso en la losa.

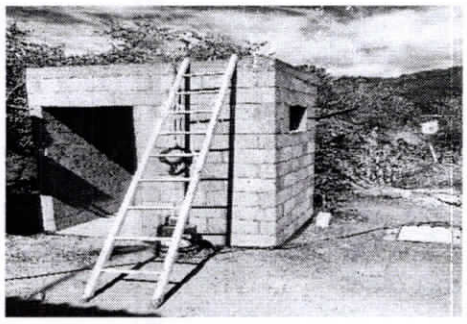
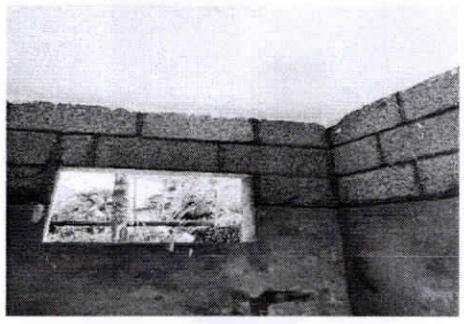

Continuando con el recorrido, nos trasladamos a la localidad **La Estrella**, para verificar el avance físico de **6 cuartos dormitorio**, correspondientes al contrato **SEDESSON- FISE-2022-050**, con el número de obra **C-00075/0806,** siendo este un promedio del **80%**; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, levantamiento de muros, construcción de loza y piso firme, enjarre grueso y fino, pintura general, yeso en la losa, la instalación de puertas y ventanas, el cableado

F-0178

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE SONORA

En la localidad de **Batacosa**, supervisamos **4 cuartos dormitorio**, detectando un avance en promedio del **45%**; y en la localidad **Cabora**, **2 cuartos dormitorio**, con avance físico del **57%**; dichas obras, también están establecidas en el contrato **SEDESSON- FISE-2022-050**, con el número de obra **C-00075/0805**; los trabajos realizados al momento siguen siendo: la cimentación, y el levantamiento de muros a base de block; quedando aún pendientes los trabajos de techumbre, enjarres, instalaciones eléctricas, cableado y accesorios, el piso firme, la instalación de puertas y ventanas y los trabajos de pintura.

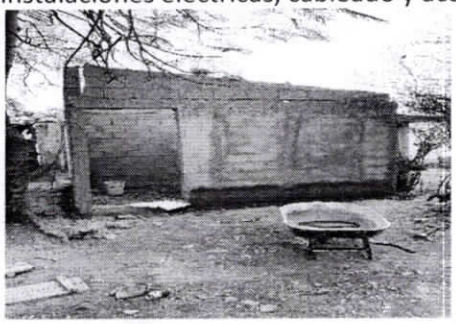
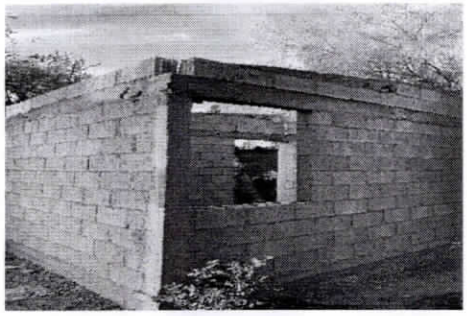

Álamos

Nos trasladamos hasta la localidad de **Guajaray**, para darle seguimiento a la supervisión de **10 cuartos dormitorio**, establecidos en el **contrato SEDESSON- FISE-2022-026**, con el número de obra **C-00075/0749**; el avance físico aproximado al momento es del **35%**, los trabajos que se están realizando son: piso firme, muros; quedando pendiente los enjarres, la instalación de puertas y ventanas, la techumbre, pintura general y accesorios eléctricos.

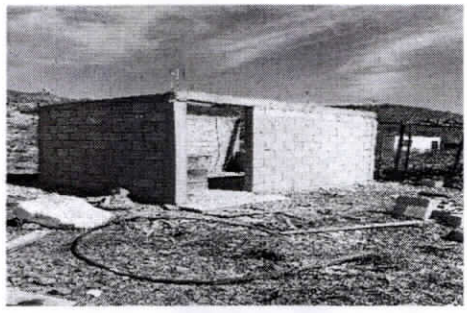
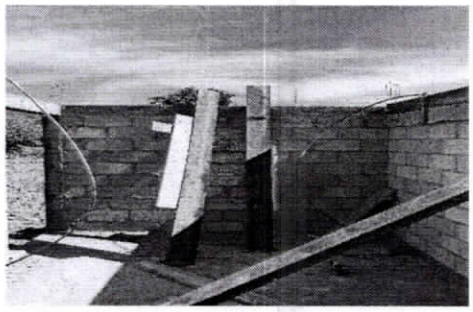

En la localidad de **Los Estrados**, supervisamos **10 cuartos dormitorio**, pertenecientes al mismo contrato; el avance físico al momento es del **55%,** los trabajos realizados son: piso firme, levantamiento de muros, instalación de techumbre; en algunos cuartos ya hay trabajos de enjarres, queda pendiente la instalación de plafón, puerta y ventana, pintura general y accesorios eléctricos.

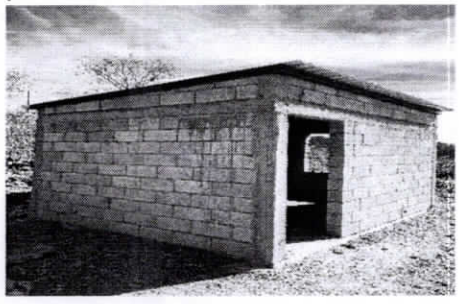
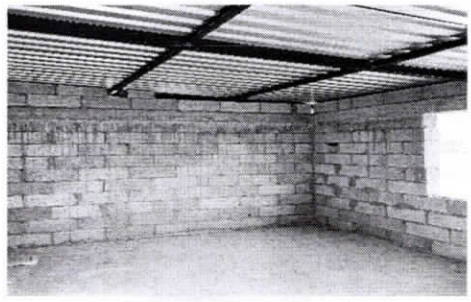
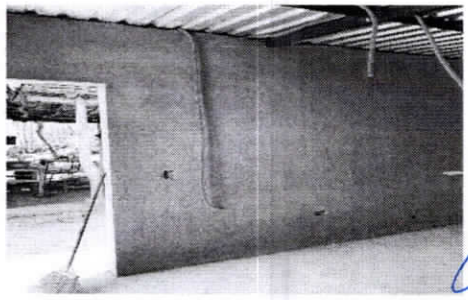

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

y los accesorios eléctricos; quedando pendiente en algunos, la pintura general, impermeabilizado y la instalación de puertas y ventanas.

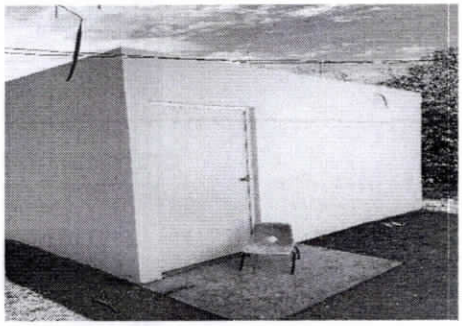
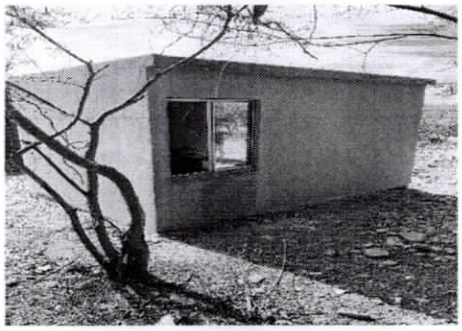
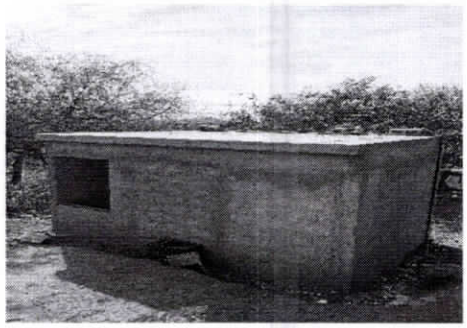

En la **cabecera municipal**, verificamos **6 cuartos dormitorio**, pertenecientes al contrato **SEDESSON- FISE-2022-050**, con el número de obra **C-00075/0806,** con un avance físico del **80%**; los trabajos realizados al momento son: la cimentación, albañilería, cimbra para la techumbre, quedando pendiente en algunos cuartos, trabajos de asentado y junteado con mortero, el yeso en la losa, la instalación de puertas y ventanas, instalación eléctrica, acabados, trabajos de pintura y el piso firme.

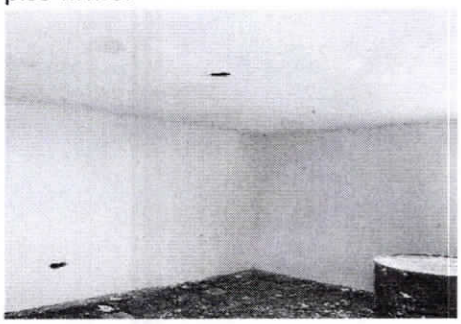
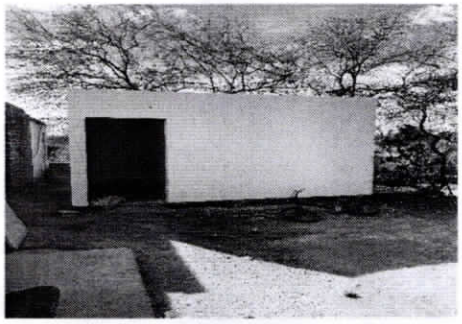
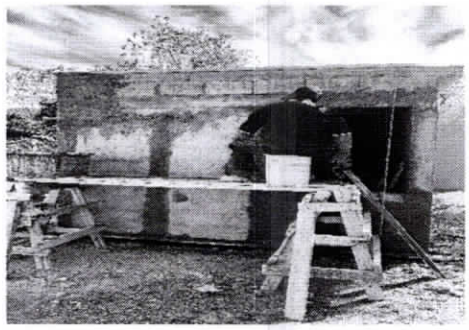

Quiriego

En la **cabecera muncipal**, supervisamos el avance físico de **10 cuartos dormitorio**, pertenecientes al contrato **SEDESSON-FISE-2022-050**, con el número de obra **C-00075/0805**, con un avance físico en promedio del **85%**; los trabajos realizados en la mayoría de los cuartos: la cimentación, albañilería, la techumbre, pintura, instalación de puertas y ventanas, cableado eléctrico; quedando pendiente accesorios eléctricos y detalles en general.

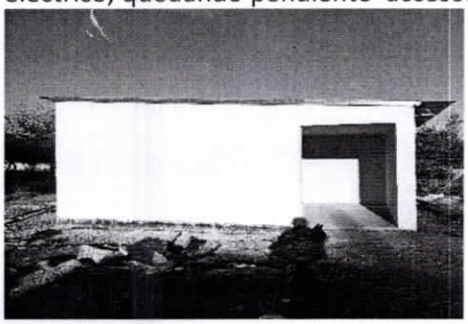
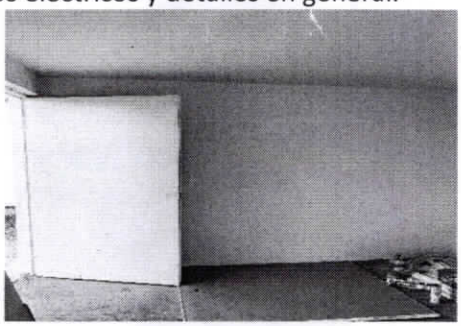
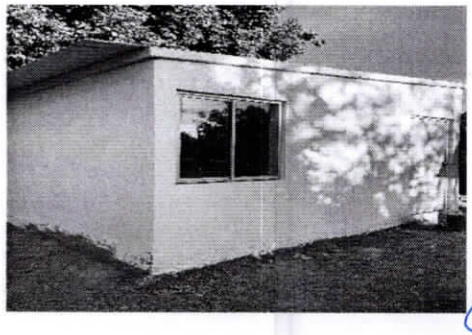

F-0178

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE SONORA

Concluimos el recorrido de supervisión, en la **cabecera municipal**, para verificar **4 cuartos dormitorio y 1 cuarto dormitorio** en la localidad **El Tezal**, también pertenecientes al contrato antes mencionado, con un avance físico aproximado al **70%**; los avances al momento son: cimentación, levantamiento de muros, algunos enjarres, losa de concreto en dos cuartos, cimbra para colar el resto de losas, pintura, accesorios eléctricos.

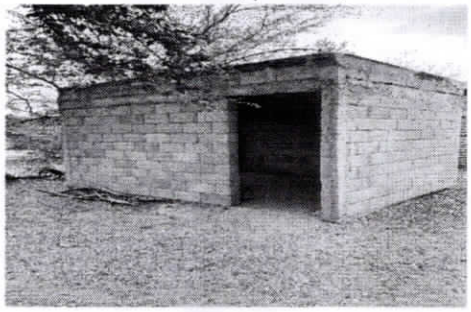
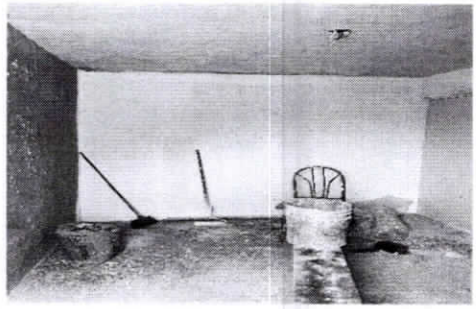

Etchojoa

Para concluir el recorrido de supervisión, nos trasladamos a la localidad de **Buaysiacobe**, para verificar **22 cuartos dormitorio**, pertenecientes al **contrato SEDESSON- FISE-2022-035**, con el número de obra **C-00075/0773**, con un avance físico al momento del **74%**; algunos cuartos ya están siendo terminados, en otros están trabajando en los enjarres, los muros, la losa de concreto e instalación de puertas y ventanas.

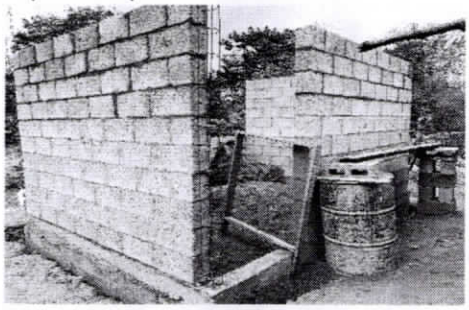
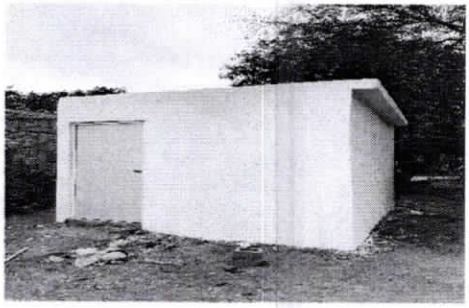

Nota aclaratoria: debido a una falla mecánica del vehículo No. 32 asignado en esta comisión, tuvimos que hacer cambio de vehículo para proseguir con nuestro recorrido, siendo este el No. 25, marca Ford, modelo 2008, placas VC-31-189.

ATENTAMENTE.-

ING. HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
COORDINADOR REGIONAL FAIS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SONORA
DESARROLLO CON OPORTUNIDADES

F-0178

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 8 de febrero de 2023

HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
P R E S E N T E .-

Con el propósito de :

APOYO PARA SUPERVISION Y AVANCE FISICO DE OBRAS CON RECURSO FISE (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL) DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SEDESON.

Se le comisiona a:

ROSARIO, QUIRIEGO, ALAMOS Y ETCHOJOA, SONORA.

Durante el (los) día (s) **9** AL **11** DE **FEBRERO** DE **2023**

Vehículo No. **32**

Marca FORD Placas VC-31-193

Modelo 2008 Tipo PICK UP F-250

CONTROL NET:	**300 Litros**
CASETAS:	**$370.00**
GASOLINA:	**$0.00**

A T E N T A M E N T E

INPI
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SAN BERNARDO, ALAMOS, SONORA

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Contraloría Municipal
Municipio de Quiriego, Sonora

Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora
