F-0180

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
07 MAR 2023
1:30
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Hermosillo, Sonora a 17 de Febrero de 2023

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

En atención al aviso de comisión de fecha del 08 de febrero de 2023, con ruta de traslado del 09 al 11 de febrero, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión y verificación de avance físico de las Obras: "Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Rosario; Construcción de módulo sanitario con biodigestor en Rosario localidad de Paredones (El Saucito); Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Quiriego; Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Álamos; Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Etchojoa.

LUGAR DE COMISIÓN: Varias localidades de los Municipios de Rosario, Quiriego, Álamos y Etchojoa, Sonora.

ROSARIO

En el Municipio de Rosario se verificó el avance físico de los proyectos correspondientes al contrato SEDESSON-FISE-2022-050, adjudicado al C. Francisco Javier Toledo Ruiz. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS	ESTADO DE LA OBRA (FALTANTES
C-00075/0806 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Rosario.	Rosario	6 Viviendas	En general a los cuartos les faltan acabados, puertas y ventanas e instalación eléctrica. El avance general de la obra es de un 80% aproximadamente.
	La Estrella	6 Viviendas	Dos cuartos están casi terminados, a uno le faltan detalles de pintura, fijar la roseta y poner el foco. Al otro sólo le falta fijar la roseta y poner el foco. Al resto de los cuartos (4) en general les faltan acabados, puertas e instalación eléctrica. El avance general de la obra es de un 80% aproximadamente.

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx

C-00075/0792 Construcción de módulo sanitario con biodigestor en Rosario localidad de Paredones (El Saucito).	Paredones	7 Módulos sanitarios	6 (seis) módulos sanitarios Con la losa colada y 1 (uno) módulo aún sin colar la losa. Faltan puertas y ventanas, instalación eléctrica, acabados, instalaciones hidráulica y sanitaria, muebles de baño y tinaco y la instalación del sistema de tratamiento (biodigestor). El avance general de la obra es de un 40% aproximadamente.

QUIRIEGO

En el Municipio de Quiriego se verificó el avance físico de los proyectos correspondientes al contrato SEDESSON-FISE-2022-050, adjudicado al C. Francisco Javier Toledo Ruiz. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS	OBSERVACIONES
C-00075/0805 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Quiriego.	Quiriego	10 Viviendas	9 (nueve) de los 10 cuartos ya tienen la techumbre a base de lámina galvanizada y polín mon-ten. Sólo hay 1 (uno) que aún no tiene la techumbre. En general les faltan los accesorios eléctricos y a algunos les faltan la puerta y la ventana. El avance general de la obra es de un 85% aproximadamente.
	Batacosa	4 Viviendas	A los 4 (cuatro) cuartos les falta la techumbre a base de lámina galvanizada y polin mon-ten. En general les faltan el plafón de tablaroca, acabados, puertas y ventanas e instalación eléctrica. El

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx

			avance general de la obra es de un 45% aproximadamente.
	Cabora	2 Viviendas	A los 2 (dos) cuartos les falta la techumbre a base de lámina galvanizada y polin mon-ten. A 1 (uno) le falta terminar la piña para dar la pendiente a la techumbre. Al otro cuarto le falta la cadena de cerramiento. En general les faltan el plafón de tablaroca, acabados, puertas y ventanas e instalación eléctrica. El avance general de la obra es de un 57% aproximadamente.

ÁLAMOS

En el Municipio de Álamos se verificó el avance físico de los proyectos correspondientes al contrato SEDESSON-FISE-2022-026, adjudicado a la C. Patricia Czarina Agüero Madero. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS	OBSERVACIONES
C-00075/0749 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Álamos.	Guajaray	10 Viviendas	A los 10 (diez) cuartos les falta la techumbre a base de lámina galvanizada y el soporte con polin mon-ten. 5 (cinco) de los 10 cuartos ya tienen colada la cadena de cerramiento. Los otros 5 (cinco) tienen los muros de block a 10 hiladas. En general les faltan los acabados, las puertas y ventanas y la instalación eléctrica. El avance general de la obra es de un 35% aproximadamente.
	Los Estrados	10 Viviendas	A los 10 (diez) cuartos les falta la techumbre a base

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx

			de lámina galvanizada y el soporte con polin mon-ten. 5 (cinco) de los 10 cuartos ya tienen colada la cadena de cerramiento. Los otros 5 (cinco) tienen los muros de block a 10 hiladas. En general les faltan los acabados, las puertas y ventanas y la instalación eléctrica. El avance general de la obra es de un 55% aproximadamente.
	Álamos	5 Viviendas	De los 5 (cuartos) 3 ya tienen colada la losa de vigueta y casetón. Una más está lista para colar, ya tiene la cimbra y colocada la vigueta y el casetón. Y a la otra le falta cimbrar y colocar vigueta y casetón. En general faltan los firmes, los acabados, las puertas y ventanas y la instalación eléctrica. El avance general de la obra es de un 70% aproximadamente.

En las localidades de Guajaray y Los Estrados los cuartos se construyeron con techumbre a base lámina galvanizada con soporte de polines mon-ten, en lugar de losa de vigueta y casetón con capa de compresión de concreto, como lo indica el proyecto.

ETCHOJOA

En el Municipio de Álamos se verificó el avance físico de algunos proyectos correspondientes al contrato SEDESSON-FISE-2022-035, adjudicado a la C. Patricia Czarina Agüero Madero. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

F-0180

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL
GOBIERNO
DE SONORA

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	METAS	OBSERVACIONES
C-00075/0773 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Etchojoa.	Buaysiacobe	22 Viviendas	6 (seis) cuartos están casi terminados, sólo les faltan detalles de pintura y limpieza general. A 2 (dos) cuartos les falta la puerta, además de detalles de pintura y limpieza general. A 1 (un) cuarto le falta la ventana, además de detalles de pintura y limpieza general. 8 (ocho) cuartos ya tienen colada la losa de concreto. 5 (cinco) cuartos no tienen aún la losa de concreto. A éstos últimos 13 (trece) cuartos además les faltan los firmes de concreto, los acabados, las puertas y ventanas y las instalaciones eléctricas. El avance general de la obra es de un 74% aproximadamente.

A todos los cuartos les hace falta el aplanado grueso, solo se aplicó el aplanado fino, directamente sobre el muro de block.

Seguidamente, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

F-0180

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE SONORA

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

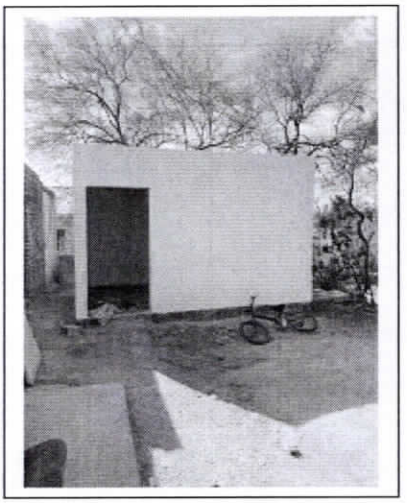

Rosario Cabecera

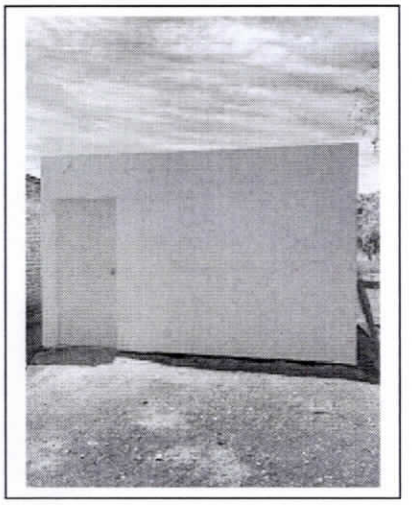

La Estrella

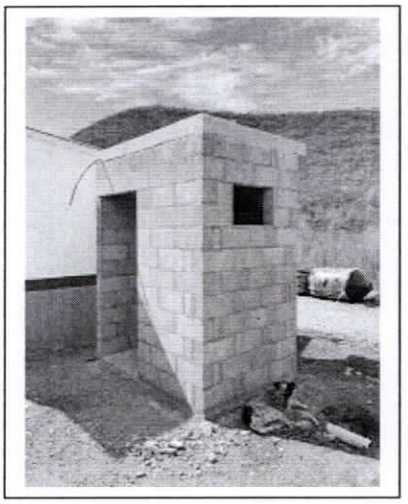

Paredones

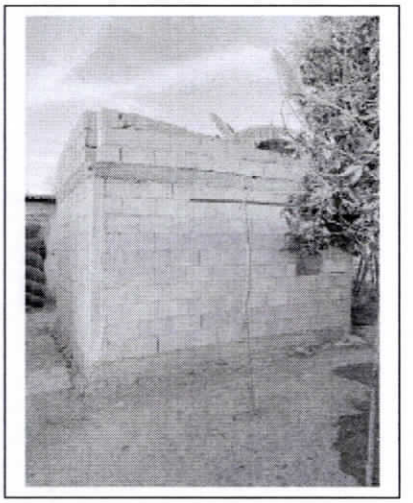

Batacosa

F-0180

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE SONORA

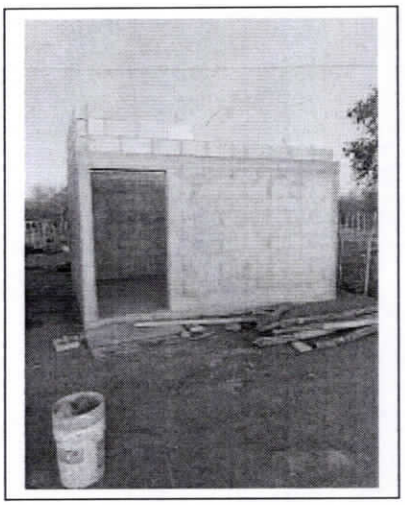

Cabora

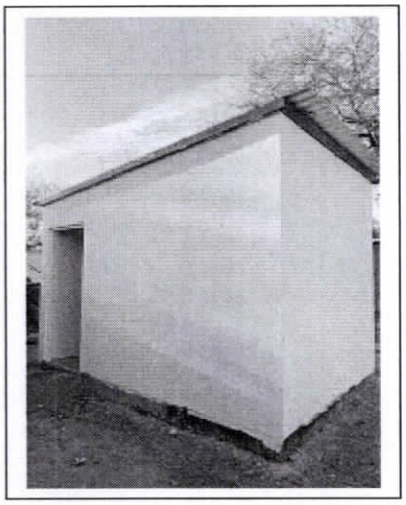

Quiriego Cabecera

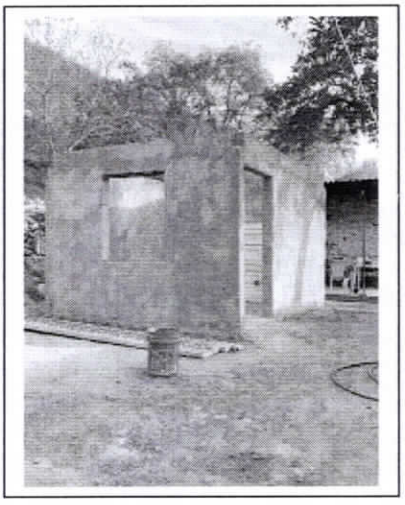

Álamos Cabecera

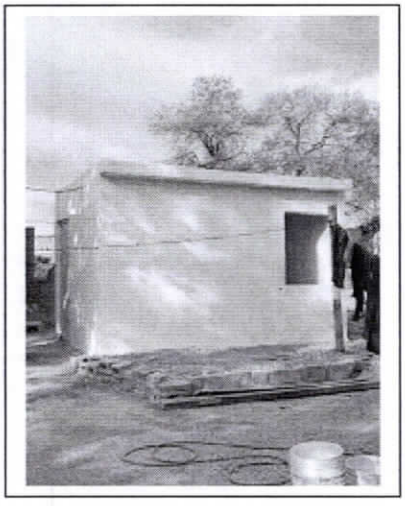

El Tezal

SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

F-0180

SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DE SONORA

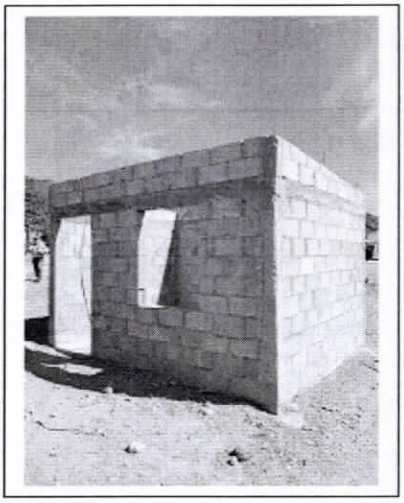

Guajaray

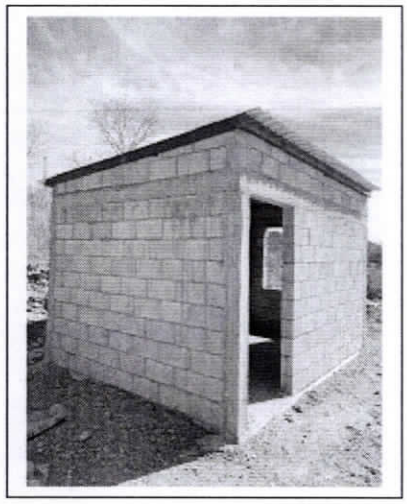

Los Estrados

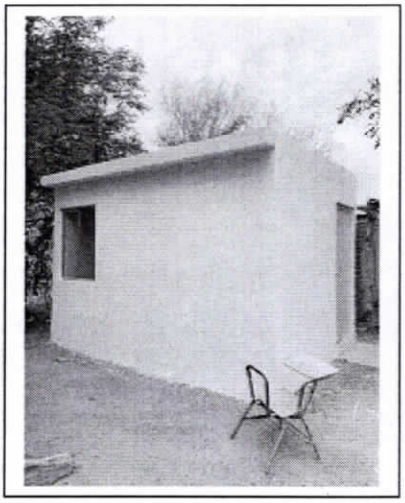

Buaysiacobe

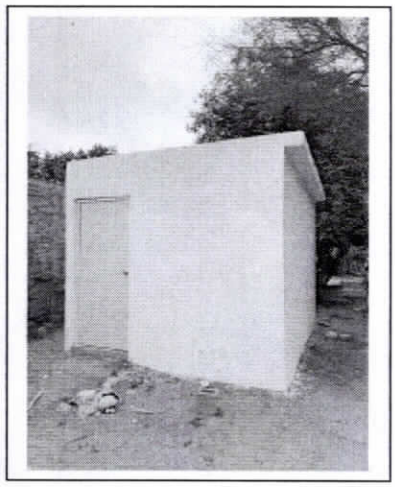

Buaysiacobe

ATENTAMENTE.-

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

F-0180

Contraloría Municipal
Municipio de Quiriego, Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 8 de febrero de 2023

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
P R E S E N T E .-

Con el propósito de :

APOYO PARA SUPERVISION Y AVANCE FISICO DE OBRAS CON RECURSO FISE (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL) DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE SEDESON.

Se le comisiona a:

ROSARIO, QUIRIEGO, ALAMOS Y ETCHOJOA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 9 AL 11 DE FEBRERO DE 2023

Vehículo No. **32**

Marca FORD Placas VC-31-193

Modelo 2008 Tipo PICK UP F-250

CONTROL NET:	**0 Litros**
CASETAS:	**$0.00**
GASOLINA:	**$0.00**

INPI
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
SAN BERNARDO, ALAMOS, SONORA

A T E N T A M E N T E

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES • ETCHOJOA, SON. •

Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora
