F-0515

GOBIERNO DE SONORA
DESARROLLO SOCIAL

Hermosillo, Sonora; a 27 de Marzo de 2023

C.P. ALMA DELIA LIMON MORENO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
P r e s e n t e. –

En relación al aviso de comisión con fecha del 25 de Marzo de 2023, mediante el cual se me comisiono a los municipios de San Javier y Suaqui Grande para llevar acabo una verificación de la solventacion de los detalles marcados por Contraloría, me permito informar lo siguiente:

El día 25 de enero se arribó al municipio de San Javier, Sonora para la verificación de la solventacion de las observaciones marcadas por la auditoria de la Contraloría del Estado en relación a la visita de verificación física llevada a cabo el día 21 de febrero del 2023 según oficio ECOP-DV-0224/2023, al contrato **SEDESSON-FISE-2023-054** en relación a las obras **C-00075/0779: "Construcción de cuarto-dormitorio en la localidad de San Javier, municipio de San Javier"(08 cuartos); C-0075/0781: "Construcción de cuarto-dormitorio en la localidad de Suaqui Grande, Municipio de Suaqui Grande" (12 cuartos) la cual consiste en la construcción de cuartos dormitorios con las siguientes características: LA OBRA CONSISTE: CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS – DORMITORIO EN TOTAL POR AMBOS MUNICIPIOS QUE CONSIDERA UN CUARTO DE 4.00 M X 3.00 M MEDIDAS A EJES, A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA, ALBAÑILERIA CON MUROS DE BLOCK, CADENAS, CASTILLOS Y PISO DE CONCRETO DE 8 CM., ENJARRE INTERIOR Y EXTERIOR, TECHUMBRE DE LAMINA SOBRE POLIN - MONTEN, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR; BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A 66 PERSONAS EN LA LOCALIDADES DE SAN JAVIER Y SUAQUI GRANDE, SONORA.**

La obra en mención presento observación por parte de Contraloría en algunos conceptos como instalación de ventanas, instalación de plafón, instalación de puerta, detalles de pintura, así como detalles de acabados en piso, por lo que al llevar acabo el recorrido por cada una de las acciones ejecutadas en ambos municipios y se logró corroborar que los detalles que Contraloría encontró se encontraban solventados, las personas se encontraban muy agradecidas por el apoyo brindado por SEDESSON así como por los detalles solventados o la corrección de detalles finales. Durante el recorrido no se logró encontrar en los domicilios a un par de residentes más sin embargo a simple vista o verificación por el área exterior e interior se logró apreciar que no existían detalles.

ATENTAMENTE

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
04 ABR 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

662 108 37 37
662 103 37 49
sedesson@sonora.gob.mx
Proyecto Río 76,
Col. Proyecto Río Sonora

F-0515

GOBIERNO DE SONORA

DESARROLLO SOCIAL

REPORTE FOTOGRAFICO

Verificación física de detalles en el Municipio de San Javier y Suaqui Grande

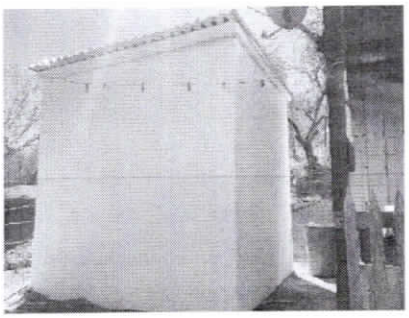
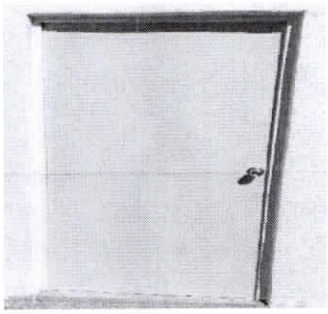
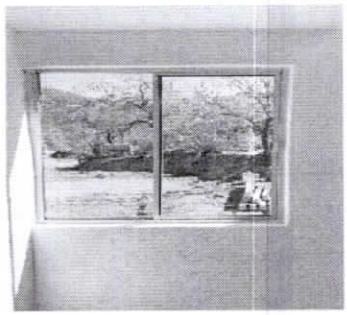
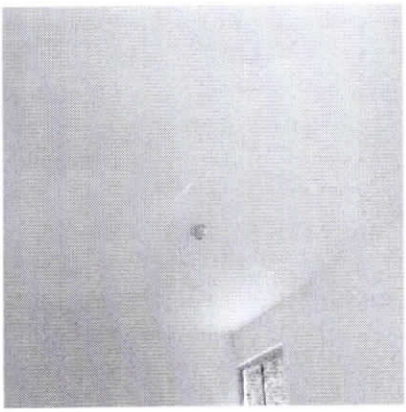

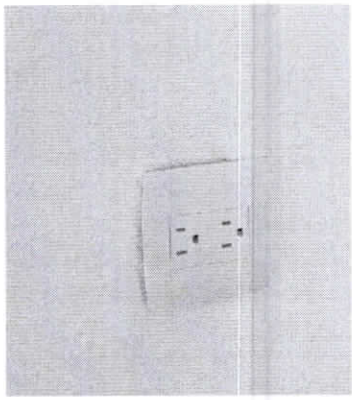
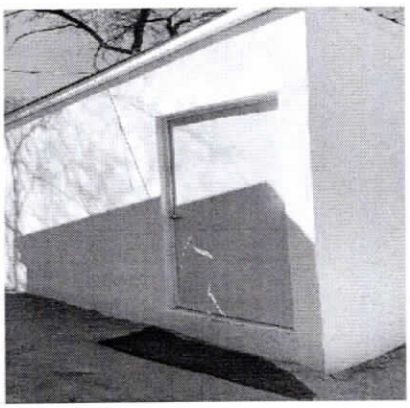
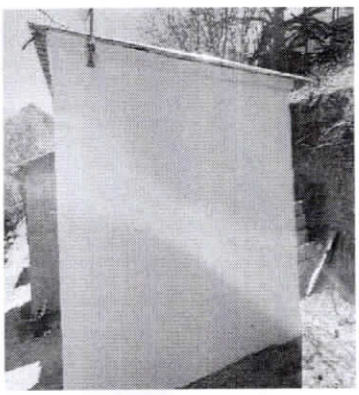
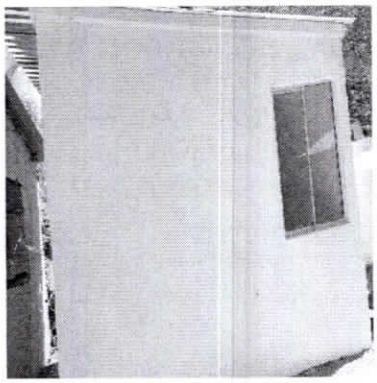


662 108 37 37
662 103 37 49
sedesson@sonora.gob.mx
Proyecto Rio 76,
Col. Proyecto Rio Sonora
